



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20240255, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2024-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJÓS NO DISTRITO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2025, conforme segue: Exercício 2025 Projeto 1213.154510502.1.049 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos Municipais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 19 de maio de 2025, que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da Obra em tempo estipulado, uma vez que a ocorrência das chuvas em nossa região tem acarretado sérios problemas no transporte de material até o local da obra, atrasando assim a execução da mesma, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício e cronograma em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Obra: **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJÓS NO DISTRITO DE BARREIRAS, MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.**

Contrato: **20240255**

Empresa contratada: **QUEIROS E MOURA LTDA**

A presente justificativa técnica tem por finalidade demonstrar a necessidade de aditivo de prazo ao contrato da obra supracitada, em virtude das condições climáticas adversas ocorridas durante o período de execução, especialmente o aumento significativo do volume de chuvas, que comprometeu o ritmo de execução dos serviços previstos.

Durante a vigência contratual, esse período do ano é registrado como chuvoso para a região, ocasionando interrupções, atrasos e impossibilidade de execução de diversas atividades, principalmente para este tipo de obra realizada a céu aberto, que depende de condições climáticas favoráveis.

Esse período impactou diretamente a execução do cronograma físico-financeiro da obra, diante do exposto, e visando à manutenção da qualidade, segurança e integridade técnica da obra, solicita-se a prorrogação do prazo contratual em **150 dias**, ressalta-se que a solicitação se fundamenta no princípio da imprevisibilidade e na boa-fé contratual, estando em conformidade com a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável) e com as condições pactuadas.

Itaituba-Pa, 19 de maio de 2025

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA nº151525739-8/PA

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

Itaituba, PA - 19 de Maio de 2025

Ofício nº 01/128-2025

À

Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA


Itaituba - PA

Assunto: Assunto: Solicitação do 1º Aditivo de Prazo de Execução ao **Contrato N° 20240255**.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício, expressar a necessidade de prorrogação do prazo de execução pelo mesmo período anterior (150 dias) referente ao **Contrato N° 20240255**, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a ocorrência das chuva vem nos acarretando alguns problemas no transporte de material ate o local da obra e atrasando a execução da mesma e por consequência de seu efeito têm nos dado esse atraso na execução da obra: **referente aos Contratação de empresa de engenharia para pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajós no Distrito de Barreiras, Município de Itaituba/PA**, com avanço físico de 37,98%.

Como mostrado na Imagem 1, o Local só possui poucas vias de acesso, sendo estradas de terra, o que dificulta a logística de entrega de materiais, especialmente em períodos mais chuvosos. Somado a isso, encontra-se a precária condição da Rodovia Transamazônica nos períodos chuvosos.

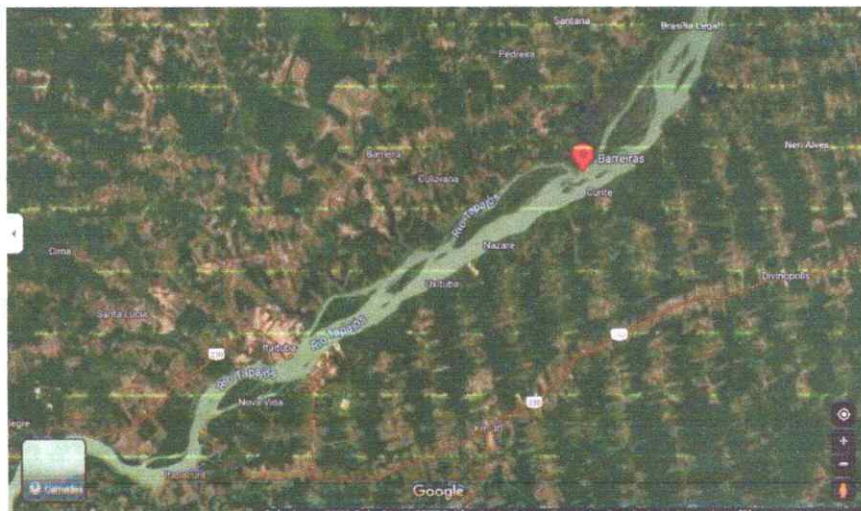

A presente solicitação de aditivo de prazo tem como objetivo garantir a conclusão das atividades contratadas, considerando fatores técnicos e operacionais que impactaram o cronograma inicialmente estabelecido. Durante a execução do contrato, foram identificados fatores externos e internos que ocasionaram atrasos na realização das atividades, tais como condições climáticas adversas, fornecimento de materiais e equipamentos com prazos diferenciados, além de eventuais ajustes técnicos.

De acordo com o artigo 65, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a administração pública pode conceder aditivos contratuais para alterar o prazo de execução, desde que haja justificativa técnica fundamentada, compatível com a necessidade de garantir a execução do objeto contratado de forma eficiente e eficaz.

A prorrogação do prazo é imprescindível para assegurar a conclusão das atividades de acordo com as especificações contratuais, garantindo a qualidade do serviço e o atendimento às normas técnicas aplicáveis. A extensão do prazo visa também evitar prejuízos à administração pública, assegurando que o objeto seja entregue em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança.

Diante do exposto, a prorrogação do prazo contratual é justificada por motivos técnicos, operacionais e de conformidade, sendo necessária para o cumprimento integral do objeto contratado, em consonância com a legislação vigente.

Anexos:

1. Justificativa Técnica para Aditivo.
2. Cronograma

**QUEIROZ E
MOURA LTDA**

Assinado de forma digital por
QUEIROZ E MOURA LTDA
Dados: 2025.05.19 14:41:32
-03'00'

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ 31.500.254/0001-00

FOTO: Notícia de reestruturação de ponte entre Barreiras e Itaituba



FONTE: Prefeitura Municipal de Itaituba

A imagens a baixo demonstram os serviços executados:





Concorrência: C.E 006/2024
Contratante: Secretaria Municipal de Itaituba-PA
Objeto: Pavimentação de Acesso a Orla do Rio Tapajos, no Município de Itaituba -PA
BDI:29,77%

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - 1º ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÕES	VALORES	MESES				
			1º	2º	3º	4º	5º
1.0	PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.	R\$ 1.294.804,44	10,15%	9,71%	27,33%	26,27%	26,54%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.229,12	Físico 100,00% Financeiro R\$ 2.229,12	-	-	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.713,44	Físico 20,00% Financeiro R\$ 1.942,69	20,00% R\$ 1.942,69	20,00% R\$ 1.942,69	20,00% R\$ 1.942,69	20,00% R\$ 1.942,69
1.3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.440,35	Físico 100,00% Financeiro R\$ 3.440,35	-	-	-	-
1.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.440,35	Físico -	-	-	-	100,00% R\$ 3.440,35
1.5	DRENAGEM	R\$ 247.579,94	Físico 50,00% Financeiro R\$ 123.789,97	50,00% R\$ 123.789,97	-	-	-
1.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 703.966,98	Físico -	-	50,00% R\$ 351.983,49	25,00% R\$ 175.991,75	25,00% R\$ 175.991,75
1.7	CALÇADA E MEIO FIO	R\$ 324.434,26	Físico -	-	-	50,00% R\$ 162.217,13	50,00% R\$ 162.217,13
TOTAIS			Físico 10,15% Financeiro R\$ 131.402,13	9,71% R\$ 125.732,66	27,33% R\$ 353.926,18	26,27% R\$ 340.151,56	26,54% R\$ 343.591,91
			Físico 10,15% Financeiro R\$ 131.402,13	19,86% R\$ 257.134,79	47,19% R\$ 611.060,96	73,46% R\$ 951.212,53	100,00% R\$ 1.294.804,44

QUEIROZE
MOURA LTDA

Assinado de forma digital por
QUEIROZ E MOURA LTDA
Dados: 2025.05.19 14:25:14
-03'00'

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ 31.500.254/0001-00

CONSTRUTORA ACARI - Contato: (93) 3518-2964 - (93) 99239-8281
Rodovia Transamazônica, Bairro Comércio, s/n, CEP 68.180-010
Itaituba-PA
