



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 13º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 11 de junho de 2025, que necessita de mais prazo para que possa concluir a execução das obras relacionadas no contrato acima mencionado, o fato se dá devido as várias condições adversas que vem dificultando o transporte dos materiais de construção e a equipe de serviço até o local das obras, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício e cronograma de execução em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

Ofício de Solicitação de Prazo de Execução de Contrato

**Ref.: 13º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230214
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE II- COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE III- COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRA.
LOTE IV- COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.
LOTE V- COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.
LOTE VI- COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VII- COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VIII- COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.
LOTE IX- COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.
LOTE XI- COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.
LOTE XII- COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.
LOTE XIV- AIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

**À
Prefeitura Municipal de Itaituba-PA
Setor de Contratos**

**De
José James Silva Nascimento
Proprietário da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA
Rua Francisco Macêdo, nº 935 – B Bairro Santo Antônio
CEP: 68180-610 Itaituba – Pará
E-mail: mageplan2023@gmail.com Fone: (93) 99199-3925**

Itaituba, 11 de junho de 2025

Prezados,

Venho por meio deste, na qualidade de proprietário da empresa Mageplan Service e Logs LTDA, solicitar formalmente um aditivo de prazo referente ao contrato nº 20230214, celebrado entre nossa empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Conforme já discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execução das obras devido a condições adversas, especificamente as obras serem em locais diversos, que têm impactado significativamente o transporte de materiais e a mão de obra até os locais das obras. Essas situações estão ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para a finalização das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.



Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação, envio em anexo relatório fotográfico para melhor entendimento.

Atenciosamente,

JOSE JAMES SILVA
NASCIMENTO:66461
936220


Assinado de forma digital
por JOSE JAMES SILVA
NASCIMENTO:66461936220

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21

RELATORIO FOTOGRAFICO: SÃO SEBASTIÃO



RELATORIO FOTOGRAFICO: COMUNIDADE AGROVILA KM 17

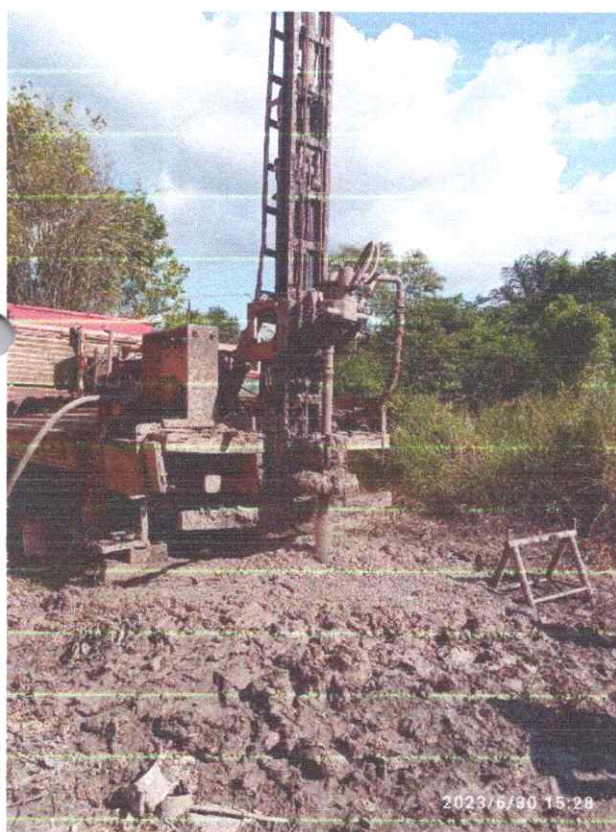


Relatório Fotográfico: Comunidade Nova Aliança



RELATORIO FOTOGRAFICO: RAMAL DA UNIÃO



RELATORIO FOTOGRAFICO: PAPIDÉ

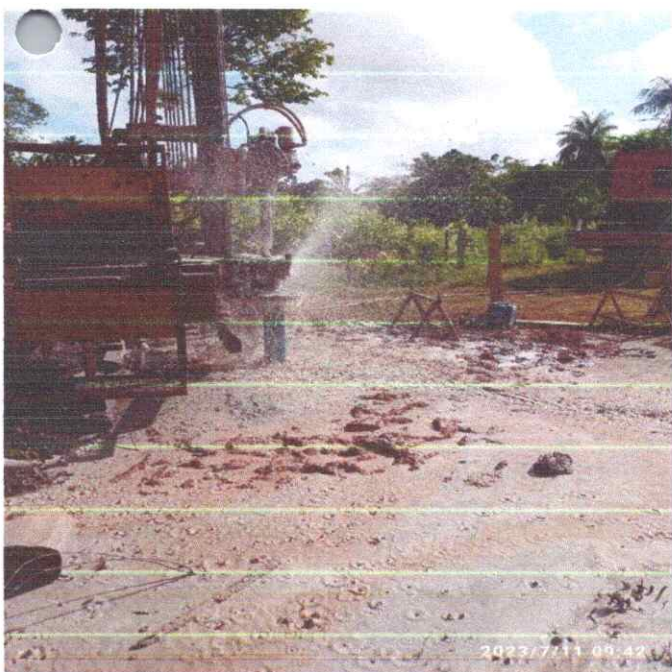

Relatório Fotográfico: Comunidade Santa Rita



Relatório Fotográfico – Comunidade Novo Horizonte



Relatório Fotográfico: Jacarezinho I



Relatório Fotográfico: Jacarezinho I

