



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

### ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230214, TP 004/2023.

**OBJETO:** CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2026**, - 1. A despesa com a execução da (s) Obra de Perfuração de poço (s) semiartesiano (s) objeto deste contrato mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária exercício 2026, ampliação da rede de abastecimento de água, expansão do sistema em comunidades e bairros.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 14 de janeiro de 2026, que a execução da obra vem sendo prejudicada pelas condições inadequadas das vias de acesso aos locais de intervenção, o que tem dificultado de forma significativa o transporte de materiais até as frentes de serviço, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (Cento e oitenta) dias, para que possa concluir a obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 016/2025

**Ofício de Solicitação de Prazo de Vigência de Contrato**

**Ref.: 7º ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO Contrato nº 20230214  
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE VI- COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.  
LOTE VII- COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.  
LOTE VIII- COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.  
LOTE IX- COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.  
LOTE XII- COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.  
LOTE XIV- BAIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

À  
**Prefeitura Municipal de Itaituba-PA**  
**Setor de Contratos**

De  
**José James Silva Nascimento**  
**Proprietário da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA**  
**Rua Francisco Macêdo, nº 935 – B Bairro Santo Antônio**  
**CEP: 68180-610 Itaituba – Pará**  
**E-mail: [mageplan2023@gmail.com](mailto:mageplan2023@gmail.com) Fone: (93) 99199-3925**

**Prezados,**

Venho, por meio deste, na condição de representante legal da empresa **Mageplan Service e Logs LTDA**, solicitar formalmente a concessão de aditivo de prazo ao Contrato nº 20230214, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Conforme já exposto em tratativas anteriores, a execução da obra vem sendo prejudicada pelas condições inadequadas das vias de acesso aos locais de intervenção, o que tem dificultado de forma significativa o transporte de materiais até as frentes de serviço. Ressalta-se que os locais das obras são distintos e de difícil acesso, circunstância que tem ocasionado atrasos no cronograma inicialmente estabelecido.

Diante do exposto, solicitamos a concessão de prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão das obras, de modo a assegurar a adequada execução dos serviços, preservando a qualidade exigida e o pleno atendimento às condições contratuais.

Reiteramos nosso compromisso com a correta execução do objeto contratado e com a busca de soluções que garantam a finalização do projeto com eficiência e responsabilidade.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada e aguardamos manifestação favorável a presente solicitação.

**Atenciosamente,**





# Relatório Fotográfico: Jacarezinho I



Relatório Fotográfico: Comunidade Santa Rita



# Relatório Fotográfico: Comunidade Arixi

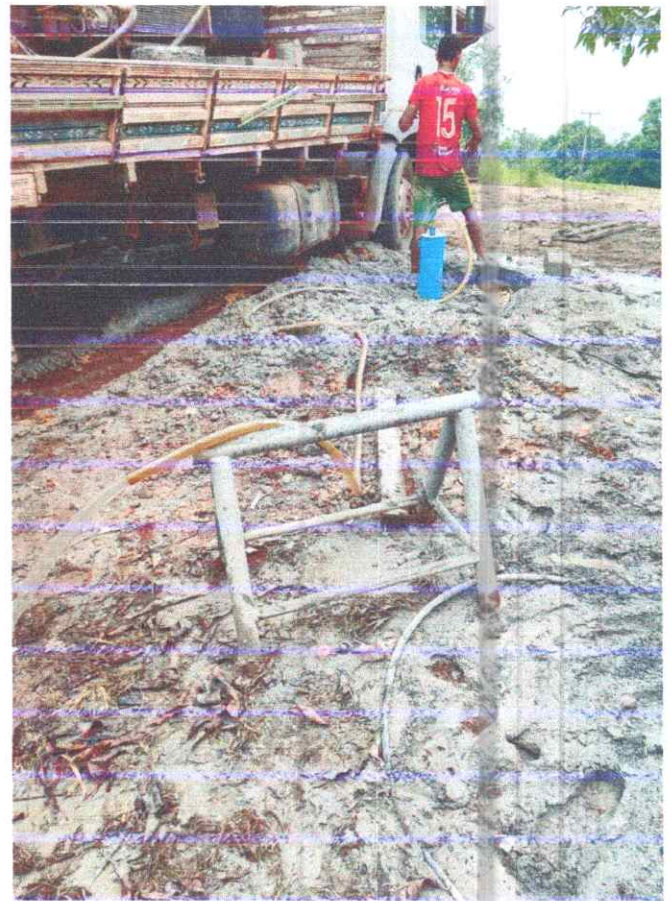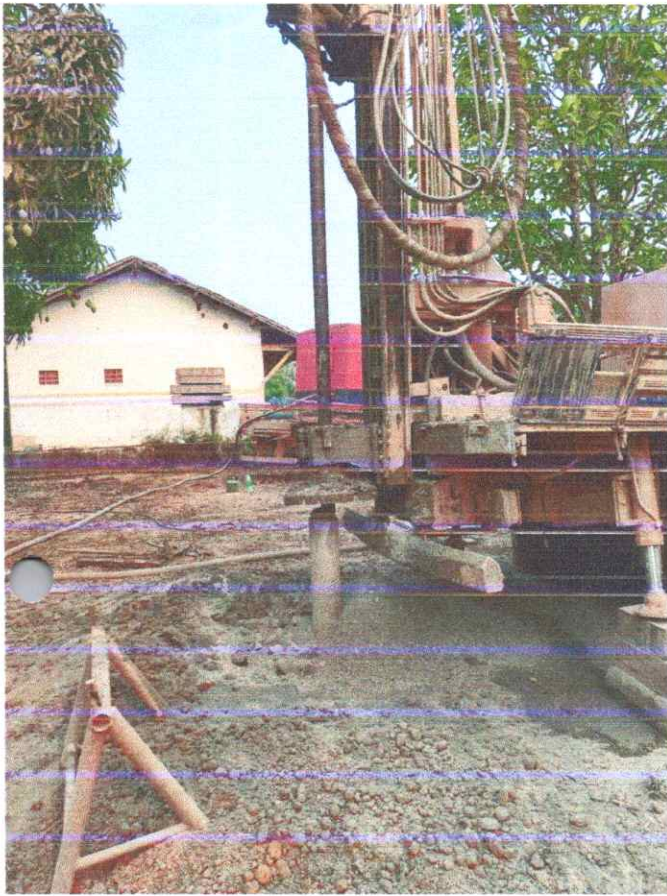

# Relatório Fotográfico: Comunidade Terra Nova 1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PERPÉTUO SOCORRO

