



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018 – TP

ANEXO VII – PROJETO DA OBRA

**OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA
SENHORA DE SANTANA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE
SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.**



DIRETORIA TÉCNICA

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESCOLA MUNICIPAL

**Obra de engenharia para construção de ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO INFATIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA
DE SANTANA, localizada na comunidade SANTA RITA.**

Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
crea-478-TD-PA

JULHO / 2018

[Handwritten signature]
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



DIRETORIA TÉCNICA

SUMÁRIO

*Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
sua 478-TD-PA*

| | |
|--|-----------|
| A - ORIENTAÇÕES GERAIS | 4 |
| 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES..... | 4 |
| 2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações..... | 4 |
| 3. Orientação Geral e Fiscalização | 5 |
| 4. SERVIÇOS PRELIMINARES..... | 8 |
| 5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA..... | 9 |
| 6. FUNDAÇÃO | 9 |
| 7. ESTRUTURA..... | 10 |
| 8. PAREDES E PANEIS | 10 |
| 9. COBERTURA..... | 10 |
| 10. ESQUADRIAS | 11 |
| 11. REVESTIMENTOS | 12 |
| 12. PISOS: | 13 |
| 13. IMPERMEABILIZAÇÃO | 15 |
| 14. PINTURA..... | 15 |
| 15. INCÊNDIO | 16 |

*Nair
José Alcides Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8*

DIRETORIA TÉCNICA

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 16. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18 |
| 17. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18 |
| 18. | DIVERSOS | 19 |
| 19. | LIMPEZA DA OBRA | 19 |



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea 416-TD-PA



José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea Pa: 151525739-8

DIRETORIA TÉCNICA

A - ORIENTAÇÕES GERAIS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de construção de escola municipal de ensino infantil e ensino fundamental.

Para efeito das presentes Especificações, o termo *Contratada* define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo *Fiscalização* define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município perante a *Contratada* e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo *Contratante* define a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a *Contratada* deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas, que o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

A reforma da referida Escola Municipal de Educação Infantil e Fund. Nossa Senhora de Santana, está localizada na Vicinal Norte Sul na **COMUNIDADE SANTA RITA**, neste município de Itaituba, Estado do Pará.

- **LOCALIZAÇÃO DE:** E 612.132,61 - N 9.510.302,81



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Fiscalizações
478-TD-PA

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros.



José Alair Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

DIRETORIA TÉCNICA

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá fiscalização junto à construtora com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.


As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras em reparo. Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.



José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Engenharias
Crea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.


A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos preços unitários.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.


José Alencar Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8


Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea-Pa: 176-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários.

Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a finalização da execução do serviço.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em ofício ou no livro de ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

CJR
José Arthur Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

UMC
Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
rua 478-TD-PM

DIRETORIA TÉCNICA

SERVIÇOS

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Depósito:

Deverá ser confeccionado um barracão em chapa de madeira com área mínima de 18,00 m² (6mx3m), com cobertura em telha de fibrocimento de 4 mm para depósito de materiais e ferramentas.

Tapume/muro:

O muro da escola deverá servir como tapume, portanto o muro deve ser executado antes do inicio das obras da escola.

Locação:

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados.

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes condições:

As cotas de piso acabado deverão estar de acordo com o projeto arquitetônico.


Placa da obra:

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra ou voltada para via que forneça melhor visualização. É necessário que a placa seja mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade das cores durante o período de execução da obra.

A placa deve conter as principais características do contrato como nome da obra, órgão contratante e valor investido conforme modelo da Prefeitura Municipal de Itaituba. A placa devêra ser em lona, com as dimenções de 2,80 x 2,20 m, tendo uma área de 6,16 m².



José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
rea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação:

A escavação deverá ser feita de acordo com o necessário para a confecção de toda a fundação a ser executada na obra, sendo os blocos de fundação com profundidade de 40cm. Demais medidas podem variar, mas nunca ultrapassa os 2 metros de profundidade

Aterro:

A superfície a ser aterrada sera apenas da área a construir (escola), deverá ser previamente escarificada até uma profundidade de 15,0 cm para garantir a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo. O lançamento das primeiras camadas de aterro deverá ser aprovado pela fiscalização após inspeção da camada de apoio. A altura máxima da camada não deverá ultrapassar 30cm.

6. FUNDAÇÃO

Lastro para concreto:

Lastro de concreto com brita Nº 1, espessura e=10cm com preparo utilizando betoneira.

Prepara-se o concreto, lança-se espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e nivela com a régua de alumínio sarrafeando. Com um soquete, apila-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme ao chão.

Bloco em concreto armado:

Os blocos serão executados em concreto armado, assim como devem ser confeccionadas formas em madeira para os mesmos. Os blocos terão as dimensões de 60x60x40 cm e serão construídos sobre o lastro de concreto magro.

Baldrame em concreto armado:

Sera feita a viga – baldrame, blocos e fundação executada em concreto com Resistencia minima de $F_{ck}=20\text{MPA}$ com a utilização de forma em madeira de lei em utilização da escola será executado em concreto armado, sendo suas dimensões 12x30cm.

DIRETORIA TÉCNICA

7. ESTRUTURA

Concreto armado:

Os elementos pilares, viga e cintamento superior deverão ser feitos com concreto armado deverá ter resistência mínima de $F_{ck}=20\text{MPA}$. Sempre obedecendo as normativas da ABNT.

8. PAREDES E PANEIS

Alvenaria:

As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos furados (6 furos), os assentamentos dos tijolos na alvenaria devem ser feitos de maneira que a espessura máxima da parede chegue ao 15cm e a mínima aos 13cm sendo estas medidas da parede acabada.

Os vãos das portas e janelas, quando não coincidentes com as vigas deverão receber vergas e contravergas de concreto armado.

Mureta:

A altura máxima do muro sera de 2m sendo 1m em alvenaria com aplicação de reboco e chapisco, e 1m em alambrado.

9. COBERTURA

Estrutura em madeira p/ telhado de fibro cimento:

A estrutura de madeira para o telhado será de madeira de lei aparelhada. Antes da montagem deverá ser realizada uma proteção contra pragas(descupinização).

Cobertura em telha de fibrocimento:

As telhas que vão compor o telhado serão de fibrocimento de otima qualidade. Durante a execução do telhado deve-se verificar se a inclinação do mesmo para não prejudicar o seu desempenho.

Neiz
José Alvar Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

Ulisses Moreira Conde
Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

10. ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira:

Todas as portas e janelas devem estar em perfeitas condições, seguindo rigorosamente as especificações contidas no projeto arquitetônico e planilha orçamentaria, estando compostas por caixilho.

Ferragens:

O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixos ou encaixes para as dobradiças e fechaduras, terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas. Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras será preto.

As maçanetas das portas serão colocadas a 1,00 m do piso acabado. As dobradiças das portas deverão ser, no mínimo, em número de três para cada folha.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferenças de nível perceptível à vista. Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.

Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens não destinadas a pintura, devem ser adotados precauções.

Esquadrias metálicas:

Serão colocados portão de ferro 3/16 c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva), nas áreas indicas conforme projeto.

Vidros:

Não serão aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricação como ondulações, bolhas ou gretas, ou que não estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidações.

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea/PA: 151525739-8

Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

11. REVESTIMENTOS

Revestimento de paredes:

Chapisco:

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação de norma brasileira. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de aproximadamente 5 mm. A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida.

Reboco:


O reboco consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas -materiais, preparo, aplicação e manutenção. - O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 15mm.

Emboço:

As paredes que irão receber revestimento cerâmico deverão receber revestimento de emboço desempenado na área a receber revestimento. Sobre o emboço desempenado deverá ser assentado revestimento cerâmico.



José Aécio Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Res 478-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

Revestimento paredes internas:

As paredes que receberão revestimento cerâmico terão sua superfície emboçada e desempenada com desempenadeira de madeira, tomando-se o cuidado de manter o mais perfeito prumo e esquadro daquelas.

Para as paredes internas (sanitários, refeitório e área de serviço) os azulejos cerâmicos deverão ter altura máxima de 2cm.

Todos os azulejos serão assentados com argamassa colante para exteriores AC I, com desempenadeira dentada de aço numa espessura média de 5 mm a 6 mm.

As juntas serão a prumo e obedecerão às posições as recomendações do fabricante quanto à largura.

O rejuntamento dos azulejos internos será feito com rejunte fino na cor branco com espessura de 3mm (junta plus fina ou equivalente com o mesmo desempenho técnico). As paredes da cozinha a serem azulejadas deverão ser revestidas até o teto.


12. PISOS:


Lastro de Contra piso:

Lastro de concreto não estrutural (camada impermeabilizadora) de 10 cm de espessura, fck mínimo de 9Mpa. Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picão, vanga, ponteira e maretas. Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de pó e partículas soltas. Se na base existir óleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remoção.

Definição de níveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem (nível de referência), os níveis de contra piso deverão ser transferidos com uso de aparelho de nível ou nível de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverão estar limpos. Polvilhar com cimento para formação de nata, para garantir a aderência da argamassa. A argamassa de assentamento da talisca deverá ser a mesma do contra piso.

Posicionamento das taliscas com distância máxima de 3 m (comprimento da régua disponível para o sarrafeamento suficiente para alcançar duas taliscas).


José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8


Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea-Pa: 178-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

As taliscas deverão ter pequena espessura (cacos de ladrilho cerâmico ou azulejo). O assentamento das taliscas deverá ser com antecedência mínima de 2 dias em relação à execução do contra piso.

No dia anterior à execução do contra piso, a base completamente limpa, deverá ser molhada com água em abundância.

Imediatamente antes da execução do contra piso, a água em excesso deverá ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxílio de uma peneira (quantidade de 0.5 kg/m²), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderência entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderência deverá ser executada por partes para que a nata não endureça antes do lançamento do contra piso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Após completadas as mestras, retirar as taliscas e preencher o espaço com argamassa.

Lançar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superfície com régua metálica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o nível das mestras em toda a extensão.

Calçadas (Interna e Externa):


O piso de acesso a calçadas (ver Projeto de Arquitetura) receberá acabamento rústico desempenado no próprio concreto, com espessura de 7 cm, com processo de concretagem, em "Tabuleiro de Damas" – tipo "junta seca".

Piso lajota cerâmica banheiros:

O piso das áreas molhadas deverá estar com inclinação necessária para o escoamento das águas até o ralo. Não será aceito que as águas destes ambientes sejam escoadas para as áreas de acessos do mesmo.



José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
rua 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

Deverá haver impermeabilização sobre toda a fundações da obra as vigas baldrame eo blocos, seguindo especificações de aplicação, utilizando tinta asfáltica.

14. PINTURA

Disposições gerais:

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irão receber. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do fabricante da tinta.

Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em superfícies que não deverão receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e proteções adequadas.


Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à Fiscalização uma amostra, com dimensões mínimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica do local a que se destina. Paredes internas e externas: látex acrílica, 3 demãos, sobre massa acrílica e selador. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

Superfícies rebocadas:

As superfícies rebocadas receberão tinta acrílica e deverão anteriormente, ser lixadas, eliminando-se completamente grãos soltos, falhas e imperfeições. Deverá ser aplicada massa acrílica, onde for indicado e uma demão de fundo preparador. A pintura será executada com três demãos de tinta acrílica sobre a superfície preparada e convenientemente limpa. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha.



José Alair Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa. 151525739-8



Ulisses Monteiro Conde
Técnico em Edificações
rua 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

Superfícies de Madeira:

A superfície deverá ser lixada e limpa. Aplicar uma demão de selador para madeira e lixar novamente depois de seco. Aplicar três demãos de tinta esmalte sintético. Serão pintadas todas as estruturas para utilização em cobertura, inclusive mãos francesas. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

Superfícies Metálicas:

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de aplicação de acordo com as recomendações do fabricante da tinta, através da sua supervisão técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalização.

Aplicar três demãos de tinta esmalte sintético.

Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

15. INCÊNDIO

Sinalização de emergência:

As sinalizações de proibição e de alerta devem ser instaladas em local visível e a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização.

A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização.

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado.

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins.


José Alvaro Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8


Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
rua 478-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualização.

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.

As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente.

Serão usados pictogramas com as dimensões de 0,4m comprimento e largura de 0,28m

Extintor de incêndio:

A área medida em metros quadrados de piso será protegida por unidade extintora em função do risco.

A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 metros.

A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que esteja destinada a indicar a presença de extintor e/ou saída.

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo: A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, fora de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a massa total do extintor.



José Alcides Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Sia 478-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que eventuais modificações deverão ser realizadas somente após aprovação dos autores do projeto e da Fiscalização, devendo ser anotado em diário de obra. Sera fixado um centro de distribuição com barramento Como mostra em projeto.

Toda a fiação elétrica, os disjuntores, tomadas, interruptores, soquetes e lâmpadas deverão obdecer o projeto eletrico. O posicionamento de tomadas e dimensão dos tubos, deverá seguir rigorosamente os detalhes apresentados no projeto elétrico.

Em caso de utilização de tubulação aparente, está deve ser envolvida por materiais isolantes, de forma a evitar descargas elétricas nos usuários.

A fiação telefônica e de logica – UTP, deverá ser organizada em tubos condutores de zinco, de forma a evitar que esta fique exposta pelos cômodos.

17. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Esgoto:

Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga e de esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados até o local de tratamento composto de uma Fossa Séptica.

Os ramais de esgoto, de descarga dos WC's e ambientes com pontos de esgoto serão encaminhados diretamente para as caixas de inspeção de esgoto (CI.EG).

Os ramais de esgoto da cozinha, cantina e refeitório serão encaminhados para caixa de gordura (CX.G) e posteriormente à caixas de inspeção de esgoto.



José Alcides Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
rea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

Caixa de gordura:

Deverão ser com tampa de concreto armado. Suas dimensões devem ser de 50x50x50 executada em alvenaria de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensões internas de acordo o projeto.

Fossa séptica:

A fossa séptica deverá ser executada em tijolo cerâmico maciço, as paredes internas da fossa devem ser impermeabilizadas (rebocadas). As dimensões da fossa estarão representadas em projeto.

Caixas de inspeção:

Deverão ser com tampa de concreto armado. Suas dimensões devem ser de 50x50x50 executada em alvenaria.

Reservatório:

O reservatório de consumo possui capacidade de 2.000 litros para atender a demanda calculada, e o mesmo deverá ser de fibra de vidro instalado sobre uma torre em concreto armado para caixa d'água.

18. DIVERSOS

Barra em aço – pne:

Nas áreas indicadas em projeto (banheiros) deverá ser instalado barras de aço.

19. LIMPEZA DA OBRA

Pisos


Dependendo do caso, a limpeza será executada com uso de água e sabão; podendo em casos mais difíceis ser empregado ácido muriático diluído em água na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de ácido deverá ser abundantemente lavado com água, imediatamente após sua aplicação.

Metais de Aparelhos Sanitários e Esquadrias deverão ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que não houver presença de tintas ou vernizes, serão simplesmente esfregados com flanelas até recuperação integral do brilho natural.



José Alcides Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea 476-TD-PA

DIRETORIA TÉCNICA

Aparelhos Sanitários

Antes do início da limpeza, deverá ser retirado todo e qualquer excesso de massa utilizada na colocação dos aparelhos e metais. A lavagem será feita com apenas água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções ácidas.

Precauções que possibilitem uma perfeita vedação dos esgotos e ralos deverão ser adotadas a fim de evitar precipitações de detritos, responsáveis pelos entupimentos.

Vidros

Deverão ser empregados lã de aço ou removedores adequados. Cuidados especiais serão tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

Entulhos


Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da fiscalização, e leis de postura do Município.

Itaituba - Pa, 10 de Julho de 2.018



José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Eng° Civil - CREA 151525739-8 PA



Ulisses Moreira Conde
Técnico em Edificações
Crea 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba - SEMINERBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INfraESTRUTURA



MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

João Alair Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA **DATA DA VISITÓRIA:** xxxx

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | UNITÁRIO | TOTAL | TABELA | | | DATA DA EXPEDIÇÃO: | xxxx |
|---|----------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------------|--|-------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO | Ref. Código | Custo | | |
| 5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO: | | | | | | 21.117,01 | | | | 4.9284 | |
| 5.1 Impermeabilização rebaixos banho./coz. (tinta asfáltica) (bloco e baldrame) | m ³ | 9,15 | 2.307,87 | | 21.117,01 | | SEDOP 080153 | | 34,12 | 1.2900 | 4,9284 |
| 6.0 PAREDES E PAINÉIS | | | | | | 70.955,33 | | | | 16,5599 | |
| 6.1 ALVENARIA TIJUJO DE BARRÔ À CUTELO MURETA EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO, 2 FACES, ALTURA DE ATÉ 1,00M. | m ² | 428,26 | 54,24 | 23.230,75 | | | SEDOP 060046 | | 42,05 | 1.2900 | 5,4217 |
| 6.2 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 160,00 | 289,46 | 46.314,10 | | | SEDOP 260651 | | 224,39 | 1.2900 | 10,8090 |
| 6.3 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 35,40 | 33,46 | 1.184,58 | | | SINAPI 93183 | | 25,94 | 1.2900 | 0,2765 |
| 6.4 AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRACO 1:5:1 | m | 11,00 | 20,54 | 225,90 | | | SINAPI 93184 | | 15,92 | 1.2900 | 0,0527 |
| 7.0 REVESTIMENTO: | | | | | | 41.095,67 | | | | 9,5911 | |
| 7.1 CHAPISCO. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | m ² | 768,10 | 9,61 | 7.381,83 | | | SEDOP 110143 | | 7,45 | 1.2900 | 1,7228 |
| 7.2 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m ² | 768,10 | 39,02 | 29.973,18 | | | SEDOP 110763 | | 30,25 | 1.2900 | 6,9953 |
| 7.3 AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRACO 1:5:1 | m ² | 38,24 | 97,82 | 3.740,66 | | | SEDOP 110148 | | 75,83 | 1.2900 | 0,8730 |
| 8.0 PAVIMENTAÇÃO: | | | | | | 26.314,67 | | | | 6,1415 | |
| 8.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m ² | 213,36 | 53,28 | 11.367,18 | | | SEDOP 130507 | | 41,30 | 1.2900 | 2,6529 |
| 8.2 CIMENTADO QUEIMADO | m ² | 103,41 | 51,48 | 5.323,95 | | | SEDOP 130292 | | 39,91 | 1.2900 | 1,2425 |
| 8.3 LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m ² | 109,95 | 87,53 | 9.623,54 | | | SEDOP 130119 | | 67,85 | 1.2900 | 2,2460 |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



José Antônio Dória da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA: XXXX

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | TABELA | | B.D. I (%) | CURVA DO ABC (%) |
|-------|---|------|-------|---------|-----------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 9.0 | INSTALAÇÕES: | | | | 42.929,24 | | | 10,0191 |
| 9.1 | ELÉTRICA: | | | | | | | |
| 9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) . AF 01/2016 | UND | 29,00 | 126,43 | 3.666,55 | SINAPI 93128 | 98,01 | 1,2900 0,8557 |
| 9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016. | UND | 20,00 | 152,40 | 3.048,01 | SINAPI 93143 | 118,14 | 1,2900 0,71 |
| 9.1.3 | PONTO P/ AR CONDICIONADO (TUBULAÇÃO, C.J. AIRTOP E FIACÃO.) | PTS | 4,00 | 127,66 | 510,63 | SEDOP 230846 | 98,96 | 1,2900 0,12 |
| 9.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2,00 | 1526,66 | 3.053,33 | SINAPI 74131/008 | 1.183,46 | 1,2900 0,71 |
| 9.1.5 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" x 2,40m C/ CONECTOR | UND | 5,00 | 91,14 | 455,69 | SEDOP 171164 | 70,65 | 1,2900 0,11 |
| 9.1.6 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6,00 | 357,39 | 2.144,37 | SEDOP 250732 | 277,05 | 1,2900 0,50 |
| 9.1.7 | QUADRO DE MEDAÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1,00 | 704,26 | 704,26 | SEDOP 170615 | 545,94 | 1,2900 0,16 |
| 9.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2,00 | 228,48 | 456,97 | SEDOP 180680 | 177,12 | 1,2900 0,11 |

R\$ 428.476,07



| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | DATA DA VISITÓRIA: XXXX | | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXXX | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|---------------------|----------|--------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA. | | | | VALOR DA OBRA: R\$ 428.476,07 | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | TABELA | | | |
| | | | | | SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO | B.D. I (%) | | |
| UNITÁRIO | TOTAL | Ref. Código | Custo | 29,00% | | | | |
| M | 60,00 | 21,43 | 1.285,61 | SEDOP 171092 | 1.2900 | 0,30 | | |
| M | 10,00 | 26,06 | 260,58 | SEDOP 171017 | 20,20 | 1,2900 | | |
| UND | 1.270,00 | 21,53 | 27.343,23 | SEDOP 171175 | 16,69 | 1,2900 | | |
| | | | 21.633,30 | | | 5,0489 | | |
| 9.1.9 | ELETRODUTO F ^o G ^o 3/4" | M | 60,00 | 21,43 | SEDOP 180214 | 262,78 | 1,2900 | |
| 9.1.1 | ELETRODUTO F ^o G ^o 1" | M | 10,00 | 26,06 | SEDOP 180299 | 289,55 | 1,2900 | |
| 9.1.1 | ISOLADOR DE PLÁSTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TESÃO | UND | 1.270,00 | 21,53 | SINAPI 95463 | 1.298,54 | 1,2900 | |
| 9.2 | HIDROSANTÁRIA: | | | 21.633,30 | | | | |
| 9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 13,00 | 338,99 | 4.406,82 | 262,78 | 1,2900 | |
| 9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 19,00 | 373,52 | 7.096,87 | 289,55 | 1,2900 | |
| 9.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | 1,00 | 1.675,12 | 1.675,12 | 1.298,54 | 1,2900 | |
| 9.2.4 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM. | UND | 1,00 | 1.955,30 | 1.955,30 | SINAPI 74198/002 | 1.515,74 | 1,2900 |
| 9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PREMOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4,00 | 151,63 | 606,51 | SINAPI 74051/002 | 117,54 | 1,2900 |

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pará 1515257320



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INEBRA-ESTRUTURA - SEMINEBA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA: XXX

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | DATA DA VISTORIA: XXX | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXX |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA. | VALOR DA OBRA: | R\$ 428.476,07 |

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | DATA DA VISTORIA: XXX | | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXX | |
|--|--|-----------------------|--------|------------------------|--|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA. | | VALOR DA OBRA: | | R\$ 428.476,07 | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | TABELA |
| | | | | | SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO |
| | | UNITÁRIO | TOTAL | Ref. Código | Custo |
| 9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACÍCO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C | UND | 6,00 | 176,60 | 1.059,61 SINAPI 74104/001 |
| 9.2.7 | CANAleta EM ALVENARIA 30x30cm, REBOCADA POR DENTRO. | M | 33,56 | 98,36 | 3.301,05 SEDOP 180513 |
| 9.2.8 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 1.500 L | UND | 1,00 | 1.532,03 | 1.532,03 SEDOP 180836 |
| 10.0 FORRO: | | | | 18.562,96 | 4,3323 |
| 10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m ² | 213,31 | 45,59 | 9.724,50 SEDOP 140348 |
| 10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m ² | 213,31 | 41,43 | 8.838,46 SEDOP 141336 |
| 11.0 ESQUADRIAS: | | | | 30.316,62 | 7,0755 |
| 11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m ² | 15,54 | 537,23 | 8.348,61 SEDOP 90062 |
| 11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m ² | 24,80 | 599,84 | 14.875,96 SEDOP 91376 |
| 11.3 | PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA | m ² | 8,64 | 820,84 | 7.092,06 SEDOP 91500 |

~~CEP 105 - Aler Olíviera da Silveira
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8~~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

José Alair Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA VISITÓRIA: XXX

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | UNITÁRIO | TOTAL | TABELA SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO | | Ref. Código | Custo | B.D. I (%) | CURVA DO ABC (%) | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXX |
|------------------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----------|---|------------|-------------|--------|------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | | SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO | B.D. I (%) | | | | | |
| 12.0 PINTURA: | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | PVA INTERNA COM MASSA ACRÍLICA E SELADOR | m ² | 843,72 | 30,26 | 25.533,84 | 30.967,80 | SEDOPI 150730 | 23,46 | 1,2900 | 1,2900 | 23,46 | 5,9592 | 7,2274 |
| 12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LÍQUIDO PREPARADO. | m ² | 281,20 | 19,32 | 5.433,97 | 5.433,97 | SEDOPI 150252 | 14,98 | 1,2900 | 1,2900 | 14,98 | 1,2682 | |
| 13.0 LOUÇAS E METAIS: | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3,00 | 433,47 | 1.300,40 | 1.300,40 | SEDOPI 190090 | 336,02 | 1,2900 | 1,2900 | 336,02 | 0,3035 | |
| 13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2,00 | 570,84 | 1.141,68 | 1.141,68 | SEDOPI 190375 | 442,51 | 1,2900 | 1,2900 | 442,51 | 0,2665 | |
| 13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFAO E VALV. (1,50M) | UND | 3,00 | 603,69 | 1.811,08 | 1.811,08 | SEDOPI 190238 | 467,98 | 1,2900 | 1,2900 | 467,98 | 0,4227 | |
| 13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2,00 | 27,18 | 54,36 | 54,36 | SEDOPI 190218 | 21,07 | 1,2900 | 1,2900 | 21,07 | 0,0127 | |
| 14.0 COBERTURA: | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m ² | 10,02 | 60,31 | 604,31 | 604,31 | SEDOPI 070030 | 46,75 | 1,2900 | 1,2900 | 46,75 | 0,1410 | |
| 14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m ² | 10,02 | 192,22 | 1.926,17 | 1.926,17 | SEDOPI 071362 | 149,01 | 1,2900 | 1,2900 | 149,01 | 0,4495 | |
| 14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PC APARELHADA | m ² | 224,22 | 60,99 | 13.675,45 | 13.675,45 | SEDOPI 070053 | 47,28 | 1,2900 | 1,2900 | 47,28 | 3,1916 | |
| 14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m ² | 224,22 | 65,92 | 14.780,36 | 14.780,36 | SEDOPI 070169 | 51,10 | 1,2900 | 1,2900 | 51,10 | 3,4495 | |
| 14.5 | DESCÜPINIZAÇÃO | m ² | 224,22 | 7,64 | 1.712,32 | 1.712,32 | SEDOPI 080028 | 5,92 | 1,2900 | 1,2900 | 5,92 | 0,3996 | |





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | DATA DA VISITÓRIA: XXXX | | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXXX | |
|--|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA. | | VALOR DA OBRA: | | R\$ 428.476,07 | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO | TABELA SINAPI/PA - 04/2018 SEDOP/PA - 04/2018 COM DESONERAÇÃO |
| | | UNITÁRIO | TOTAL | Ref. Código | Custo |
| 15.0 COMBATE INCÊNDIO: | | | | 1.437,50 | 0,3355 |
| 15.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8,00 | 68,90 | 551,19 | SEDOP 241468 |
| 15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UND | 2,00 | 443,15 | 343,53 | SEDOP 201328 |
| 16.0 DIVERSOS: | | | | 27.681,72 | 6,4605 |
| 16.1 BARRA EM AÇO - PNE | m | 3,00 | 261,72 | 785,146 | SEDOP 190716 |
| 16.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BAIXO RELEVO- (60x40cm) | UND | 1,00 | 2.313,65 | 2.313,654 | SEDOP 241319 |
| 16.3 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m ² | 213,31 | 5,86 | 1.249,27 | SEDOP 270220 |
| 16.4 TELA TIPO MOEDA (Tela do muro) | m ² | 145,00 | 148,52 | 21.535,07 | SEDOP 270220 |
| 16.5 MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1,00 | 1.798,58 | 1.798,58 | SEDOP 260188 |
| CUSTO TOTAL | M² | 306,10 | 1.399,79 | 428.476,07 | 100,0000 |

Itaituba - PA, 10 de Julho de 2018

Aceite

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Júnior



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | DATA DA VISTORIA: XXX | DATA DA EXPEDIÇÃO: XXX | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA. | | R\$ 428.476,07 | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| ITEM | | | | | | | |
| ITEM | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL | Ref. Código | Custo | 29,00% |
| | | | | | | | |

Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Alc. Oliveira da Costa Júnior
Alc. Oliveira da Costa Júnior
Engenheiro Civil
Eng.º 151525739-8
Crea-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA:

10/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA:

10/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA:

10/07/2018

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 04 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL PARCIAL |
|---------------------------------|---|----------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa da obra em lona com plotagem gráfica | m ² | 6,16 | 203,52 | 100% 1.253,70 | 100% 1.253,70 | - | - | - | 1.253,70 |
| 1.2 | Barracão da obra de madeira, incl. instalações | m ² | 18,00 | 497,79 | 100% 8.960,13 | 100% 8.960,13 | - | - | - | 8.960,13 |
| 1.3 | Entrada provisória de energia elétrica | m ² | 1,00 | 1.673,56 | 100% 1.673,56 | 100% 1.673,56 | - | - | - | 1.673,56 |
| 1.4 | Locação de obra a trenha | m ² | 229,63 | 4,57 | 100% 1.048,63 | 100% 1.048,63 | - | - | - | 1.048,63 |
| 1.5 | Limpeza do terreno | m ² | 1.600,00 | 1,75 | 100% 2.807,04 | 100% 2.807,04 | - | - | - | 2.807,04 |
| 2.0 MOVIMENTO DE TERRA: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m ³ | 9,15 | 43,75 | 100% 400,31 | 100% 400,31 | - | - | - | 400,31 |
| 2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apilamento | m ³ | 2,75 | 102,61 | 100% 281,66 | 100% 281,66 | - | - | - | 100% 281,66 |
| 3.0 ESTRUTURA: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca | m ³ | 13,08 | 2.501,71 | 100% 32.732,37 | 40% 13.092,95 | 30% 9.819,71 | 30% 9.819,71 | - | 100% 32.732,37 |
| 4.0 FUNDADAÇÃO: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | m ³ | 4,03 | 2.307,87 | 100% 9.300,72 | 100% 9.300,72 | - | - | - | 9.300,72 |
| 5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Impermeabilização rebaixos banho./coz. (tinta asfáltica) (bloco e baldrame) | m ³ | 9,15 | 2.307,87 | 100% 21.117,01 | 100% 21.117,01 | - | - | - | 21.117,01 |

Levy

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil

Cra-PA: 1515257398



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data:

10/07/2018

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 04 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL | PARCIAL |
|------------|---|----------------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------|----------------|
| 6.0 | PAREDES E FAINEIS | | | | | | | | | | |
| 6.1. | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO MURETA EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO, 2 FACES, ALTURA DE ATÉ 1,00M. | m ² | 428,26 | 54,24 | 100% 23.230,75 | - | - | 50% 11.615,37 | - | - | 100% 23.230,75 |
| 6.2. | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | M | 160,00 | 289,46 | 100% 46.314,10 | - | - | - | - | - | 100% 46.314,10 |
| 6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 35,40 | 33,46 | 100% 1.184,58 | - | - | 50% 592,29 | - | - | 100% 1.184,58 |
| 6.4 | REVESTIMENTO: | m | 11,00 | 20,54 | 100% 225,90 | - | - | 50% 112,95 | - | - | 100% 225,90 |
| 7.0 | REVESTIMENTO: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m ² | 768,10 | 9,61 | 100% 7.381,83 | - | - | - | - | - | 100% 7.381,83 |
| 7.2 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRACO 1:5:1 | m ² | 768,10 | 39,02 | 100% 29.973,18 | - | - | 100% 29.973,18 | - | - | 100% 29.973,18 |
| 7.3 | PAVIMENTAÇÃO: | m ² | 38,24 | 97,82 | 100% 3.740,66 | - | - | 100% 3.740,66 | - | - | 100% 3.740,66 |
| 8.0 | PAVIMENTAÇÃO: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO CIMENTADO QUEIMADO | m ² | 213,36 | 53,28 | 100% 11.367,18 | - | - | 100% 11.367,18 | - | - | 100% 11.367,18 |
| 8.2 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MEDIO) | m ² | 103,41 | 51,48 | 100% 5.323,95 | - | - | 100% 5.323,95 | - | - | 100% 5.323,95 |
| 8.2 | | m ² | 109,95 | 87,53 | 100% 9.523,54 | - | - | 100% 9.623,54 | - | - | 100% 9.623,54 |

Acaba
José Alcides Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151325739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ MÊSSES | 04 | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL PARCIAL |
|-------|--|---------|------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 9.0 | INSTALAÇÕES: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ELÉTRICA: | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUIDO LUMINÁRIA E LAMPADA) . AF 01/2016 | UND | 29 | 126,43 | 100% | - | 50% | - | - | - | 100% 3.666,55 |
| 9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016. | UND | 20,00 | 152,40 | 100% | 3.048,01 | 1.524,01 | 1.524,01 | - | - | 100% 3.048,01 |
| 9.1.3 | PONTO P/ AR CONDICIONADO (TUBULAÇÃO, C.J. AIRTOP E FIXAÇÃO.) | PTS | 4,00 | 127,66 | 100% | 510,63 | - | 50% | 255,32 | 255,32 | 100% 510,63 |
| 9.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E. INSTALAÇÃO. | UND | 2,00 | 1.526,66 | 100% | 3.053,33 | - | 50% | 1.526,66 | 1.526,66 | 100% 3.053,33 |
| 9.1.5 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40m C/ CONECTOR | UND | 5,00 | 51,14 | 100% | 455,69 | - | 50% | 227,85 | 227,85 | 100% 455,69 |
| 9.1.6 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6,00 | 357,39 | 100% | 2.144,37 | - | 50% | 1.072,18 | 1.072,18 | 100% 2.144,37 |
| 9.1.7 | QUADRO DE MEDIDAÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1,00 | 704,26 | 100% | 704,26 | - | 50% | 352,13 | 352,13 | 100% 704,26 |

~~Alcântara Silveira Junior
José Alcântara Silveira Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pará: 151525739-8~~



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

José Alair Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA TÉCNICA E ORÇAMENTO



PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO = FINACETBO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 04 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL PARCIAL |
|-------------------------|--|---------|------------|----------------|------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| §.2.7 | CANALETAS EM ALVENARIA 30x30cm, REBOCADA POR DENTRO. | M | 33,56 | 98,36 | 100% | - | 50% | 50% | - | 100% |
| 9.2.9 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 1.500 L | UND | 1 | 1.532,03 | 3.301,05 100% 1.532,03 | - | 1.650,52 50% 766,01 | 1.650,52 50% 766,01 | - | 3.301,05 100% 1.532,03 |
| 10.0 FORRO: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 213,31 | 45,59 | 100% 9.724,50 100% | - | - | - | - | 100% 9.724,50 100% |
| 10.2. | FORRO EM LAMBRIZ PVC. | m² | 213,31 | 41,43 | 8.838,46 | - | - | - | - | 8.838,46 |
| 11.0 ESQUADRIAS: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELADA ALIZAR. | m² | 15,54 | 537,23 | 100% 8.348,61 100% | - | - | - | - | 100% 8.348,61 100% |
| 11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 24,80 | 599,84 | 14.875,96 100% | - | - | - | - | 14.875,96 100% |
| 11.3 | PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTI FERRUGINOSA | m² | 8,64 | 820,84 | 7.092,06 | - | - | - | - | 7.092,06 100% 7.092,06 |
| 12.0 PINTURA: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | PVA INTERNA COM MASSA ACRÍLICA E SELADOR | m² | 843,72 | 30,26 | 100% 25.533,84 100% | - | - | - | - | 100% 25.533,84 100% |
| 12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LÍQUIDO PREPARADO. | m² | 281,20 | 19,32 | 5.433,97 | - | - | - | - | 5.433,97 100% |

José Antônio Viana
Engenheiro Civil
Crea-PA: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 04 MÊSES | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL PARCIAL |
|------------------------------|---|----------------|------------|----------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| | | | | | CONTRATO P/ 04 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | | | | | |
| 13.0 LOUCAS E METAIS: | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3,00 | 433,47 | 100% | 1.300,40 | - | - | - | - | 1.300,40 | 100% |
| 13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIEÃO E VALVULA. | UND | 2,00 | 570,84 | 100% | - | - | - | - | - | 1.141,68 | 100% |
| 13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFAO E VALV. (1,50M) | UND | 3,00 | 603,69 | 100% | - | - | - | - | - | 1.811,08 | 100% |
| 13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2,00 | 27,18 | 100% | - | - | - | - | - | 54,36 | 100% |
| 14.0 COBERTURA: | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m ² | 10,02 | 60,31 | 100% | - | - | - | - | - | 604,31 | 100% |
| 14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m ² | 10,02 | 192,22 | 100% | - | - | - | - | - | 1.926,17 | 100% |
| 14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PC APARELHADA | m ² | 224,22 | 60,99 | 100% | - | - | - | - | - | 13.675,45 | 100% |
| 14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m ² | 224,22 | 65,92 | 100% | - | - | - | - | - | 14.780,36 | 100% |
| 14.5 | DESCUPINIZAÇÃO | m ² | 224,22 | 7,64 | 100% | - | - | - | - | - | 1.712,32 | 100% |

CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

Data:
10/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

Data:
10/07/2018

Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE JESUS LIMA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO

Itaituba - PA, 10 de Julho de 2018

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 161525739-8

~~José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA~~



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | m² | 6,16 |
|----------------------------|---|-------|-------------|
| 1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA -> (2,80m x 2,20m) | Total | m² 6,16 |
| 1.2 | BARRACÃO DA OBRA DE MADEIRA, INCL. INTALAÇÕES -> (3,00m x 6,00m) | Total | m² 18,00 |
| 1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | | UND 1,00 |
| | | Total | UND 1,00 |
| 1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | Total | m² 229,63 |
| 1.5 | LIMPEZA DO TERRENO 40,00m x 40,00m = 1.600,00m² | | m² 1.600,00 |
| 2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: | | m³ | |
| 2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga baldrame) | | |
| 2.2 | BLOCOS -> (0,60m x 0,60m x 0,40m)28 unidades. | m³ | 4,03 |
| 2.2 | VIGA BALDRAME -> (113,70m x 0,30m x 0,15m) | m³ | 5,12 |
| | | Total | m³ 9,15 |
| 2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apilamento (30% dos blocos e vigas baldrame) | m³ | 2,75 |
| | | Total | m³ 2,75 |
| 3.0 ESTRUTURA: | | m³ | |
| 3.1.0 | CONC.ARMADO FCK 20 MPA C/ FORMA DE MAD. BRANCA | | |
| 3.1.1 | PILARES GERAL | m³ | 2,61 |
| 3.1.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO | m³ | 3,41 |
| 3.1.4 | VIGA BALDRAME | m³ | 5,12 |
| 3.1.5 | SEGUIMENTO DOS PILARES DA MURETA P/ TELA | m³ | 1,94 |
| | Total de Concreto Armado | m³ | 13,08 |
| 4.0 FUNDAÇÃO: | | m³ | |
| 4.1.0 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | | |
| 4.1.1 | --> (0,60m x 0,60m x 0,40m)28 unidades. | m³ | 4,03 |
| | | Total | m³ 4,03 |

Alcides
José Alcides Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| 5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO: | | | |
|------------------------|--|----------------|--------|
| 5.1.0 | Impermeabilização rebaixos banho./coz. (tinta asfáltica) (bloco e baldrame) | | |
| 5.1.1 | BLOCOS -> (0,60m x 0,60m x 0,40m) 28 unidades. | m ³ | 4,03 |
| 5.1.2 | VIGA BALDRAME -> (113,70m x 0,30m x 0,15m) | m ³ | 5,12 |
| | Total | m ³ | 9,15 |
| 6.0 PAREDES E PAINEIS: | | | |
| 6.1.0 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | | |
| 6.1.1 | PAREDES -> [(3,10m x 1,80m) + (73,24m x 3,00m) + (41,42m x 4,90m)] | m ² | 428,26 |
| | Total | m ² | 428,26 |
| 6.2 | MURETA EM ALVENARIA H= 1,00M -> 160,00 m | m | 160,00 |
| | Total | m ² | 160,00 |
| 6.3 | TELAS P/ ALAMBRADO SOLDADA 25,00x1,00m Fio 2,30mm | m | 160,00 |
| | Total | m | 160,00 |
| 6.4 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 35,40 |
| | Total | m | 35,40 |
| 6.5 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 11,00 |
| | Total | m | 11,00 |
| 7.0 REVESTIMENTO | | | |
| 7.1 | CHAPISCO -> ALVENARIA [(73,24m x 3,00m) 2 FACES + (41,42m x 3,00) 2 FACES + (41,42m x 1,80m) 1 FACE + (3,10 m x 1,80m) 1 FACE] | m ² | 768,10 |
| | Total | m ² | 768,10 |
| 7.2 | REBOCO -> (ALVENARIA 2238,49 x 2 FACES) + 01 FACE LAGE CABINE VIP (22,50m x 8,10m)x 2 lages. | m ² | 768,10 |
| | Total | m ² | 768,10 |
| 7.3.0 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | | |
| 7.3.1 | -> [((2,70m + 2,70m + 1,50m + 1,50m)x 1,60m altura) x 2 banheiros + (2,05m + 2,05m + 1,50m + 1,50m)x 1,60m altura] | m ² | 38,24 |
| | Total | m ² | 38,24 |
| 8.0 PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 8.1.0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | | |
| 8.1.1 | ÁREAS -> ((49,40m x 2) + 81.69m ² + 5,66m ² + 5,20m ² + 3,06m ² + 7,80m ² + (4,05m ² x 2) + 3,05m ²) | m ² | 213,36 |
| | Total | m ² | 213,36 |
| 8.2.0 | CIMENTADO QUEIMADO | | |
| 8.2.1 | ÁREAS -> (81.69m ² + 5,66m ² + 5,20m ² + 3,06m ² + 7,80m ²) | m ² | 103,41 |

Neir

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| Total | m ² | 103,41 |
|-------|----------------|--------|
| | | |

Alcyr
José Alcyr Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| | | | | |
|-------|--|-------|----------|----------|
| 8.3.0 | PISO CERAMICO (BANHEIROS) | | | |
| 8.3.1 | banheiros --> $((49,40m \times 2) + (4,05m^2 \times 2) + 3,05m^2)$ | m^2 | 109,95 | |
| | | Total | m^2 | 109,95 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES: | | | |
| 9.1 | ELÉTRICA | | | |
| 9.1.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 29 | |
| | | Total | UND | 29 |
| 9.1.5 | PONTO DE TOMADA 20A/250V | UND | 20 | |
| | | Total | UND | 20 |
| 9.1.7 | PONTO P/ AR CONDICIONADO | UND | 4 | |
| | | Total | UND | 4 |
| 9.1.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 2 | |
| | | Total | UND | 2 |
| 9.1.8 | HASTE PARA ATERRAMENTO | UND | 5 | |
| | | Total | UND | 5 |
| 9.1.8 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | |
| | | Total | UND | 6 |
| 9.1.8 | QUADRO DE MEDAÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | |
| | | Total | UND | 1 |
| 9.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2 | |
| | | Total | UND | 2 |
| 9.1.8 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 60,00 | |
| | | Total | M | 60,00 |
| 9.1.8 | ELETRODUTO FºGº 1" | M | 10,00 | |
| | | Total | M | 10,00 |
| 9.1.8 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TESÃO. | UND | 1.270,00 | |
| | | Total | UND | 1.270,00 |
| 9.2 | HIDROSANITÁRIA: | | | |
| 9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | | | |
| | ESCOLA GERAL | unid | 13 | |
| | | Total | unid | 13 |
| 9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | | | |
| | ESCOLA GERAL | unid | 19 | |
| | | Total | unid | 19 |

Neila

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|--------|
| 9.2.3 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO IMHOFF, COM TAMPA PARA 200 CONTRIBUINTES. | | | |
| | ESCOLA GERAL | unid | 1 | |
| | | Total | unid | 1 |
| 9.2.4 | FILTRO ANAEROBICO EM CONCRETO ARMADO D=1,4m / p=1,8m | | | |
| | ESCOLA GERAL | unid | 1 | |
| | | Total | unid | 1 |
| 9.2.5 | CAIXA DE GORDURA | unid | 4 | |
| | | Total | unid | 4 |
| 9.2.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO | unid | 6 | |
| | | Total | unid | 6 |
| 9.2.7 | CANAleta EM ALVENARIA 30x30cm, REBOCADA POR DENTRO. | m | 33,56 | |
| | | Total | m | 33,56 |
| 9.2.8 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UND | 1,00 | |
| | | Total | UND | 1,00 |
| 10.0 | FORRO: | | | |
| 10.1.0 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | | | |
| 10.1.1 | TODAS AS UNIDADES INCL. PÁTIO | m ² | 213,31 | |
| | | Total | m ² | 213,31 |
| 10.2.0 | FORRO EM LAMBRI DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM. | | | |
| 10.2.1 | TODAS AS UNIDADES INCL. ÁREA DE CIRCULAÇÃO - TÉRREO | m ² | 213,31 | |
| | | Total | m ² | 213,31 |
| 11.0 | ESQUADRIAS: | | | |
| 11.1 | BALANCINS e JANELAS | | | |
| 11.2.1 | J1 -> (0,80 x 3,00)m x 6 unid. | m ² | 14,40 | |
| 11.2.2 | J2 -> (1,20 x 2,00)m 2 unid. | m ² | 4,80 | |
| 11.2.3 | J3 -> (1,00 x 1,30)m x 2 unid. | m ² | 2,60 | |
| 11.2.4 | J4 -> (1,20 x 1,50)x 1 unid. | m ² | 1,80 | |
| 11.2.5 | J5 -> (0,50 x 0,80)x 3 unid. | m ² | 1,20 | |
| | | Total | m ² | 24,80 |
| 11.2 | PORtAS | | | |
| 11.2.1 | P1 -> (0,80 x 2,10)m x 4 unid. | m ² | 6,72 | |
| 11.2.2 | P2 -> (1,00 x 2,10)m 3 unid. | m ² | 6,30 | |
| 11.2.3 | P3 -> (0,60 x 2,10)m x 2 unid. | m ² | 2,52 | |
| | | Total | m ² | 15,54 |

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|--------|
| 11.3 | PORTESES | | | |
| 11.3.1 | PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA | | | |
| 11.3.2 | P --> [(2,10m x 1,83m) + (2,80m x 2,00m)] | m ² | 8,64 | |
| | | Total | m ² | 8,64 |
| 12.0 | PINTURA: | | | |
| 12.1.0 | PVA INTERNA COM MASSA ACRÍLICA E SELADOR | | | |
| 12.1.1 | PAREDES -> [(281,24m x 3,00m)] | m ² | 843,72 | |
| | | Total | m ² | 843,72 |
| 12.2.0 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LÍQUIDO PREPARADO. | | | |
| 12.2.1 | PAREDE -> [(76,26m x 3,00m) + (29,12m x 1,80m)] | m ² | 281,20 | |
| | | Total | m ² | 281,20 |
| 13.0 | LOUÇAS E METAIS: | | | |
| 13.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPPLADA, DE LOUÇA BRANCA. | | | |
| | Banheiros - Térreo e 1 ^a Pavimento | unid | 3 | |
| | | Total | unid | 3 |
| 13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | | | |
| | BANHEIRO | unid | 2 | |
| | | Total | unid | 2 |
| 13.3 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifao e valv. (1,50m) | | | |
| | banheiros em geral | unid | 3 | |
| | | Total | unid | 3 |
| 13.4 | Chuveiro em PVC | | | |
| | Banheiros Masculino - Térreo e 1 ^a Pavimento | m ² | 2,00 | |
| | | Total | m ² | 2,00 |
| 14.0 | COBERTURA: | | | |
| 14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | | | |
| | TENDO DA ENTRADA -> (4,09m x 2,45m) | m ² | 10,02 | |
| | | Total | m ² | 10,02 |
| 14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | | | |
| | TENDO DA ENTRADA | m ² | 10,02 | |
| | | Total | m ² | 10,02 |
| 14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | | | |
| | ESCOLA GERAL | m ² | 224,22 | |
| | | Total | m ² | 224,22 |

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

Local: VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA.

Município: ITAITUBA - PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| | | | | |
|------|---|-------|----------------|--------|
| 14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO 8=mm ESCOLA GERAL | | m ² | 224,22 |
| | | Total | m ² | 224,22 |
| 14.5 | DESCUPINIZAÇÃO ESCOLA GERAL | | m ² | 224,22 |
| | | Total | m ² | 224,22 |
| 15.0 | COMBATE INCÊNDIO: | | | |
| 15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | | unid | 8 |
| | | Total | unid | 8 |
| 15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | | unid | 2 |
| | | Total | unid | 2 |
| 16.0 | DIVERSOS: | | | |
| 16.1 | BARRA EM AÇO - PNE Banheiro acessível -> (0,80m x 3 barras) Acrécimo de 25% | | m | 3,00 |
| | | Total | m ² | 3,00 |
| 16.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BAIXO RELEVO- (60x40cm) | | UND | 1,00 |
| | | Total | UND | 1,00 |
| 16.3 | Limpeza e entrega da obra. (SALAS DE AULA E BANHEIROS) | | m ² | 213,31 |
| | | Total | m ² | 213,31 |
| 16.4 | TELA TIPO MOEDA (Tela do muro) | | m ² | 145,00 |
| | | Total | m ² | 145,00 |
| 16.5 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | | CJ | 1 |
| | | Total | CJ | 1 |

Itaituba - Pa, 10 de Julho de 2018

Alcir
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATO:

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA na Cidade de Itaituba / Pa

PROGRAMA: PLANO DE TRABALHO

MODALIDADE: REFORMA

GESTOR: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

Cálculo do BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

DEMONSTRATIVO BDI

| ITENS | SIGLAS | VALORES |
|---|-----------|----------------------------------|
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5,50% |
| TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | G | 0,45% |
| TAXA DE SEGURO | S | 0,45% |
| TAXA DE RISCO | R | 1,27% |
| | Sub-Total | 7,67% |
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1,00% |
| TAXA DE LUCRO | L | 8,66% |
| TAXA DE TRIBUTOS | I | 0,65% 3,00% 0,25% 4,50% |
| TAXA TOTAL DE IMPOSTO | I | 8,40% |
| BDI RESULTANTE | | 29,00% |

| LIMITE RECOMENDADOS | |
|---------------------|----------|
| INFERIOR | SUPERIOR |
| 3,00% | 5,50% |
| 0,40% | 0,50% |
| 0,40% | 0,50% |
| 0,97% | 1,27% |

| | |
|----------|--------|
| 0,59% | 1,39% |
| 6,16% | 8,96% |
| VARIÁVEL | |
| 25,00% | 30,00% |





Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$\text{BDI} = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$$

Itaituba - Pa, 10 de Julho de 2.018

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engª Civil - CREA 151525739-8 PA

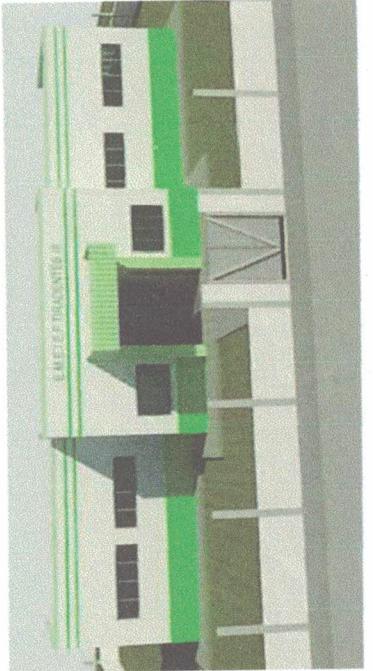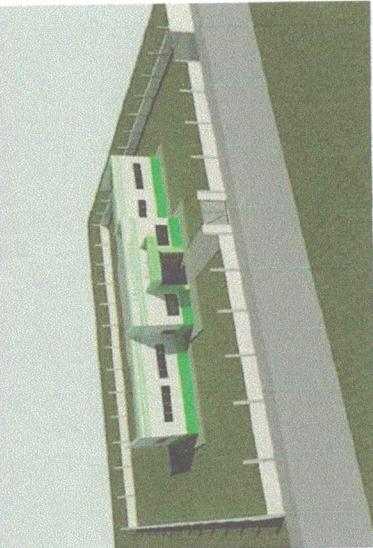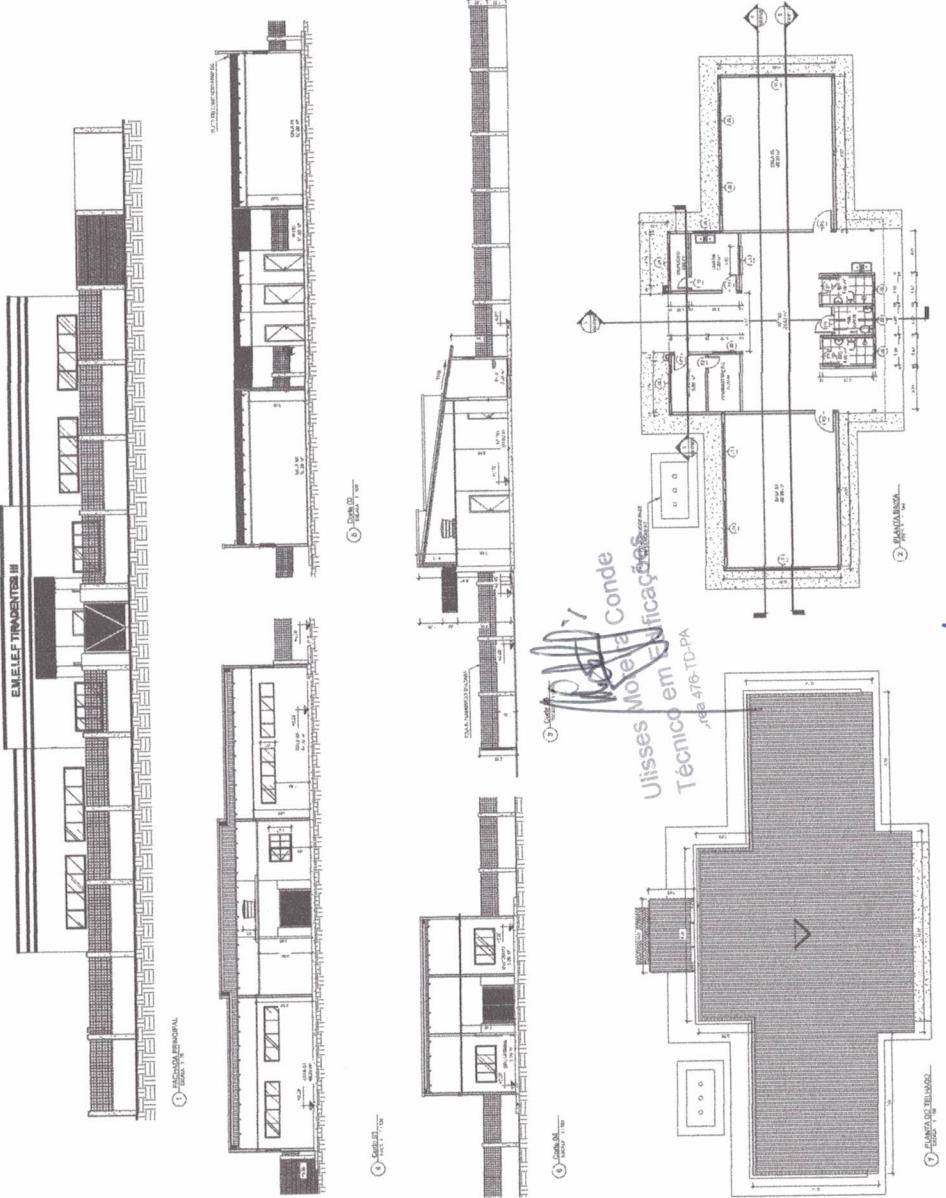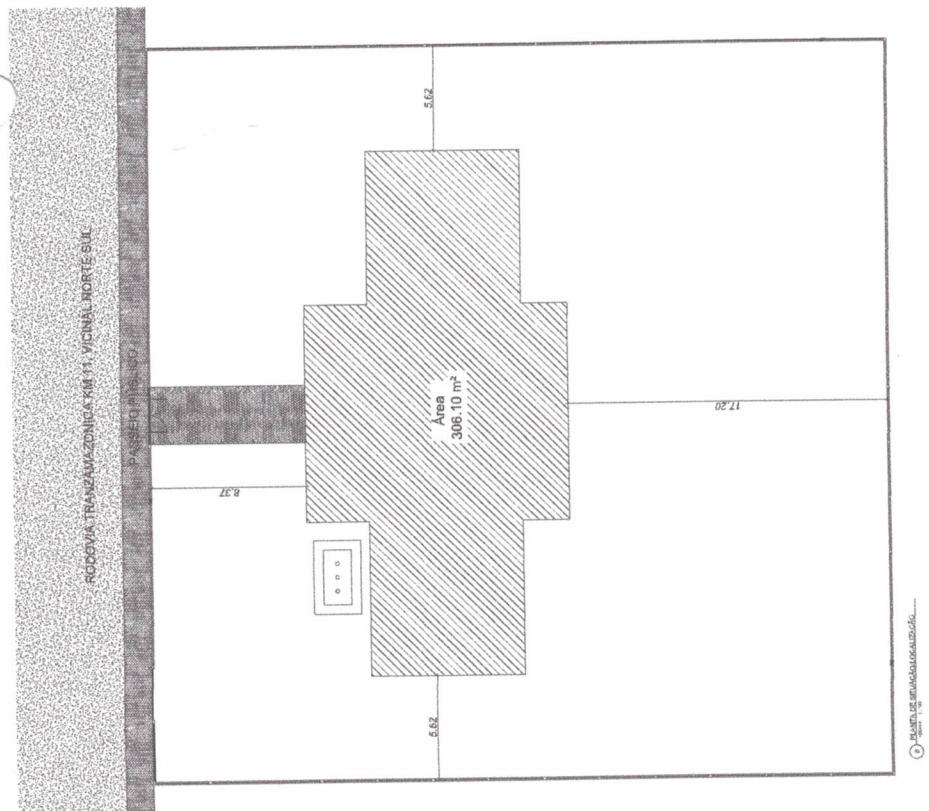

EDICIÓN TRADUCIDA AL VICINAL NORTE SUR

RIOGRANDE FRANZIA CONCESSION KM 11 VIAL DEL NORTE-SUR
PASEO DE LOS LAGOS

The image contains five architectural drawings of the EAMELLE TRADENTES II building complex:

- Left Drawing:** A long elevation view showing a series of rectangular buildings with various window patterns and a decorative border at the bottom.
- Top Center Drawing:** A detailed cross-section of a building section labeled "ELEVATION TRADENTES II". It shows multiple floors with windows, a central entrance, and internal rooms.
- Bottom Center Drawing:** A detailed cross-section of a building section labeled "ELEVATION TRADENTES II". It shows multiple floors with windows, a central entrance, and internal rooms.
- Right Center Drawing:** A detailed cross-section of a building section labeled "ELEVATION TRADENTES II". It shows multiple floors with windows, a central entrance, and internal rooms.
- Bottom Right Drawing:** A detailed cross-section of a building section labeled "ELEVATION TRADENTES II". It shows multiple floors with windows, a central entrance, and internal rooms.

DESENHO DE INGRESSO DA TERRA SÓLIDA

DETALHAMENTO DO INGRESSO DA TERRA SÓLIDA

Projeto: *José Alcides Oliveira da Silva Júnior*
Engenheiro Civil
Crea-PR: 151525739-8

Assinatura do Projetista: *José Alcides Oliveira da Silva Júnior*
CREA-PR


Assinatura do Revisor: *José Alcides Oliveira da Silva Júnior*
CREA-PR 151525739-8 DIFIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CNPJ: 13.873.000/0001-77


PROFISSIONAL:

SEMINFRA
Sexta-feira Itatubana é Infraestrutura


| | | |
|-------------|---|--|
| ANEXO: | PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL INF. E FUND. NOSSA SENHORA DE SANTANA | |
| CARACTER: | VICINAL NORTE SUL, COMUNIDADE SANTA RITA - ITAITUBA / PA. | |
| PROJETO: | ARQUITETÔNICO | |
| RESTR. DE: | PLANTAS: BAIXA, CORTES, SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO, TELHADO E VISTAS 3D | |
| OBRA: | EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO ELABORADO. | |
| CONTATO: | projetoespergantaria1@gmail.com 0XX81) 88167-8005 | |
| INSTRUÇÕES: | ACEITO ALTO DE 5% Sobre o valor da obra. Assinatura: _____ | |
| DATA: | 26 de maio de 2018 | |
| ASSINATURA: | Ano corrente: 2018 10 MP | |

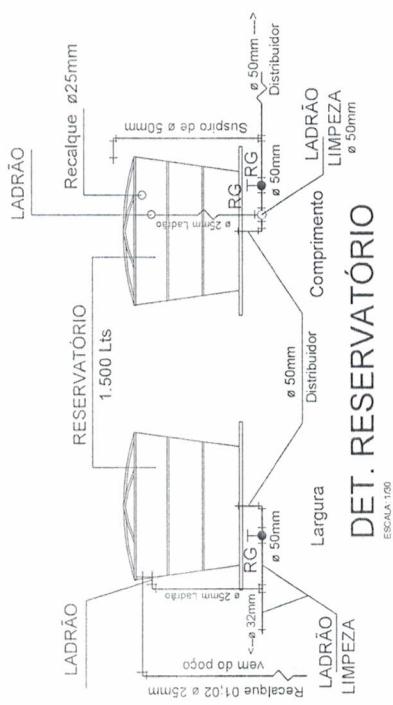



DET. RESERVATÓRIO

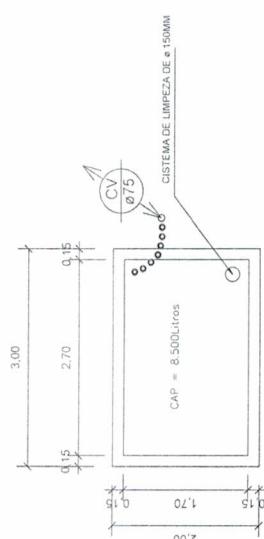

PLANTA BAIXA - TANQUE SÉPTICO
ESCALA: 1/35

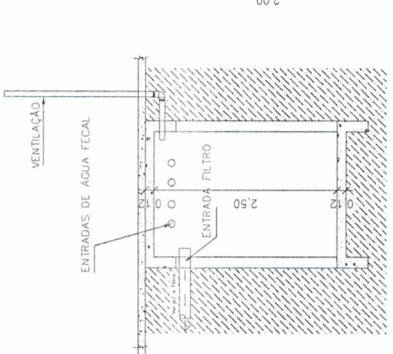

CORTE - TANQUE SÉPTICO
ESCALA: 1/35

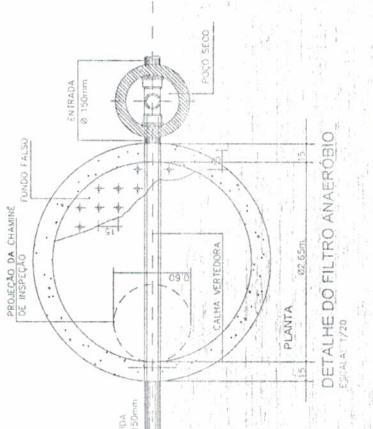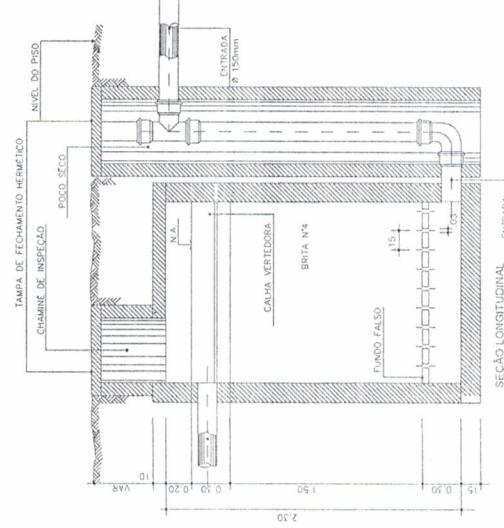




DETALHE DO FILTRO ANAERÓBIO

~~Av. Alen Oliveira da Silva yam~~
Engenheiro Civil
Crea-Pa: 151525739-8



COMUNIDADE SANTARITA - ITAITUBA

212

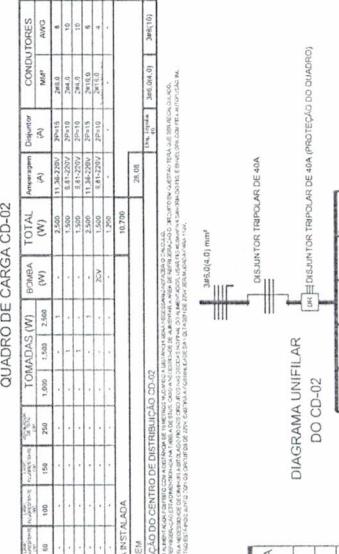

| TAMANHO DO AMBIENTE | SOL DE MANHÃ | SOL À TARDE OU DIA TODO |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| $A \leq 10m^2$ | Até 7.500 BTUs | Até 7.500 BTUs |
| $12m^2$ | 7.500 BTUs | 10.000 BTUs |

| Area | BTU Output | Cost |
|------------------|-------------|-------------|
| 70m ² | 30,000 BTUs | 30,000 BTUs |
| 80m ² | 36,000 BTUs | 36,000 BTUs |

