



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018 – TP

ANEXO I – PROJETO DA OBRA

**OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO
COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO
NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA
CIDADE DE ITAITUBA-PÁ.**

**LOCAL – AVENIDA FORTUNADO CARNEIRO N° 707– BAIRRO
BELA VISTA – ITAITUBA-PÁ .**



DIRETORIA TÉCNICA

MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABRIGO INFANTIL MUNICIPAL

**Obra de engenharia para construção e AMPLIAÇÃO DO
GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS,
localizada na Avenida Fortunato Carneiro nº 707 - Bairro da Bela
vista - Itaituba/pará.**



Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

MARÇO / 2018

SUMÁRIO

A - ORIENTAÇÕES GERAIS	4
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	4
2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.....	4
3. Orientação Geral e Fiscalização	5
4. SERVIÇOS PRELIMINARES.....	8
5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9
6. FUNDAÇÃO	10
7. ESTRUTURA.....	11
8. PAREDES E PAINEIS	11
9. COBERTURA.....	Erro! Indicador não definido.
10. ESQUADRIAS.....	15
11. REVESTIMENTOS	13
12. PISOS:	16

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

13.	IMPERMEABILIZAÇÃO	16
14.	PINTURA.....	16
15.	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIO SANITÁRIOS	18
16.	INCÊNDIO	19
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21
18.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22
19.	LIMPEZA DA OBRA	23


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

A - ORIENTAÇÕES GERAIS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de ampliação de um galpão.

Para efeito das presentes Especificações, o termo *Contratada* define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo *Fiscalização* define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município perante a *Contratada* e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo *Contratante* define a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a *Contratada* deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas, que o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala.

Lana Sabryna S. Aguiar
Assistente Técnico 6-4



DIRETORIA TÉCNICA

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.


3. Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá fiscalização junto à construtora com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o comprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários



DIRETORIA TÉCNICA

e/ou no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos preços unitários.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários.

Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a finalização da execução do serviço.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

A Contratada deverá, necessariamente, catar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em ofício ou no livro de ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

SERVIÇOS

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume:

A Contratada deverá instalar tapumes com 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de altura, estruturados em chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura em cal. A manutenção do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este deverá permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da obra.

Locação da obra:

Após o terreno devidamente limpo, deverá ser executado gabarito para

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

locação da obra. Este gabarito deverá ser executado ao redor da futura ampliação, perfeitamente nivelada e fixada.

Placa da obra:

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra ou voltada para via que forneça melhor visualização. É necessário que a placa seja mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade das cores durante o período de execução da obra.

A placa deve conter as principais características do contrato como nome da obra, órgão contratante e valor investido conforme modelo da Prefeitura Municipal de Itaituba. A placa devéra ser em chapa de aço galvanizado, com as dimenções de 2,00 x 1,50 m, tendo uma área de 3,00 m².

5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolições:

Todas as paredes existentes devem ser demolidas, o reaproveitamento das demolições das paredes, so sera aceito para o aterramento sob o piso existente. O não reaproveitamento das demolições das paredes, resulta-se na retirarada do canteiro de obra.

Retiradas:

O local da obra deverá ser limpo periodicamente evitando o acúmulo de entulho na obra. O material resultante de demolição, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada. E responsabilidade da contratada o descarte deste material.

6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação:

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4




DIRETORIA TÉCNICA

A escavação deverá ser feita de acordo com o necessário para a confecção de toda a fundação a ser executada na obra. Demais medidas podem variar, mas nunca ultrapassa os 2 metros de profundidade

7. FUNDAÇÃO

Bloco em concreto armado:

Os blocos serão executados em concreto armado realizando o encamisamento nos pilares existentes, assim como devem ser confeccionadas formas em madeira para os mesmos. Os blocos terão as dimensões de 80x80x50 cm e 80x120x50 cm, a locação de ambos os blocos estarão representadas em projeto.

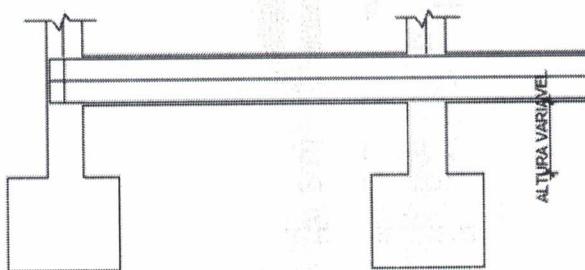

Baldrame em concreto armado:

Sera feita a viga – baldrame, blocos e fundação executada em concreto com Resistencia minima de $F_{ck}=20MPa$ com a utilização de forma em madeira de lei em



DIRETORIA TÉCNICA

utilização da escola será executado em concreto armado, sendo suas dimensões 13x25cm.

8. ESTRUTURA

Concreto armado:

Os elementos pilares, viga e cintamento superior deverão ser feitos com concreto armado deverá ter resistência mínima de $F_{ck}=20\text{MPA}$. Sempre obedecendo as normativas da ABNT.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria:


As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos furados (8 furos), os assentamentos dos tijolos na alvenaria devem ser feitos de maneira que a espessura máxima da parede chegue ao 15cm e a mínima aos 13cm sendo estas medidas da parede acabada.

Os vãos das portas e janelas, quando não coincidentes com as vigas deverão receber vergas e contravergas de concreto armado.

Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura




DIRETORIA TÉCNICA

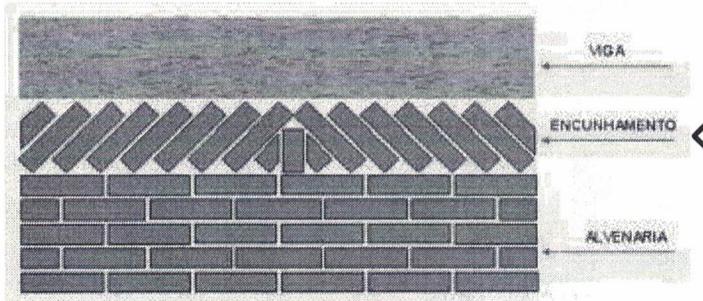

Quanto ao fechamento da alvenaria, os tijolos serão calçados nas vigas com tijolos colocados inclinados.

Elemento vazado:

Deverá ser utilizado elemento vazado cerâmico com as dimensões de 15x15x10 cm, para a ventilação. Na execução dos elementos vazados deve-se observar a inclinação de 2% para evitar o retorno das águas provenientes das

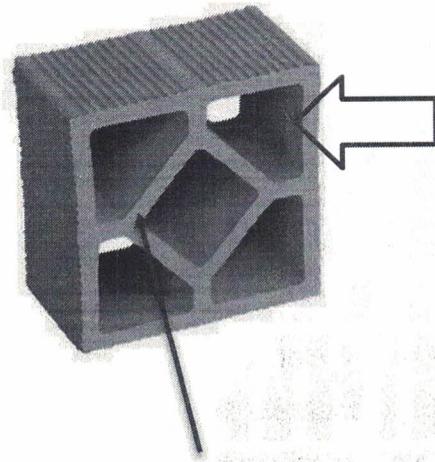

O elemento vazado deve ser igual ou similar. A troca deste item só deverá acontecer se comunicado previamente a fiscalização.

chuvas.



Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

10. REVESTIMENTOS

Revestimento de paredes:

Chapisco:

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação de norma brasileira. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de aproximadamente 5 mm. A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida.

Emboço:

Os emboços serão iniciados somente após completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos, depois de embutidas todas as canalizações.

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspido para facilitar a aderência do acabamento.

Será aplicado o emboço como base em todas as paredes que receberão revestimento em ladrilhos cerâmicos. Em superfícies internas, será executado com argamassa de cimento, cal e areia grossa no traço volumétrico de 1:3:9 e em superfícies externas, será utilizada a proporção de 1:2:6.

O emboço deverá estar limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento,



DIRETORIA TÉCNICA

devendo as impurezas visíveis serem removidas.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço externo não será iniciada, ou caso já o tenha sido, será ordenada a sua interrupção.

Sua espessura não deverá ultrapassar 20 mm, de modo que, com a aplicação de 5 mm do ladrilho cerâmico, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

Reboco:

O reboco consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas -materiais, preparo, aplicação e manutenção. - O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 15mm.

Revestimento cerâmico:

Os revestimentos cerâmicos de paredes serão de primeira linha, bem cozidos perfeitamente planos. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e, quando esmaltados, a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogêneas sendo de uma mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, empenamentos, eflorescência e escamas.

Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas. Os furos de tubulações ou caixas de eletricidade devem ser justos, inteiramente recobertos pelo acabamento de canoplas ou placas.

As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo às instruções de aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem ocas serão retiradas e assentes novamente.

A colocação das cerâmicas somente poderá ser iniciada após o término de toda instalação elétrica e hidros sanitária embutida.



DIRETORIA TÉCNICA

11. ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira:

Todas as portas e janelas devem estar em perfeitas condições, seguindo rigorosamente as especificações contidas no projeto arquitetônico e planilha orçamentaria, estando compostas por caixilho.

Ferragens:

O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixos ou encaixes para as dobradiças e fechaduras, terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas. Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras será preto.

As maçanetas das portas serão colocadas a 1,00 m do piso acabado. As dobradiças das portas deverão ser, no mínimo, em número de três para cada folha.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferenças de nível perceptível à vista.

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.

Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens não destinadas a pintura, devem ser adotados precauções.

Esquadrias metálicas:

Serão colocados portões de ferro 3/16" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva), nas áreas indicas conforme projeto.

Vidros:

Não serão aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricação como



DIRETORIA TÉCNICA

ondulações, bolhas ou gretas, ou que não estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidações.

12. PISOS:

Cimentado liso c/ junta plástica:

O piso (ver Projeto de Arquitetura) receberá acabamento rústico desempenado no próprio concreto, com espessura de 10 cm, com processo de concretagem, será em cimento queimado e lixado.

13. FORRO

O forro sera em PVC plástico do tipo lambri macho-fêmea, cor branco, largura de 10cm, pregado sobre estrado de madeira cedrinho com ripas 2,5x3,5 cm distantes no máximo 40cm, sendo fixado nas tesouras para evitar que o mesmo não sofra empenamento. Nos banheiros a onde ficará a caixa d'água teremos uma laje maciça de 10cm.

14. IMPERMEABILIZAÇÃO

Deverá haver impermeabilização sobre todas as vigas baldrame da obra, seguindo especificações de aplicação, utilizando de tinta asfáltica.

15. PINTURA

Disposições gerais:

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irão receber. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do fabricante da tinta.

Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em superfícies que não deverão receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e proteções adequadas.

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à Fiscalização uma amostra, com dimensões mínimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica do local a que se destina. Paredes internas e externas: látex acrílico, 3 demãos, sobre massa acrílica. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

Superfícies rebocadas:

As superfícies rebocadas receberão tinta acrílica e deverão anteriormente, ser lixadas, eliminando-se completamente grãos soltos, falhas e imperfeições. Deverá ser aplicada selador acrílico onde for indicado. A pintura será executada com três demãos de tinta acrílica sobre a superfície preparada e convenientemente limpa. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha.


Superfícies de Madeira:

A superfície deverá ser lixada e limpa. Aplicar uma demão de selador para madeira e lixar novamente depois de seco. Aplicar três demãos de tinta esmalte sintético. Serão pintadas todas as estruturas para utilização em cobertura, inclusive mãos francesas. Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

Superfícies Metálicas:

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de aplicação de acordo com as recomendações do fabricante da tinta, através da sua supervisão técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalização.

Aplicar três demãos de tinta esmalte sintético.


Lana Sabryna S. Aguilar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização.

16. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIO SANITÁRIOS

Disposições Gerais

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que eventuais modificações deverão ser realizadas somente após aprovação dos autores do projeto e da Fiscalização, devendo ser anotado em diário de obra.

Louças e Metais

Características Técnicas

Bacia Sanitária Convencional:

Modelo: Bacia com caixa acoplada botão com duplo acionamento, com sistema VDR (Volume de descarga reduzido).

Material: Cerâmica esmaltada Cor: Branco Gelo.

Aplicação: Sanitários masculino e feminino.

Observação: Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto e assento. Prever rejantes/calafetação.

Barras de Apoio:

Material: aço inox.

Características: Devem suportar esforço de 1,5 KN em qualquer direção, ter diâmetro entre 3,0 e 4,5 cm, estar firmemente fixada à parede e distanciada, no mínimo, 4 cm da desta.

Comprimento: 80 cm Acabamento: inox.

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários.

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



DIRETORIA TÉCNICA

Aplicação: fornecer e instalar no sanitário acessível junto a pia, e vaso sanitário e na porta de acesso, conforme indicado em projeto e NBR 9050/2004.

Torneiras de uso geral:

Material: Metal

Tipo: Torneira para jardim /lavatório e pia $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ".

Acabamento: Cromado

Aplicação: torneiras de jardim, lavatório e pias.

lavatório com coluna

Modelo: lavatório com coluna, 45 x 55cm.

Material: Cerâmica esmaltada Cor: Branco Gelo.

Aplicação: banheiro

Observação: prever todos acessórios de fixação necessaries para o uso e bom desempenho do mesmo.

Bancada de mármore sintético:

modelo: bancada sintética de 120x60 cm com cuba incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede.

Material: Marmore, sintetico.

Aplicação: Sanitários masculino e feminino.

Observação: Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto e assento. Prever rejantes/calafetação.

17. INCÊNDIO

Iluminação de emergência:

No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas ou em PVC rígido antichama, conforme NBR 6150.

Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curva ou escada, os pontos de iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção de saída



DIRETORIA TÉCNICA

de cada ponto, seja possível visualizar o ponto seguinte, a uma distância máxima de 15M.

A distância máxima entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso.

A fixação dos pontos de luz e da sinalização deve ser rígida, de forma a impedir queda acidental, remoção desautorizada e que não possa ser facilmente avariada ou colocada fora de serviço.

Recomenda-se, após a conclusão da instalação do sistema, que os resultados sejam aferidos pelo profissional responsável pelo projeto e pelo contratante ou possuidor a qualquer título do estabelecimento.

Os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência devem ser devidamente certificados por órgão competente.

Sinalização de emergência:

As sinalizações de proibição e de alerta devem ser instaladas em local visível e a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização.

A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização.

A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado.

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.

A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins.

A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualização.

As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e



DIRETORIA TÉCNICA

salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.

As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente.

Serão usados pictogramas com as dimensões de 0,4m comprimento e largura de 0,28m

Extintor de incêndio:

A área medida em metros quadrados de piso será protegida por unidade extintora em função do risco:

A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 metros.

A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que esteja destinada a indicar a presença de extintor e/ou saída.

Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo: A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, fora de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a massa total do extintor.

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que eventuais modificações deverão ser realizadas somente



DIRETORIA TÉCNICA

após aprovação dos autores do projeto e da Fiscalização, devendo ser anotado em diário de obra. Sera fixado um centro de distribuição com barramento Como mostra em projeto.

Toda a fiação elétrica, os disjuntores, tomadas, interruptores, soquetes e lâmpadas deverão obdecer o projeto eletrico. O posicionamento de tomadas e dimensão dos tubos, deverá seguir rigorosamente os detalhes apresentados no projeto elétrico.

Em caso de utilização de tubulação aparente, está deve ser envolvida por materiais isolantes, de forma a evitar descargas elétricas nos usuários.

A fiação telefônica e de logica – UTP, deverá ser organizada em tubos condutores de zinco, de forma a evitar que esta fique exposta pelos cômodos.

19. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Esgoto:

Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga e de esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados até o local de tratamento composto de uma Fossa Séptica.

Os ramais de esgoto, de descarga dos WC's e ambientes com pontos de esgoto serão encaminhados diretamente para as caixas de inspeção de esgoto (CI.EG).

Os ramais de esgoto da cozinha, cantina e refeitório serão encaminhados para caixa de gordura (CX.G) e posteriormente à caixas de inspeção de esgoto.

Caixa de gordura:

Deverão ser com tampa de concreto armado. Suas dimensões devem ser de 60x60x60 executada em alvenaria de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensões internas de acordo o projeto.

Fossa séptica:

A fossa séptica deverá ser executada em tijolo cerâmico maciço, as paredes


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 161004296-4



DIRETORIA TÉCNICA

internas da fossa devem ser impermeabilizadas (rebocadas). As dimensões da fossa estarão representadas em projeto.

Caixas de inspeção:

Deverão ser com tampa de concreto armado. Suas dimenções devem ser de 60x60x60 executada em alvenaria.

Reservatório:

O reservatório de consumo possui capacidade de 1.000 litros para atender a demanda calculada, e o mesmo deverá ser de fibra de vidro instalado sobre uma torre em concreto armado para caixa d'água.

20. DIVERSOS:

Exaustor eólico:

Deverá ser instalado exaustores eólicos 24" na parte mais alta do ambiente, próximo à o afastamento das estruturas do telhado (terças ou longarinas). É necessário evitar o embarrigamento (flexão) das telhas, local onde se concentra grande massa de ar quente.

21. LIMPEZA DA OBRA

Pisos

Dependendo do caso, a limpeza será executada com uso de água e sabão; podendo em casos mais difíceis ser empregado ácido muriático diluído em água na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de ácido deverá ser abundantemente lavado com água, imediatamente após sua aplicação.

Metais de Aparelhos Sanitários e Esquadrias

Deverão ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que não houver presença de tintas ou vernizes, serão simplesmente esfregados com

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



DIRETORIA TÉCNICA

flanelas até recuperação integral do brilho natural.

Aparelhos Sanitários

Antes do início da limpeza, deverá ser retirado todo e qualquer excesso de massa utilizada na colocação dos aparelhos e metais. A lavagem será feita com apenas água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções ácidas.

Precauções que possibilitem uma perfeita vedação dos esgotos e ralos deverão ser adotadas a fim de evitar precipitações de detritos, responsáveis pelos entupimentos.

Vidros

Deverão ser empregados lã de aço ou removedores adequados. Cuidados especiais serão tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

Entulhos

Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da fiscalização, e leis de postura do Município.

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4


LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – TP

ARQUITETÔNICO

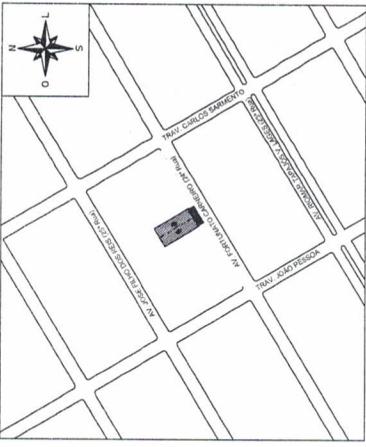


PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:7000


(13)

QUADRO DE ACABAMENTOS	
PISO	
01	CIMENTO USO COM JUNTA PLÁSTICA
PAREDE	
01	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA SEM MASSA COM SELADOR
TETO	
01	FORRO EM LAMINADO PVC
RODAPE	
02	SUPERFÍCIE
01	NÃO TEM
LEGENDA	
	CONSTRUIR
	DODOR
	COSTUME

(13)

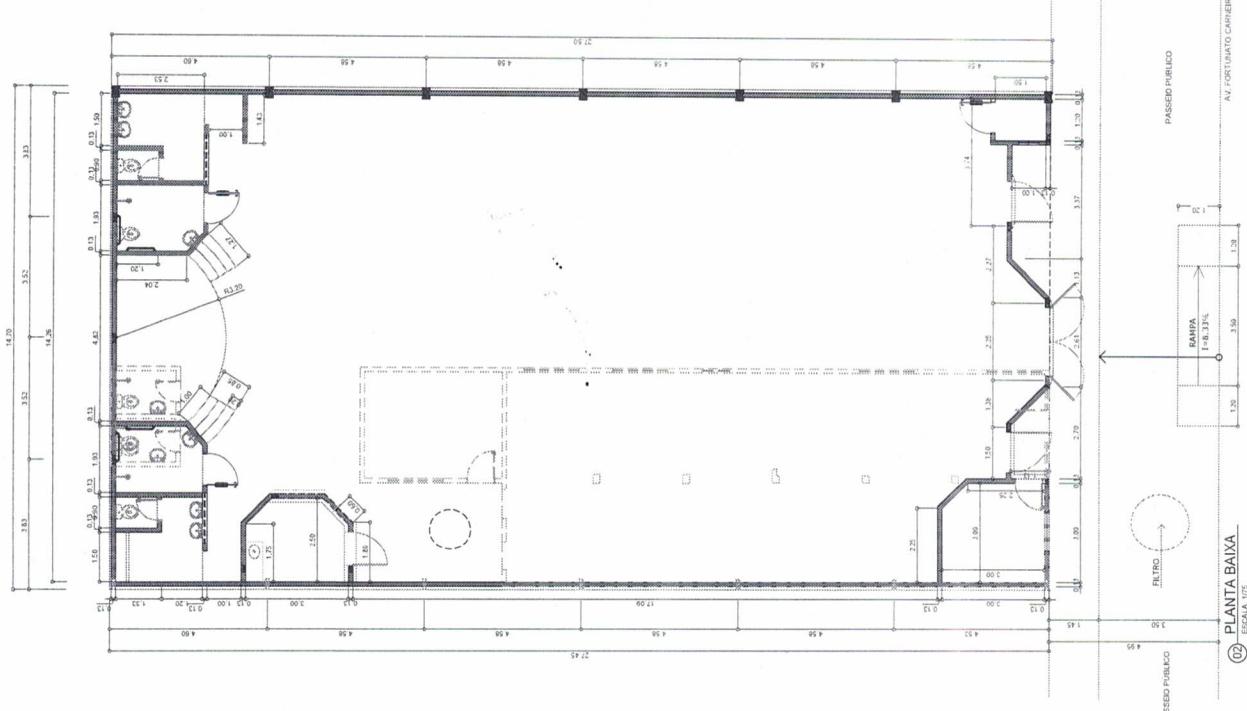

(13)

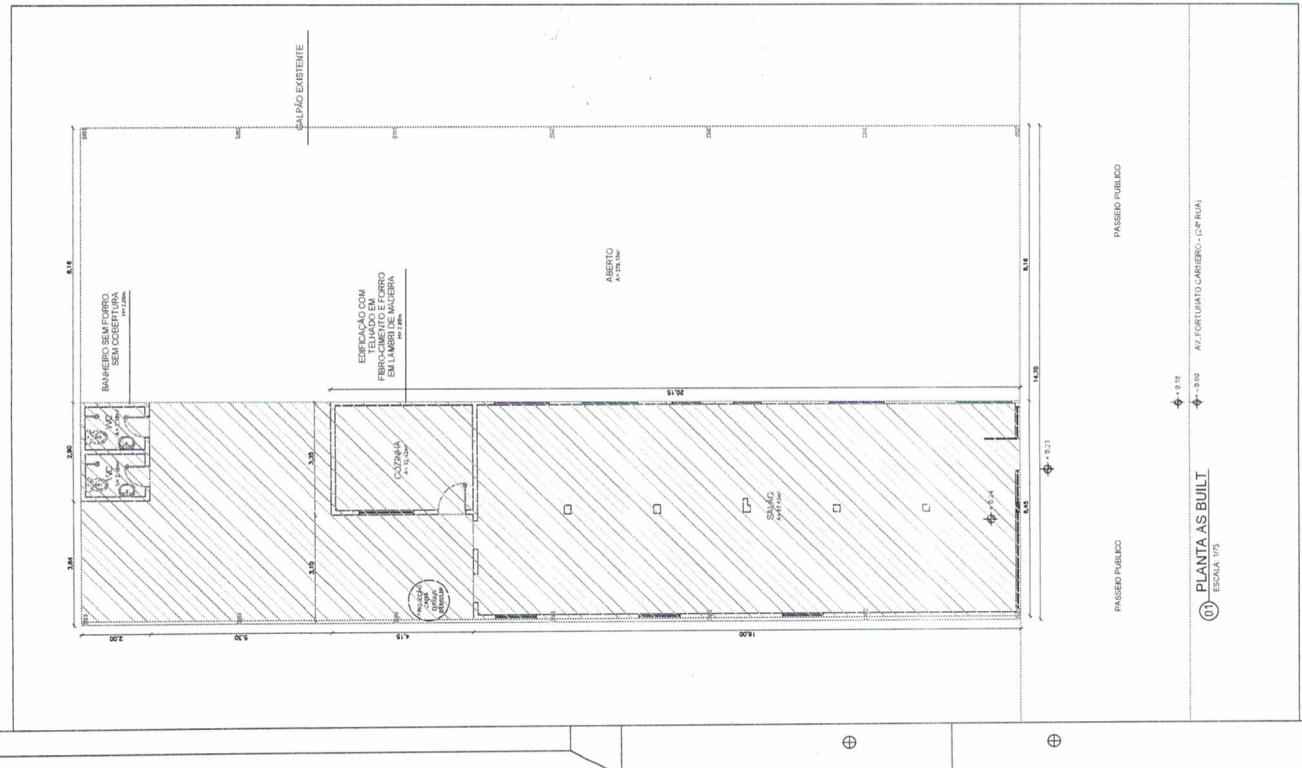

(13)

	Presidente da Associação
REFUGIO TERRACOTTA CO. BRAS.	Projeto de refúgio para os animais de estimação que vivem na estrada, que é uma das principais rotas de migração de animais.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Secretaria Municipal de Saúde de Araruá.
ZENIDE CORDEIRO DE ARAUJO	Zenide Cordeiro de Araújo é a presidente da associação.

(13)

PROJETO PARA REFORMA DE IMÓVEL GORETO DA FAZENDA
ASSOCIAÇÃO DOS FÔNS DE FAZENDA


LANA SABRINA SIMÕES AGUAR

PLANTA ASSUL T - PLANTA
DE REFORMA E SITUAÇÃO

WILSES MOREIRA CONDE

Foto: WhatsApp / WhatsApp / WhatsApp / WhatsApp


(13)

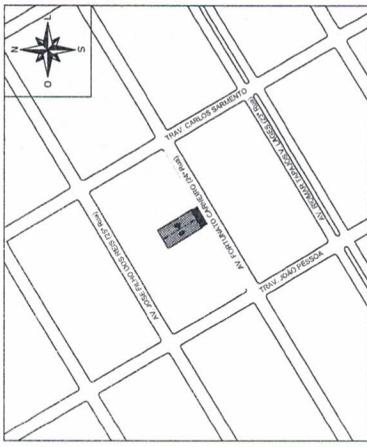

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1:2000
05


QUADRO DE ACABAMENTOS		
PISO:	01 CIMENTO USO JUNTA PLÁSTICA	
PAREDE:	01 PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, SEM MASSA, COM SELADOR	
TETO:	01 FORRO EM LAMINADO PVC	
	02 SEM FORRO	
RODAPE:		
01 NÃO TEM		
LEGENDA		
	A CONSTRUIR	DESTRUIR
	A DEMOLIR	

ZENEIDE CORDEIRO DA ASSOCIAÇÃO Presidente da Associação	REF.: 01 - PROJETO DE IMPLANTACAO DO BEACH Projeto de Implantacao do Beach Secretaria de Cultura e Esportes Data: 01/04/2016
LANA SABRYNA SIMÕES AGUAR Enfermeira Cef CRM-PB 15164296-4	01 - MAFRA Início: 01-04-2016 Fim: 01-05-2016 Assinatura: _____
PLANTA BAIXA - PROPOSTA. UILSES MOREIRA CONDE	02 - PLANTA BAIXA - PROPOSTA. Assinatura: _____
	03 - PLANTA BAIXA - PROPOSTA. Assinatura: _____

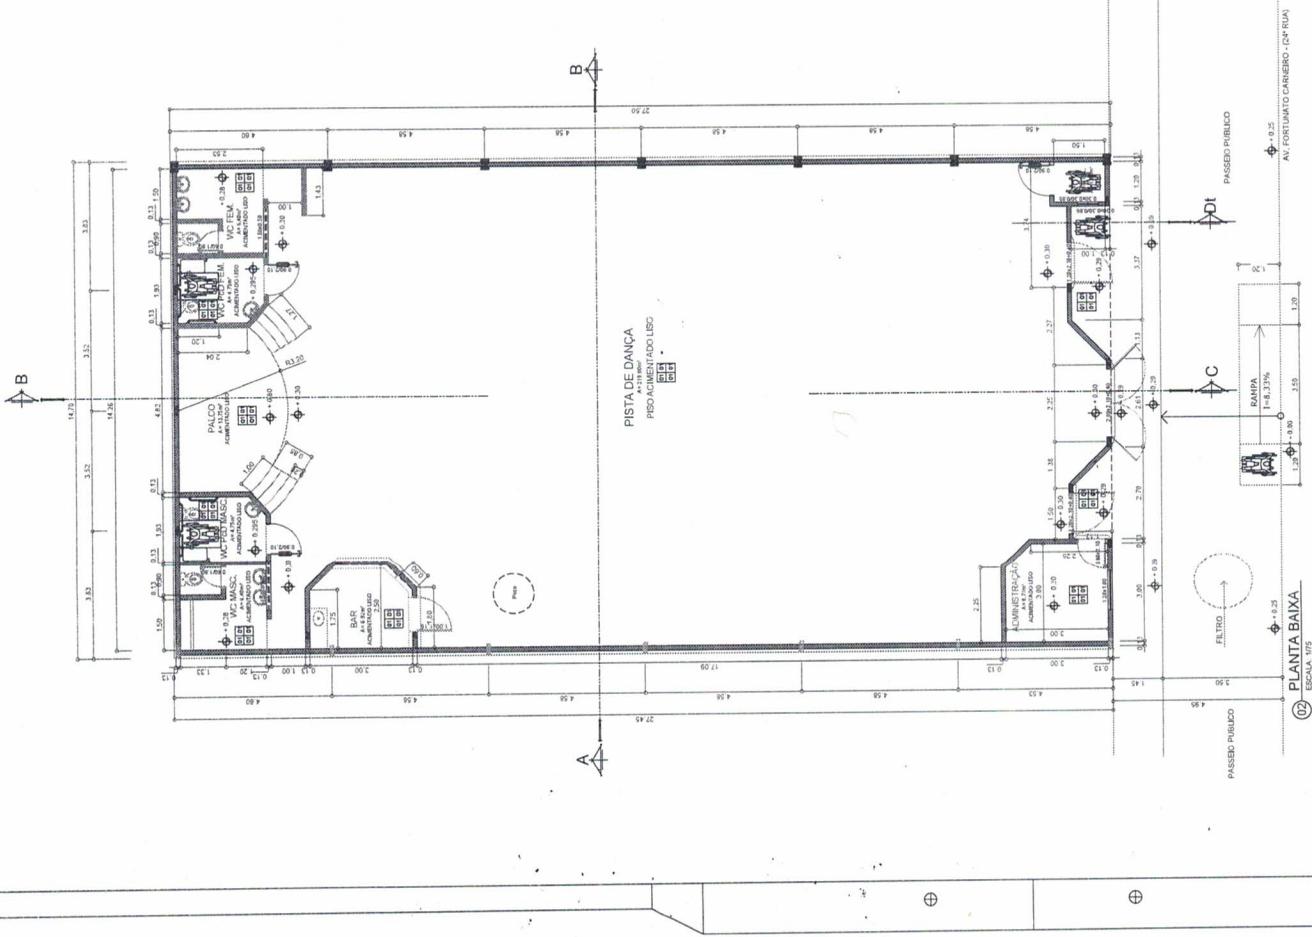





06 PLANTA DE SITUAÇÃO

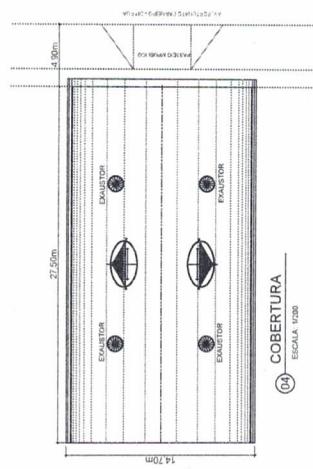


COBERTURA
04 Escala: 1:2000

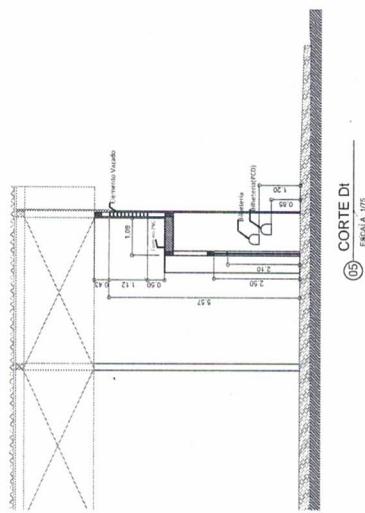


CORTE Dt
05 ESCALA: 1/75

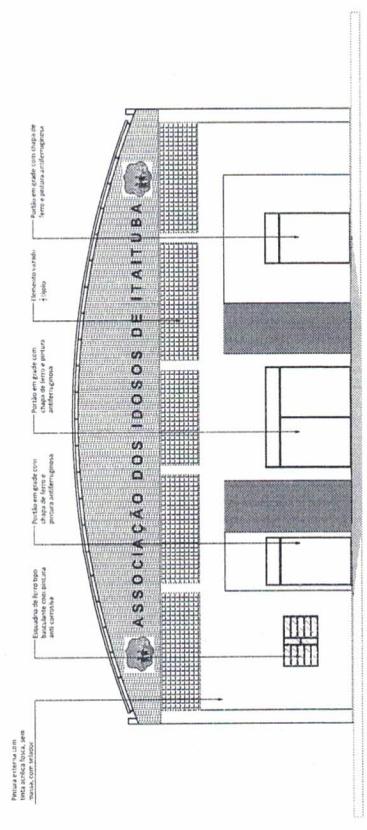

VISTA PRINCIPAL

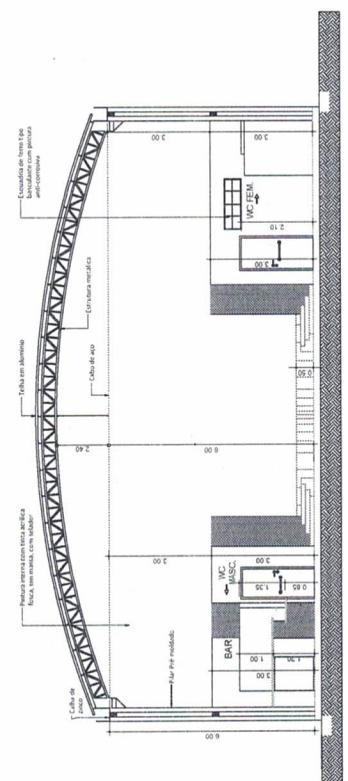

CORTE AB
02 ESCALA 1/75

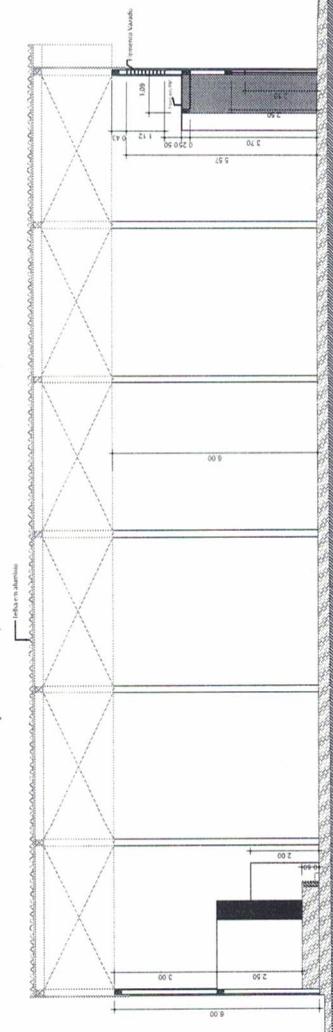

CORTE BC

QUADRO DE ACABAMENTOS	
<input checked="" type="checkbox"/> PISOS	
<input checked="" type="checkbox"/> 01 CIMENTO UST COM JUNTA PLÁSTICA	
<input checked="" type="checkbox"/> PAREDE	
<input checked="" type="checkbox"/> 01 PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA SEM MASSA COM SELADOR	
LEGENDA	
<input checked="" type="checkbox"/> TE TO	
<input checked="" type="checkbox"/> 01 FORRO EM LAMINADO DE PVC	
<input checked="" type="checkbox"/> 02 SEM FORRO	
<input checked="" type="checkbox"/> RODAPÉ	
<input checked="" type="checkbox"/> 01 NÃO TEM	
<input checked="" type="checkbox"/> A CONSTRUIR	<input type="checkbox"/> A DEMOLIR
<input type="checkbox"/> EXISTENTE	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTENTE
<p>ZENEIDE CORDEIRO DE ARAÚJO Presidente da Associação</p> <p>PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA LAZ GALPÃO COOPERATIVA SEDÉ DA ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ITATUBA</p> <p>LAMA SABRINA & KAREN ADRIEL LAMA SABRINA & KAREN ADRIEL LAMA SABRINA & KAREN ADRIEL LAMA SABRINA & KAREN ADRIEL</p>	
<p>CORTES, VISTA PRINCIPAL, COBERTURA E SITUAÇÃO</p>	

Lince Sabryne Simões Aguiar
Engenheira Civil
CREA-PA 151662296-4




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº

005/2018 – TP

ELÉTRICO

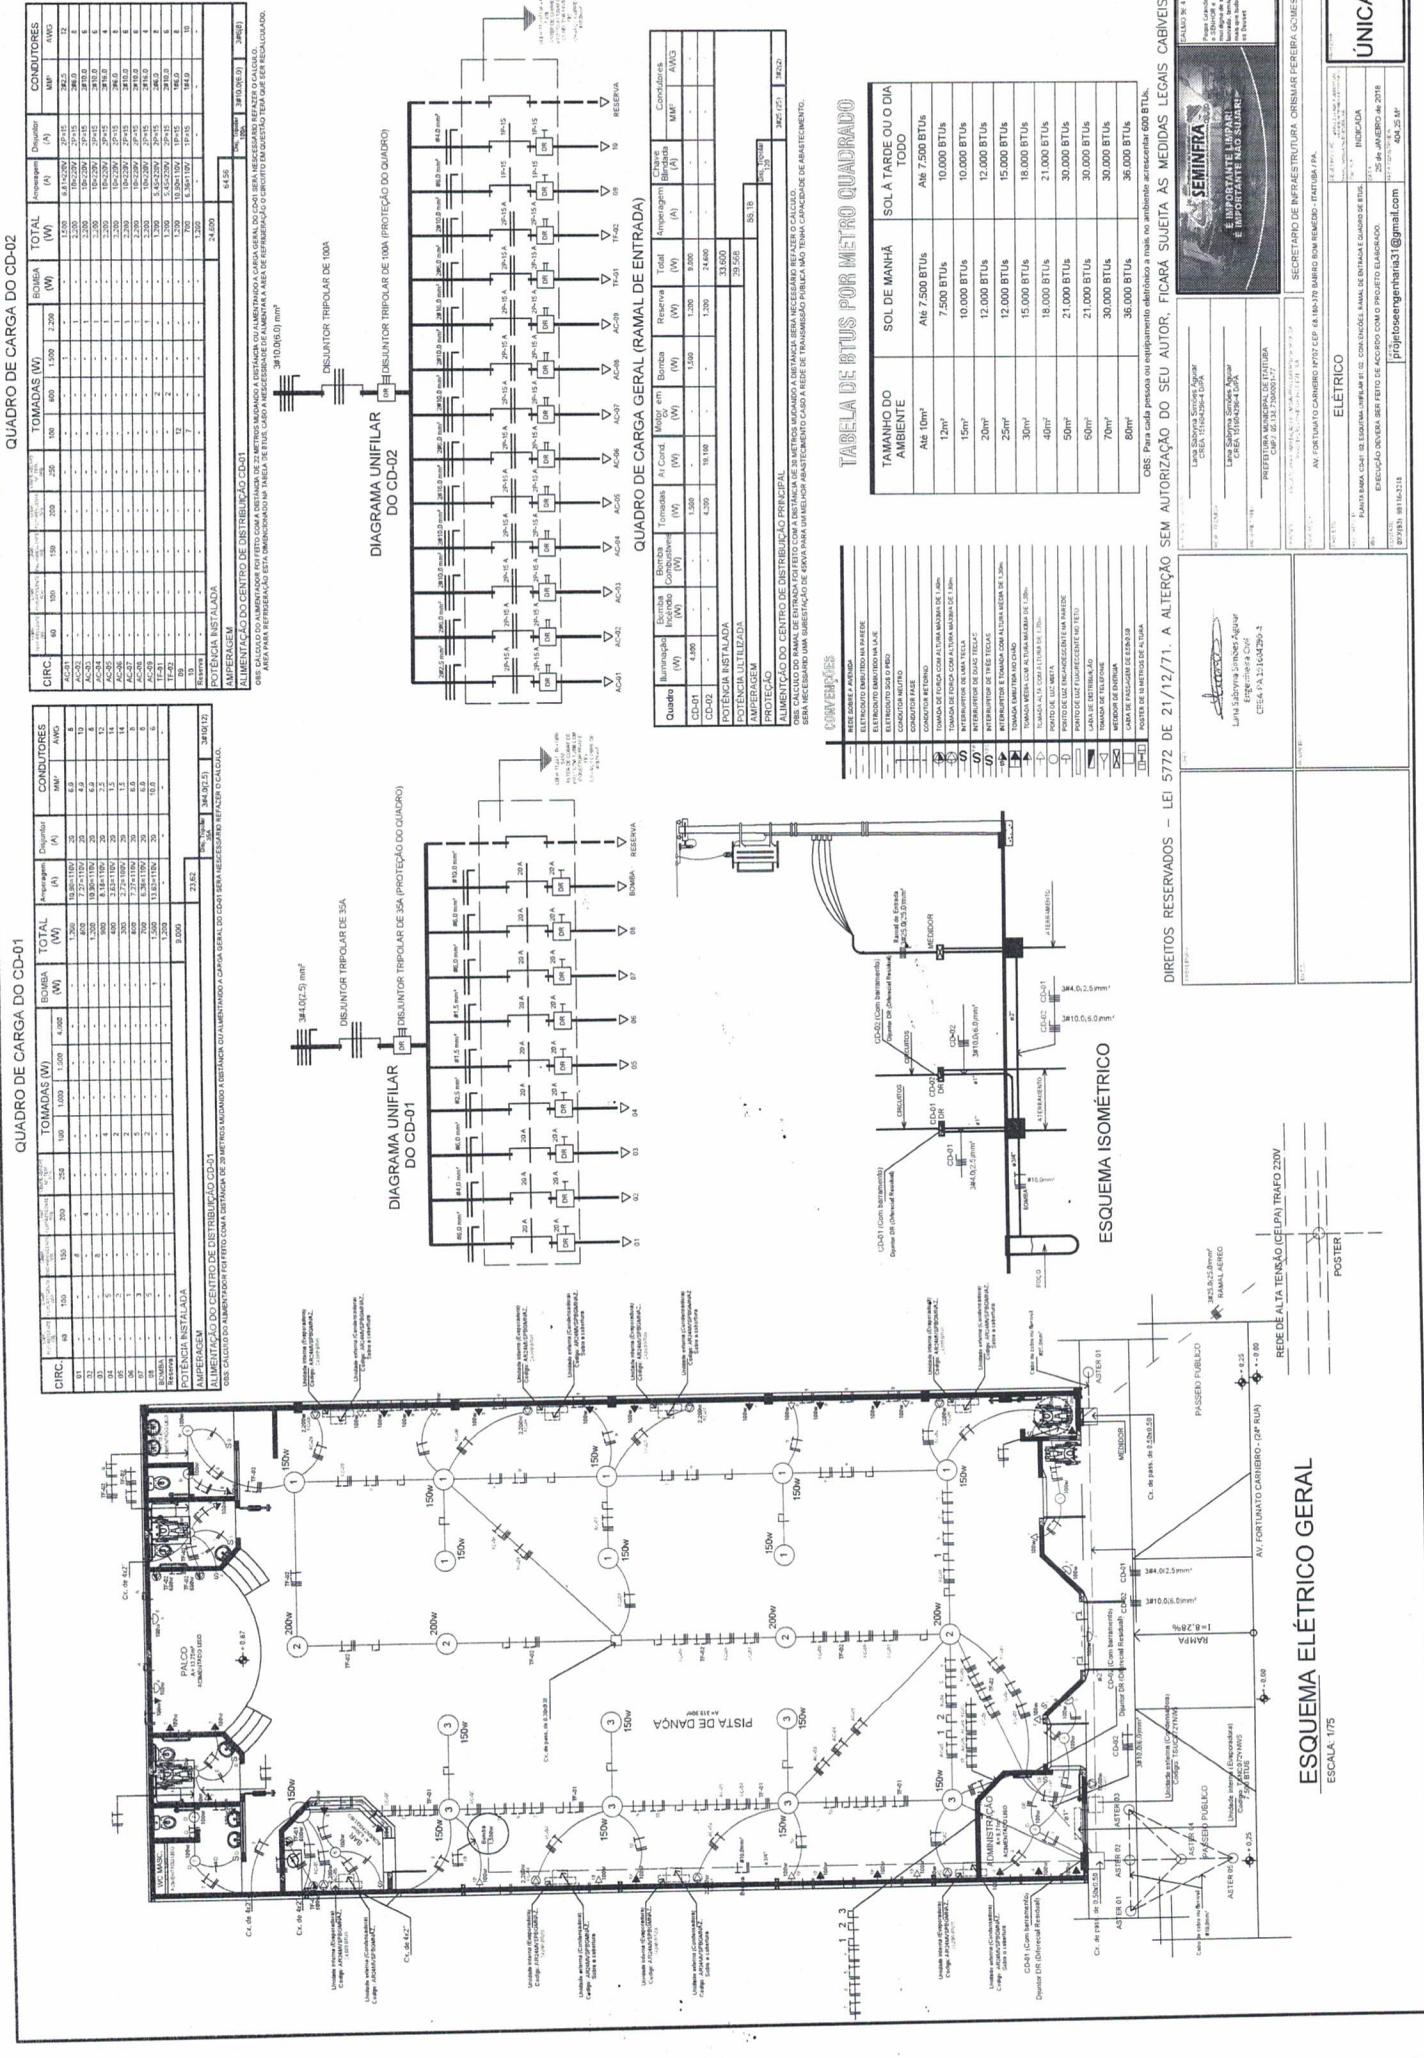





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – TP

ESTRUTURAL

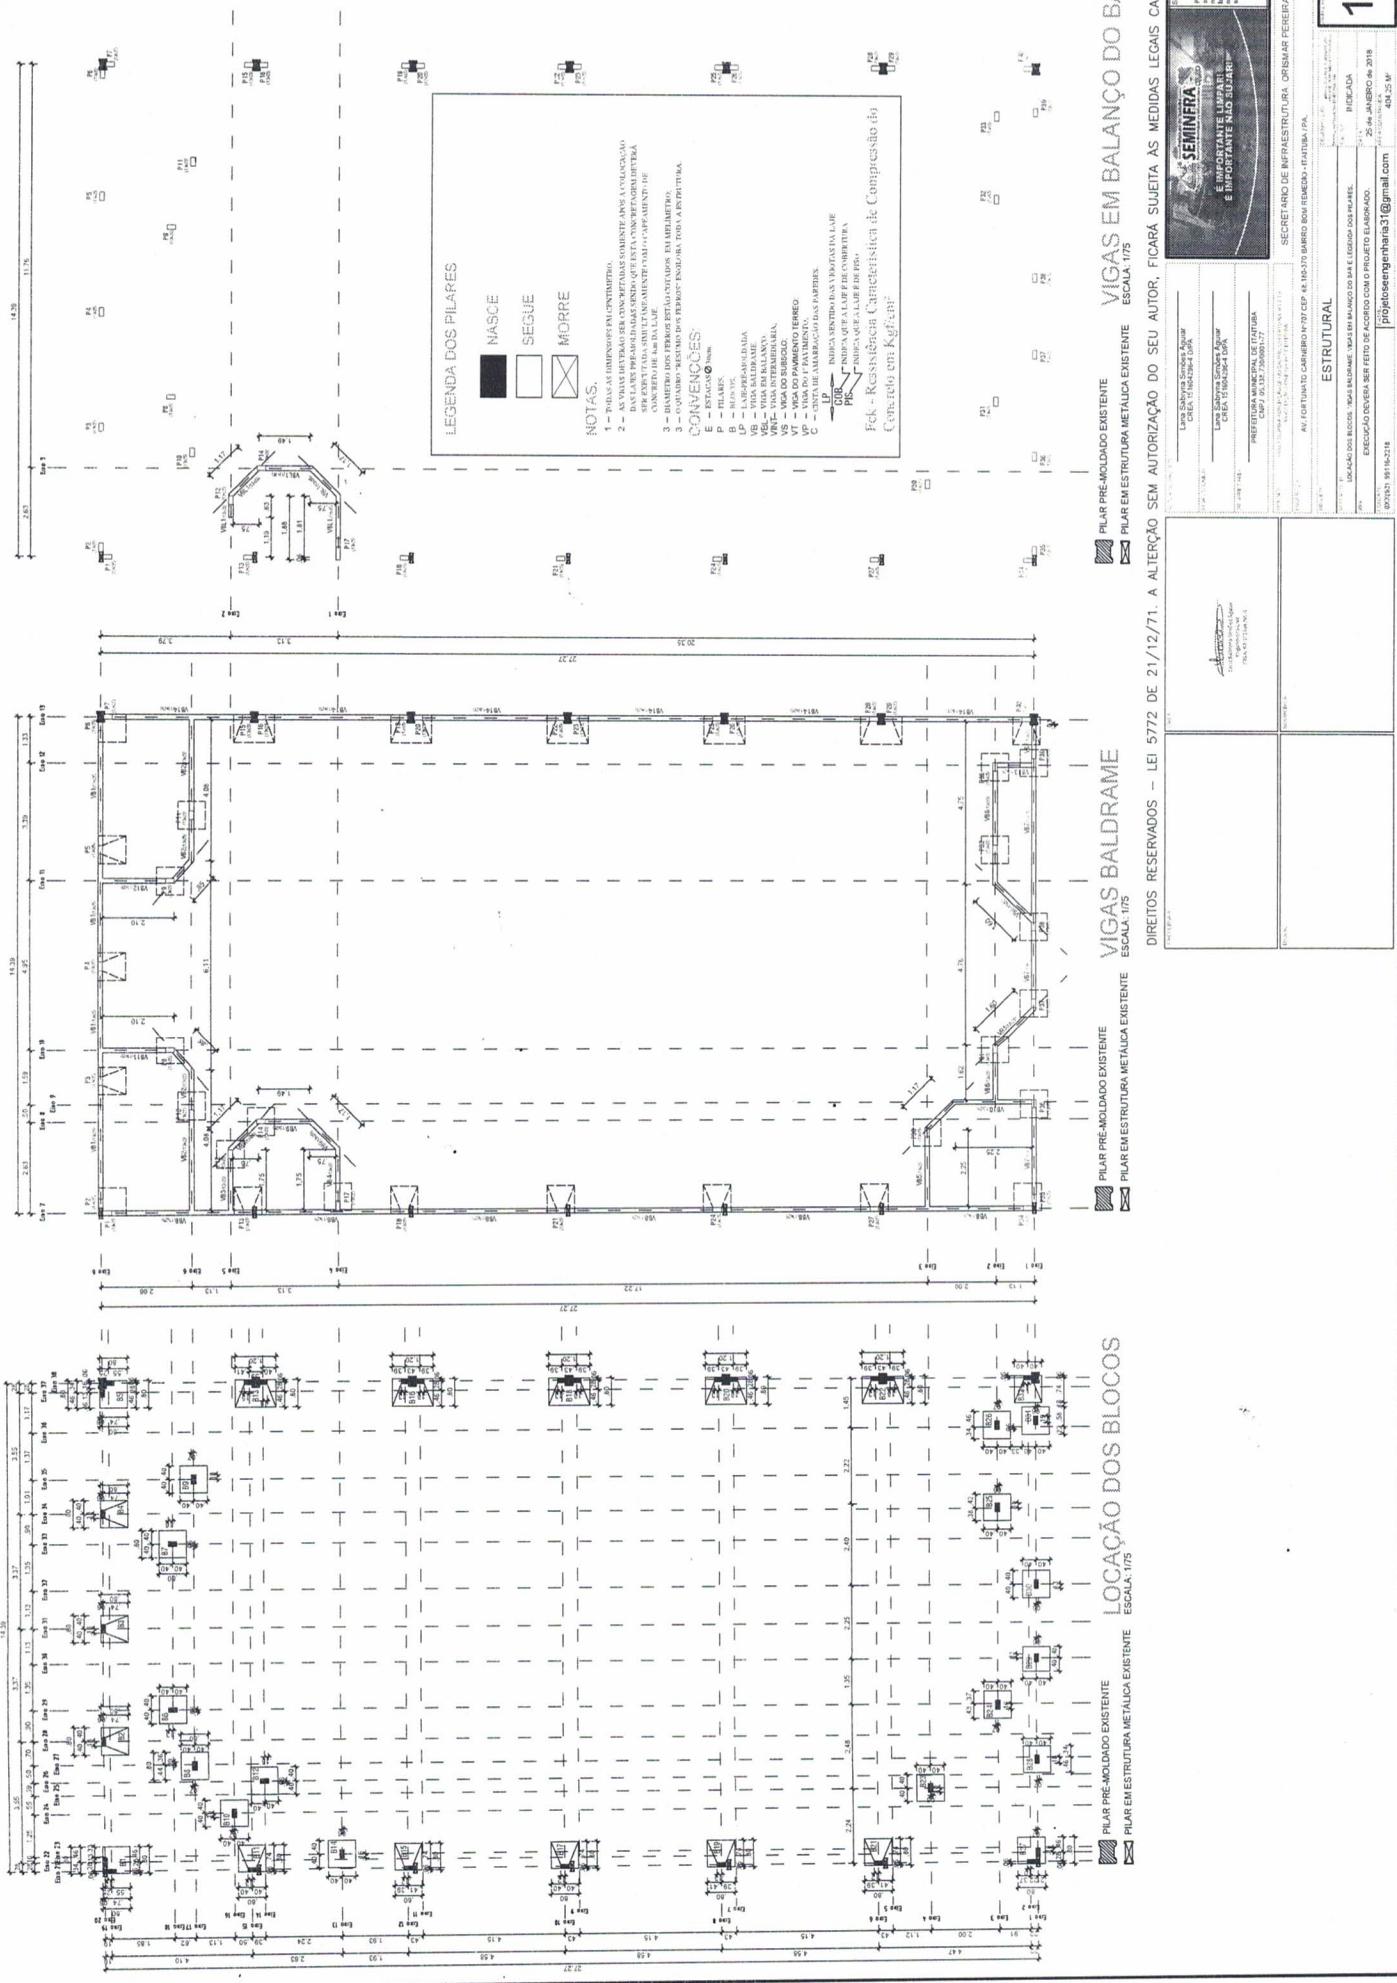

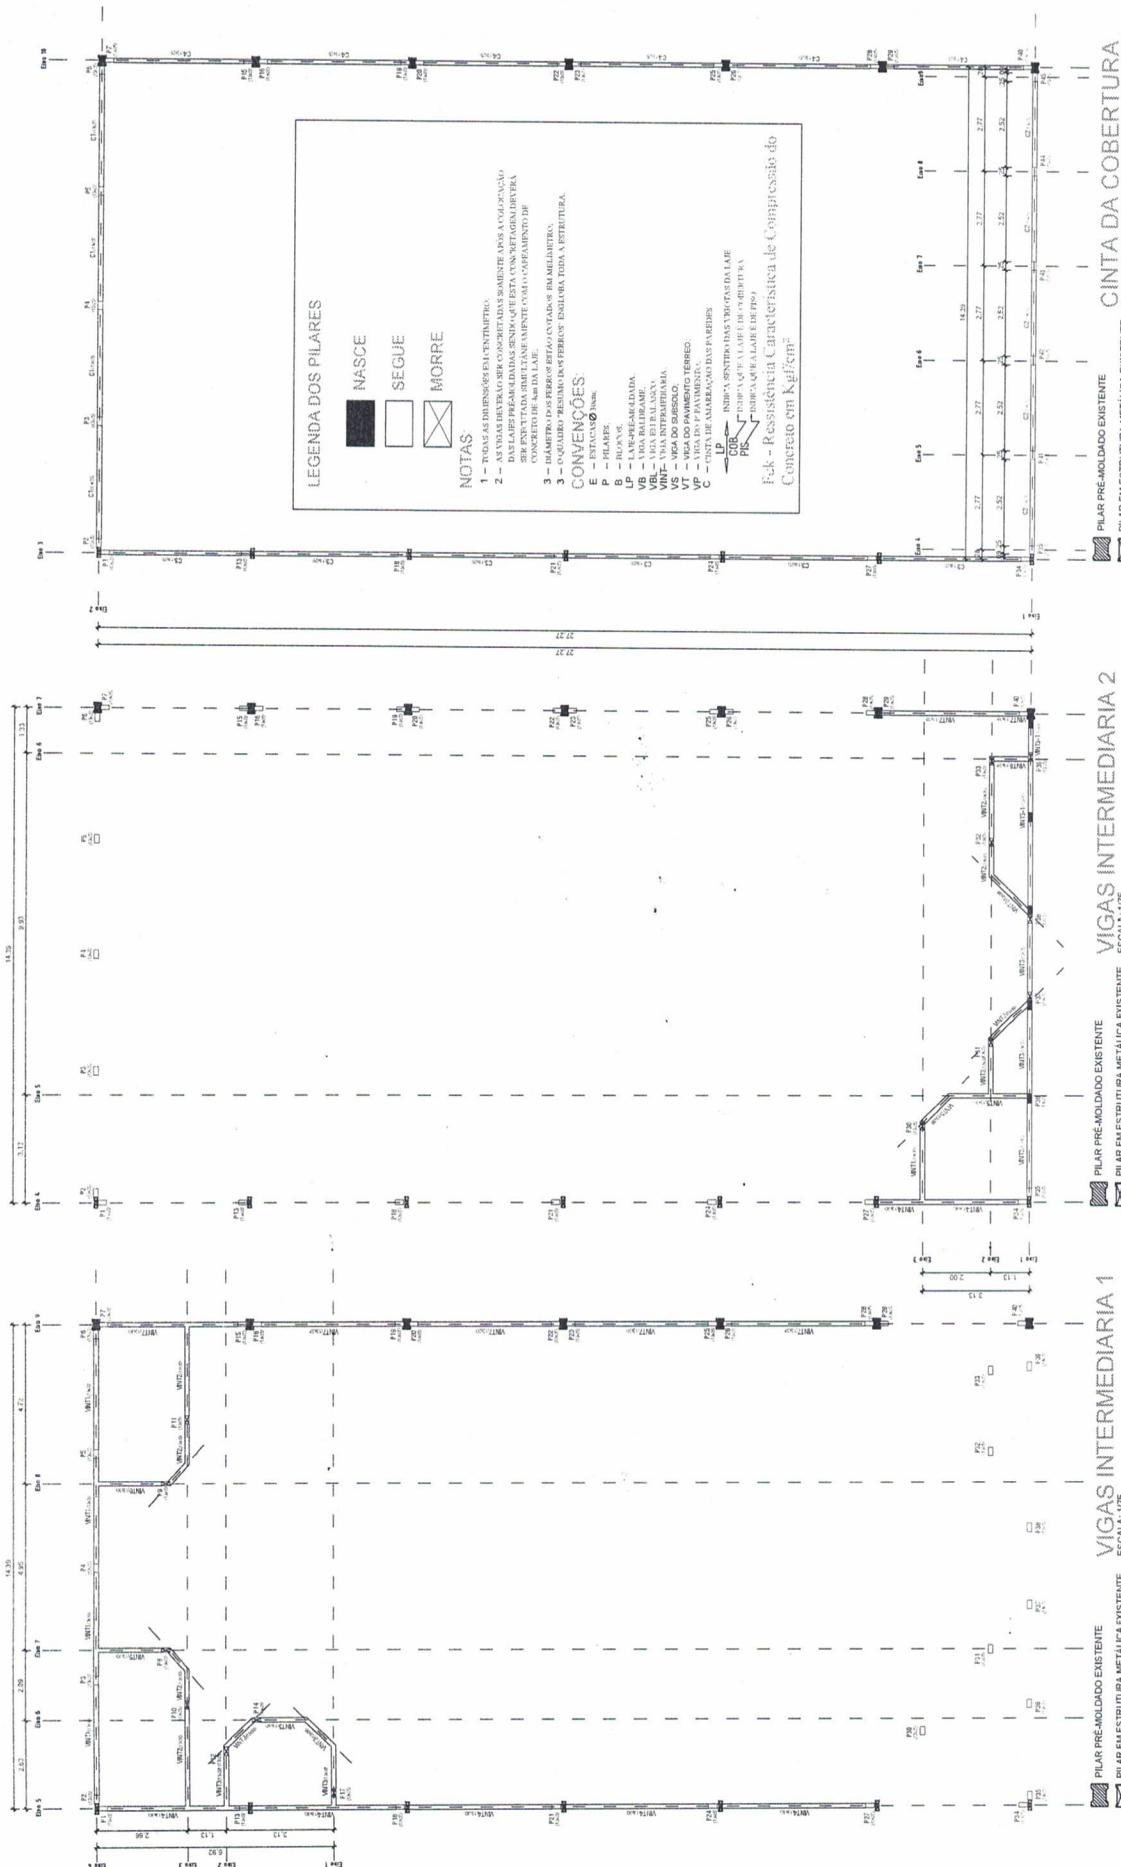


TERCÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR FICARÁ SUJEITO ÀS MEDIDAS LEGAIS CADAVICIS



 2/5
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CRISTIANO PEREIRA GOMES DO MUNICÍPIO DE BONÉMEDE - ITAITUBA PA.
INDICADA 25 de JANEIRO de 2018 itaitubainha31@gmail.com

MALHA DE VISUALIZAÇÃO DO TERRENO

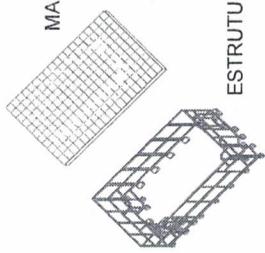

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

CINTA DA COBERTURA

VIGAS INTERMEDIARIAS 1

CO	Nº	DHAM	QUANT	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
A450	1	10.0	20	1200	24.0000
	2	10.0	20	1200	24.0000
A460	3	8.0	64	215	13.766
	4	4.2	540	80	43.200

DETALHE DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA 2
SEM ESCALA
VIGAS: VINT1 / VINT2 / VINT4 / VINT5 / VINT7

DETALHE DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA 1
SEM ESCALA
VIGAS: VINT1 / VINT2 / VINT3 / VINT4 / VINT5 / VINT6 / VINT7

The figure shows a cross-section of a bridge deck with a total width of 10 m. The deck consists of two 20 m long segments. Each segment has a thickness of 30 cm and a height of 1.5 m. The top flange has a width of 1.5 m and a thickness of 10 cm. The bottom flange has a width of 2.5 m and a thickness of 10 cm. The central part of each segment has a width of 6 m and a thickness of 30 cm. Reinforcement bars are shown at the top and bottom flanges. At the ends of the segments, there are triangular supports with a height of 1.5 m and a base width of 1.5 m. The overall length of the bridge is 40 m.

DETALHE DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA 2
SEM ESCALA
VIGAS: UNIT1 / UNIT2 / UNIT3 / UNIT4 / UNIT5 / UNIT6

AÇO	Nº	DIA (cm)	QUANT	UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
A50	1	10	20	1200	24.000
A50	2	10	20	1200	24.000
A50	3	8.0	64	215	13.160
A60	4	4.2	50	80	43.200

RESUMO DO AÇO

AÇO	Nº	DIA (cm)	C. TOTAL (cm)	PESO+10% (kg)	QUANT
A50	10	460	297.6	40x1	
A50	8.0	117.6	12x4		
A60	4.2	43.2	51.54	26x1	
A50	4.0	40	35.192	32x1	A50
A50	3.0	30	31.54	10x1	A50
A50	2.0	20	24.000	120x1	A50
A50	1.0	10	24.000	120x1	A50
A60	4.0	40	43.200	10x1	A60

RESUMO DO AÇO

AÇO	Nº	DIA (cm)	C. TOTAL (cm)	PESO+10% (kg)	QUANT
C50	1	8.0	76	1200	31.680
C60	3	4.2	569	70	26.200

RESUMO DO AÇO

AÇO	Nº	DIA (cm)	C. TOTAL (cm)	PESO+10% (kg)	QUANT
C50	8.0	336	141.12	28x1	
C60	4.2	362	47.04	33x1	
C50	4.0	32	47.04	14x1	
C50	3.0	24	47.04	12x1	
C50	2.0	16	47.04	10x1	
C50	1.0	8	47.04	8x1	

RESUMO DO AÇO

AÇO	Nº	DIA (cm)	C. TOTAL (cm)	PESO+10% (kg)	QUANT
C50	1	8.0	76	1200	31.680
C60	3	4.2	569	70	26.200

RESUMO DO AÇO

AÇO	Nº	DIA (cm)	C. TOTAL (cm)	PESO+10% (kg)	QUANT
C50	8.0	336	141.12	28x1	
C60	4.2	362	47.04	33x1	
C50	4.0	32	47.04	14x1	
C50	3.0	24	47.04	12x1	
C50	2.0	16	47.04	10x1	
C50	1.0	8	47.04	8x1	

VIGAS INTERMEDIÁRIAS 2

A technical schematic diagram of a structural framework, likely a truss or lattice girder system, shown in perspective on a grid background. The structure consists of various beams and supports, with arrows indicating force vectors at several points. The drawing is oriented diagonally across the page.

An architectural or engineering drawing showing a structural framework, likely a roof or floor joist system. The framework consists of a grid of beams supported by columns. Diagonal members, possibly cables or rods, are used for lateral stability. The drawing is done in black ink on white paper, with some parts shaded to indicate depth or material type. A vertical column of text is visible on the right side of the page.

4/5
PROJETO DE INFRAESTRUTURA CIVIL PARA A CICLOVIA CICLOVIÁ CARMO XIX/CÉSAR LOPES BARROSO HENRIQUE - HABITAT/PA
ESTRUTURAL
<p>RESUMO: O presente projeto visa a elaboração de um projeto estrutural para a implantação de uma ciclovia no trecho da Ciclovia César Lopes Barroso Henriques, entre o bairro do Carmo e o bairro do Jardim das Flores, na cidade de Belém-PA.</p> <p>OBJETIVO: O objetivo principal é fornecer uma estrutura segura e duradoura para a ciclovia, garantindo a integridade estrutural e a capacidade de suportar o tráfego de ciclistas e pedestres.</p> <p>DESCRIÇÃO DO PROJETO: O projeto consiste na elaboração de um projeto estrutural para a ciclovia, que deve ser feito de acordo com as normas e especificações técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CFA).</p> <p>PERÍODO DE EXECUÇÃO: O projeto deve ser executado em um prazo de 60 dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.</p> <p>PROJETISTA: O projeto deve ser elaborado por um engenheiro civil habilitado, com experiência na área de estruturas e cicloviárias.</p> <p>CONTRATANTE: O projeto deve ser executado por uma empresa licenciada e habilitada para a execução de projetos estruturais.</p> <p>VALOR DA EXECUÇÃO: O valor da execução do projeto deve ser estabelecido através de uma negociação entre o contratante e o projetista.</p> <p>ENTREGA: O projeto deve ser entregue em formato digital e impresso, conforme as normas e especificações técnicas estabelecidas pelo CFA.</p> <p>AVISO: O projeto deve ser executado de acordo com as normas e especificações técnicas estabelecidas pelo CFA.</p>


DETALHE DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA 2 SEM ESCALA VIGAS: V11T3-1		DETALHE DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA 2 SEM ESCALA VIGAS: V11T3-1																																																																																																	
PE DIREITO: 2,50m	PE DIREITO: 2,50m	PE DIREITO: 2,50m	PE DIREITO: 2,50m																																																																																																
RELAÇÃO DO AÇO	RELAÇÃO DO AÇO	RELAÇÃO DO AÇO	RELAÇÃO DO AÇO																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>Nº</th><th>DIAM.</th><th>QUANT</th><th>UNIT</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>1</td><td>10,0</td><td>42</td><td>cm</td><td>420</td><td>448,0</td><td>11.780</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>2</td><td>4,2</td><td>116</td><td>m</td><td>70</td><td>6.120</td><td></td></tr> </tbody> </table>	AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780	C460	2	4,2	116	m	70	6.120		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>Nº</th><th>DIAM.</th><th>QUANT</th><th>UNIT</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>1</td><td>10,0</td><td>42</td><td>cm</td><td>420</td><td>448,0</td><td>11.780</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>2</td><td>4,2</td><td>116</td><td>m</td><td>70</td><td>6.120</td><td></td></tr> </tbody> </table>	AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780	C460	2	4,2	116	m	70	6.120		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>Nº</th><th>DIAM.</th><th>QUANT</th><th>UNIT</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>1</td><td>10,0</td><td>42</td><td>cm</td><td>420</td><td>448,0</td><td>11.780</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>2</td><td>4,2</td><td>116</td><td>m</td><td>70</td><td>6.120</td><td></td></tr> </tbody> </table>	AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780	C460	2	4,2	116	m	70	6.120		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>Nº</th><th>DIAM.</th><th>QUANT</th><th>UNIT</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>1</td><td>10,0</td><td>42</td><td>cm</td><td>420</td><td>448,0</td><td>11.780</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>2</td><td>4,2</td><td>116</td><td>m</td><td>70</td><td>6.120</td><td></td></tr> </tbody> </table>	AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780	C460	2	4,2	116	m	70	6.120	
AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																												
C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780																																																																																												
C460	2	4,2	116	m	70	6.120																																																																																													
AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																												
C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780																																																																																												
C460	2	4,2	116	m	70	6.120																																																																																													
AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																												
C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780																																																																																												
C460	2	4,2	116	m	70	6.120																																																																																													
AÇO	Nº	DIAM.	QUANT	UNIT	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																												
C450	1	10,0	42	cm	420	448,0	11.780																																																																																												
C460	2	4,2	116	m	70	6.120																																																																																													
RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>10,0</td><td>4,40</td><td>400</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>4,2</td><td>1,87</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	10,0	4,40	400	C460	4,2	4,2	1,87	70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>10,0</td><td>4,40</td><td>400</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>4,2</td><td>1,87</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	10,0	4,40	400	C460	4,2	4,2	1,87	70																																				
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	10,0	4,40	400																																																																																															
C460	4,2	4,2	1,87	70																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	10,0	4,40	400																																																																																															
C460	4,2	4,2	1,87	70																																																																																															
DETALHE DOS PILARES - 1	DETALHE DOS PILARES - 2	DETALHE DOS PILARES - 3	DETALHE DOS PILARES - 4																																																																																																
SEM ESCALA PILAR: P8 / P9 / P10 / P11 / P12 / P14 / P17	SEM ESCALA PILAR: P30 / P31 / P32 / P33 / P36 / P37 / P38 / P39	SEM ESCALA PILAR: P30 / P31 / P32 / P33 / P36 / P37 / P38 / P39	SEM ESCALA PILAR: P41 / P42 / P43 / P44 / P45																																																																																																
RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																				
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO	RESUMO DO AÇO																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇO</th><th>DIAM.</th><th>C. TOTAL</th><th>PESO+10%</th><th>QUANT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C450</td><td>10,0</td><td>117,6</td><td>72,912</td><td>16rr</td></tr> <tr> <td>C460</td><td>4,2</td><td>81,20</td><td>9,744</td><td>7rr</td></tr> </tbody> </table>	AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT	C450	10,0	117,6	72,912	16rr	C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																				
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
AÇO	DIAM.	C. TOTAL	PESO+10%	QUANT																																																																																															
C450	10,0	117,6	72,912	16rr																																																																																															
C460	4,2	81,20	9,744	7rr																																																																																															
DIREITOS RESERVADOS - LEI 5.772 DE 21/12/71. A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR, FICARÁ SUJETA ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.	DIREITOS RESERVADOS - LEI 5.772 DE 21/12/71. A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR, FICARÁ SUJETA ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.	DIREITOS RESERVADOS - LEI 5.772 DE 21/12/71. A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR, FICARÁ SUJETA ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.	DIREITOS RESERVADOS - LEI 5.772 DE 21/12/71. A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR, FICARÁ SUJETA ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.																																																																																																
ESTRUTURAL	ESTRUTURAL	ESTRUTURAL	ESTRUTURAL																																																																																																
Laís Sabrina Soares Aguiar CREA-SP 1516529-4 E-mail: lais.sabrina@outlook.com.br	Laís Sabrina Soares Aguiar CREA-SP 1516529-4 E-mail: lais.sabrina@outlook.com.br	Laís Sabrina Soares Aguiar CREA-SP 1516529-4 E-mail: lais.sabrina@outlook.com.br	Laís Sabrina Soares Aguiar CREA-SP 1516529-4 E-mail: lais.sabrina@outlook.com.br																																																																																																
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, GRISMAR PEREIRA JOMES	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, GRISMAR PEREIRA JOMES	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, GRISMAR PEREIRA JOMES	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, GRISMAR PEREIRA JOMES																																																																																																
5/5	5/5	5/5	5/5																																																																																																




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba


TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – TP

HIDROSANITÁRIO

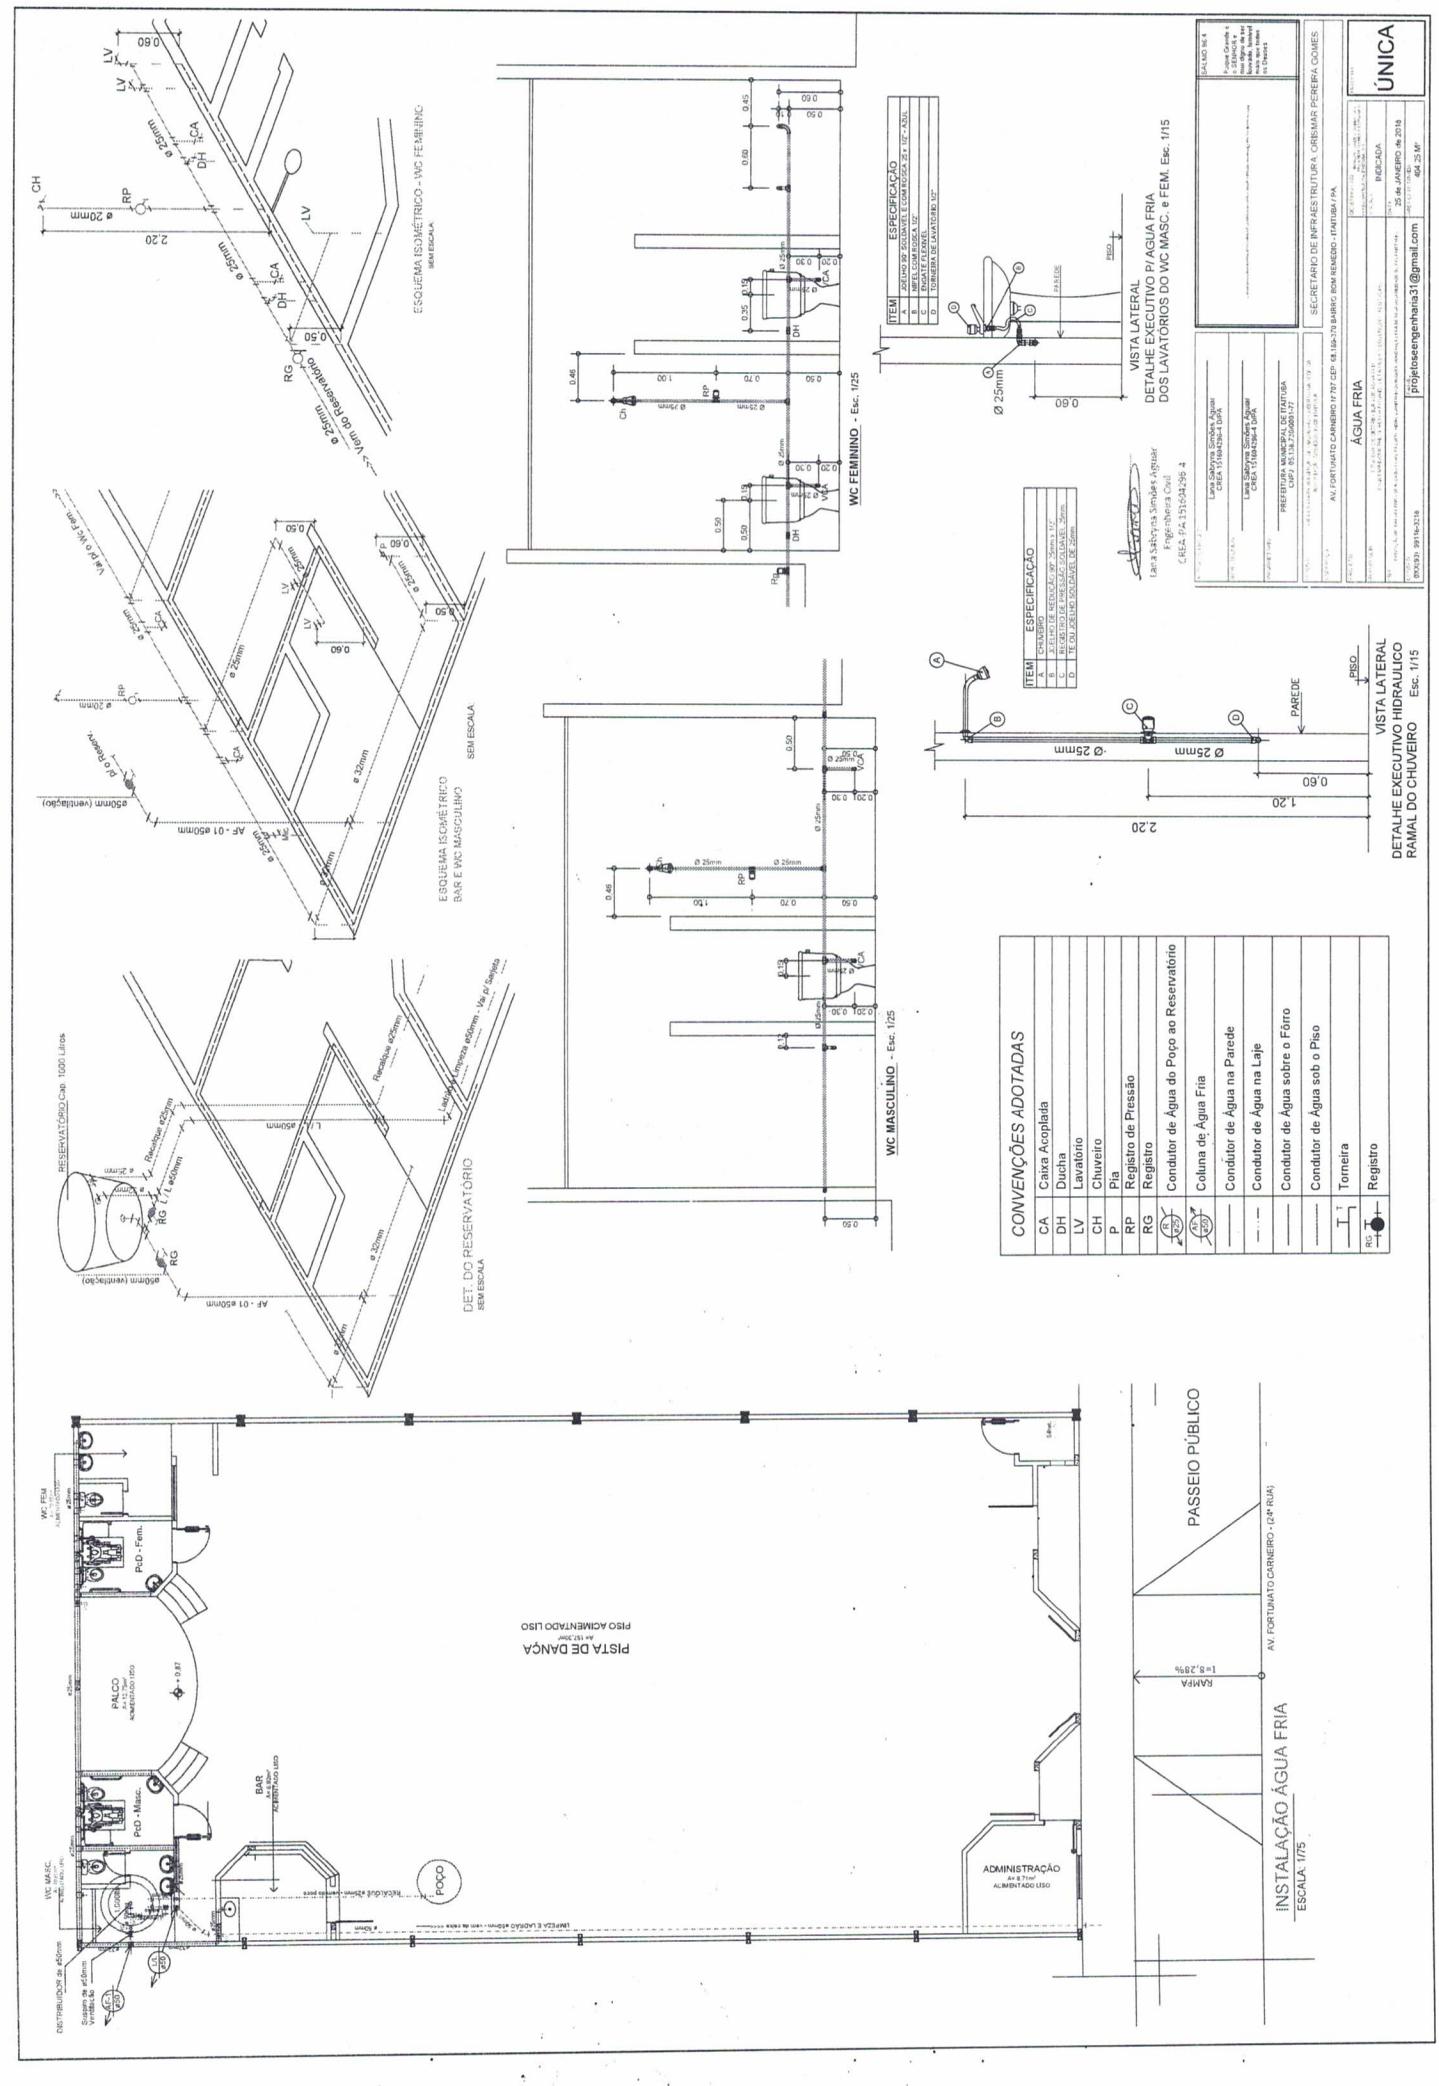

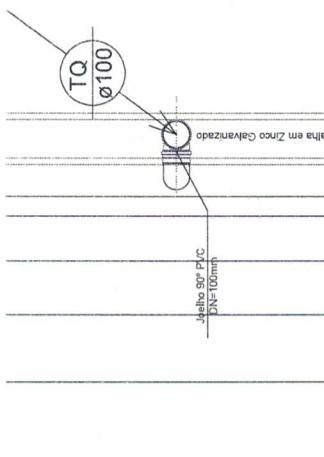



DETALHE - 01 ESCALA: 1:10

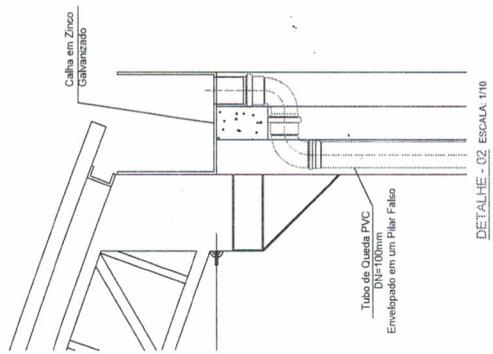


DETALHE - 03 ESCALA: 1:10

CONVENÇÕES ADOTADAS


	Tubo PVC Sanitário
	Joelho 90º
	Tubo de Queda

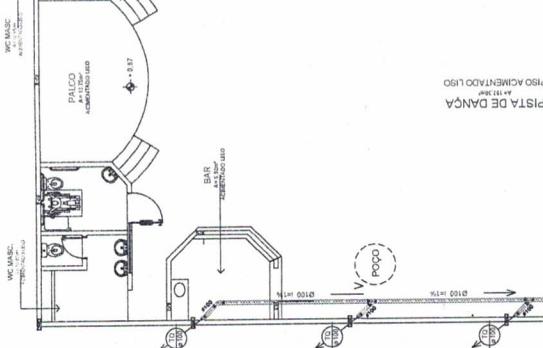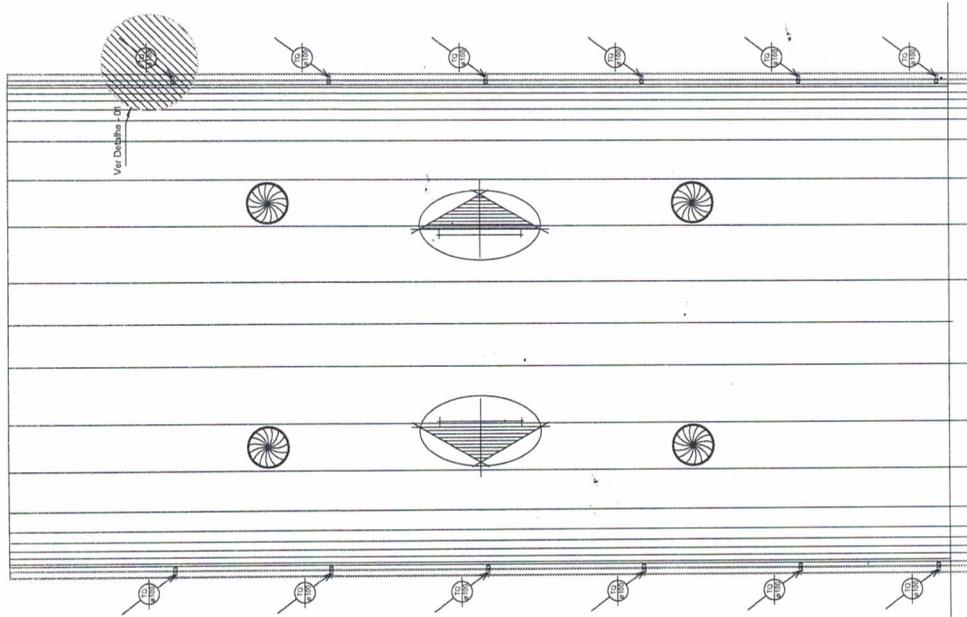

ÁGUA PLUVIAL - Planta Baixa ESCALA: 1:75



ÁGUA PLUVIAL - Cobertura ESCALA: 1:75



ÁGUA PLUVIAL ESCALA: 1:75




DETALHE - 04 ESCALA: 1:10

SECRETAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CRISMARI PEREIRA GOMES
Av. Fortunato Carneiro, 124 - Centro
CEP: 65.660-270 - BARRO BOIM - PR
Tel.: (43) 3222-1590/256-4
E-mail: projetoengenharia31@gmail.com
Data: 25 de JANEIRO de 2015
Assinatura:



ÁGUA PLUVIAL ESCALA: 1:75

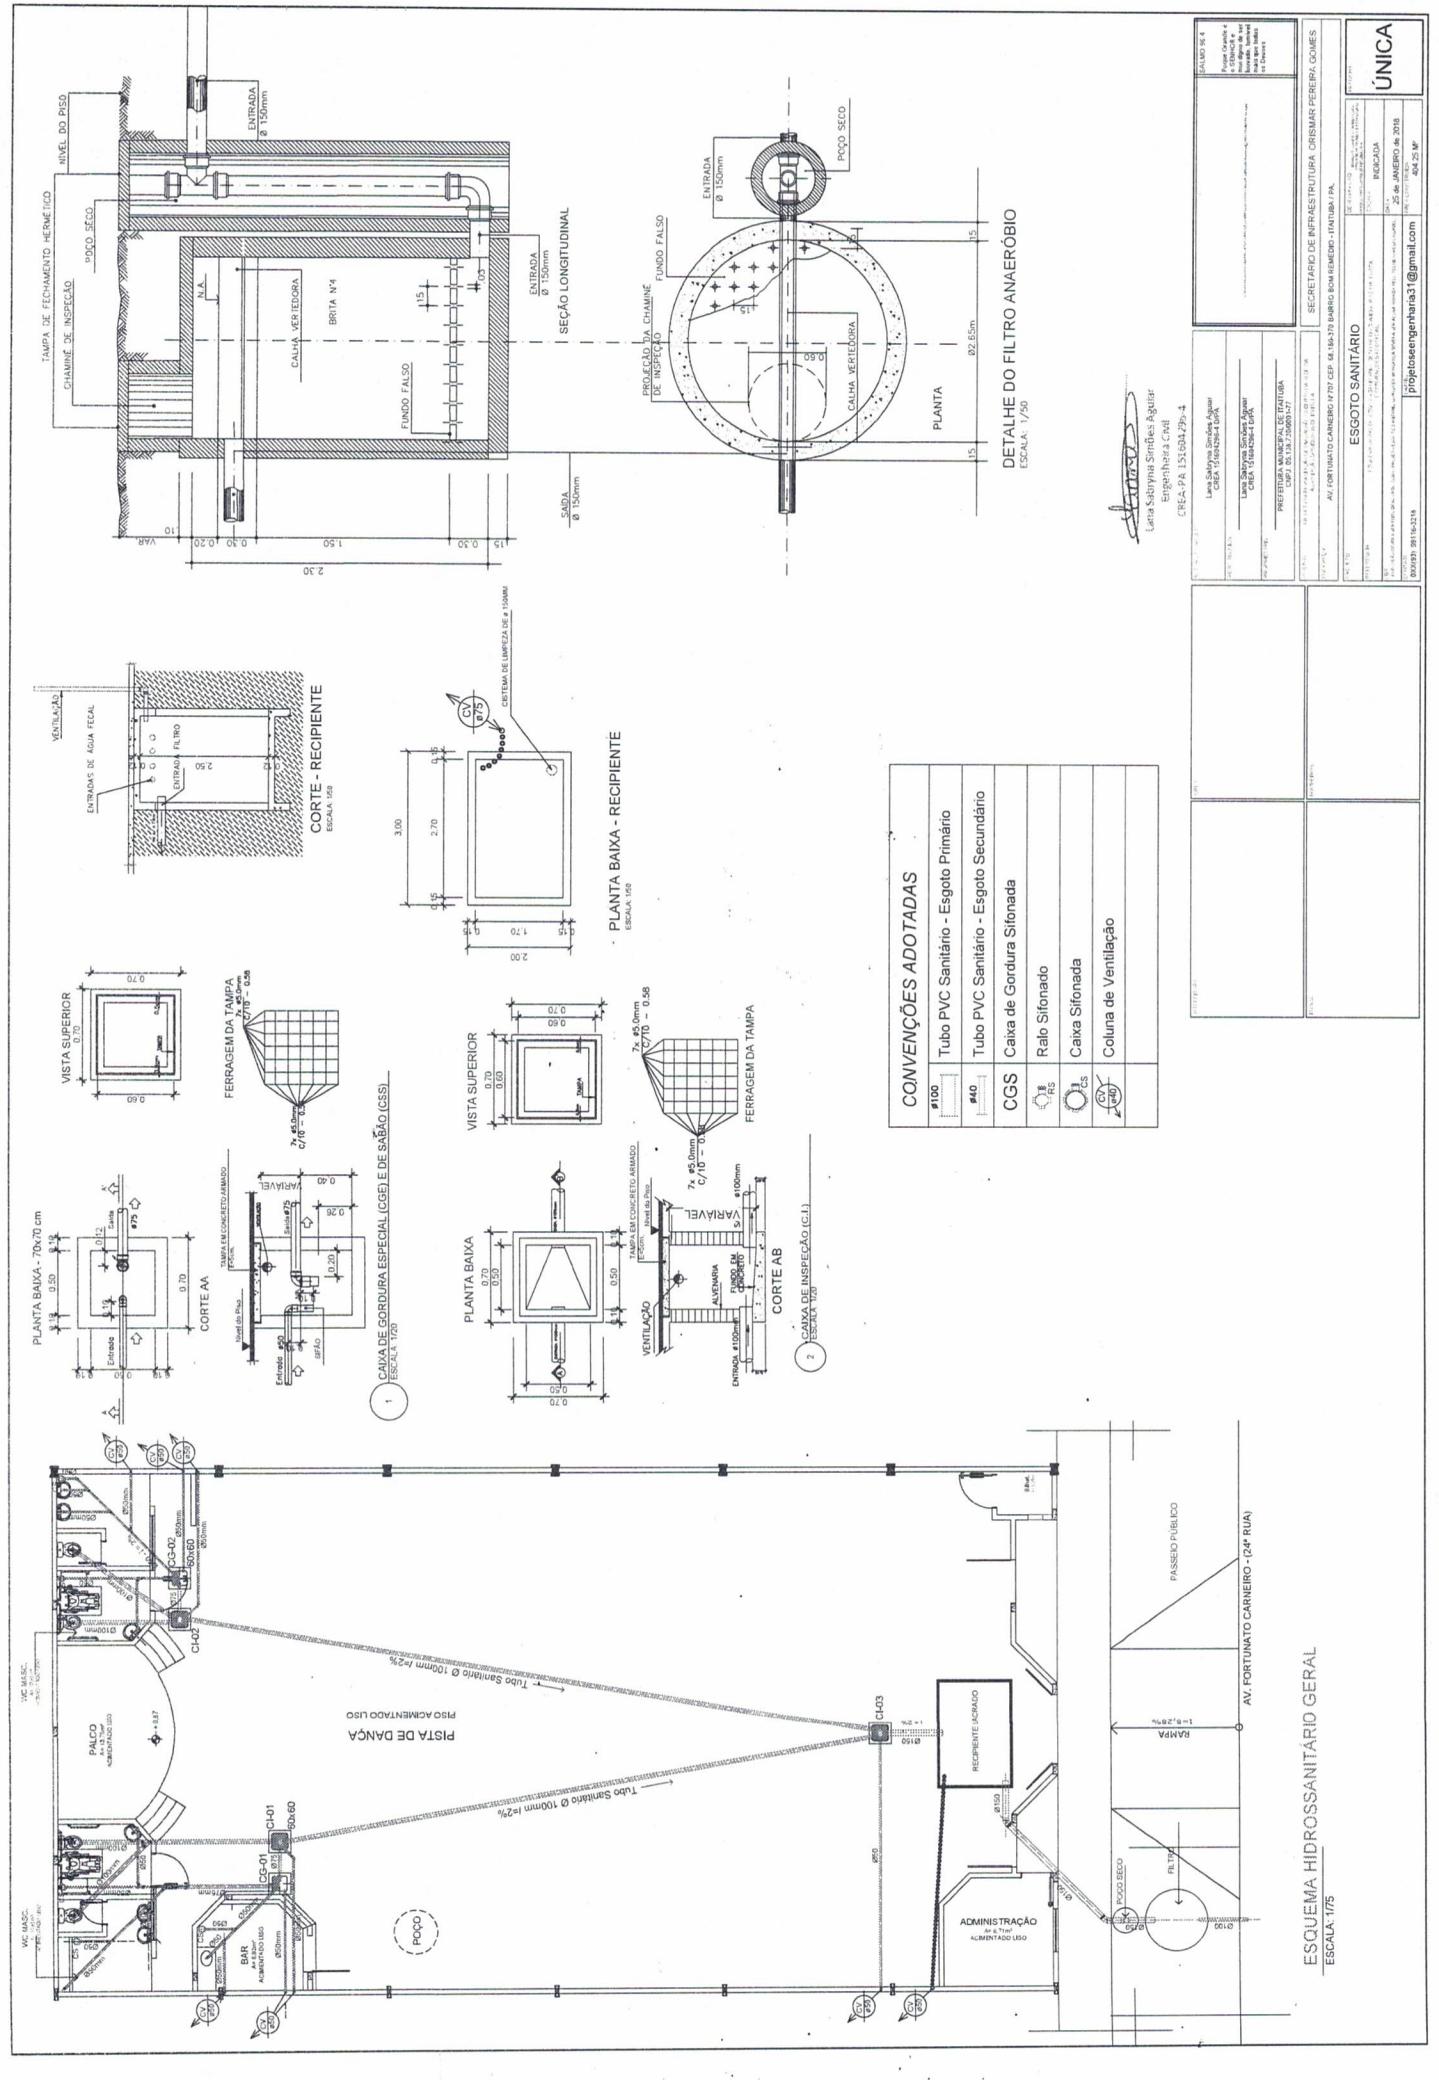




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 – TP

INCÊNDIO

QUADRO DE SIMBOLOGIA

THE JOURNAL OF CLIMATE

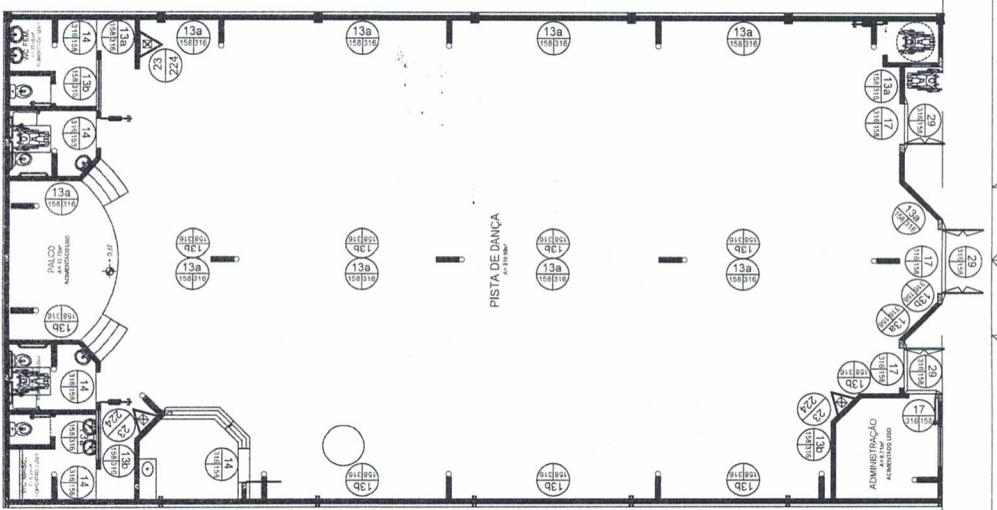


PLANTA BAIXA ESCALA: 1/75

- 1 -

卷之三



DET. EXTINTOR (INST. N.º DA DIRECÇÃO)



**DET. PLACA DE SINALIZAÇÃO
E BARRA ANTI-PÂNICO**





AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES :											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m ²	3	583,63	100%	100%	100%	-	-	-	100% 1.750,89
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	30	64,06	100%	100%	100%	-	-	-	100% 1.921,80
1.3	Locação da obra a treira	m ²	404	4,50	100%	100%	100%	-	-	-	100% 1.819,13
1.4	Licenças e taxas da obra (até 500m ²)	cj	1	6.776,64	100%	100%	100%	-	-	-	100% 6.776,64
1.5	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	und.	1	1.288,20	100%	100%	100%	-	-	-	100% 6.776,64
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	106,66	100%	100%	100%	-	-	-	100% 12.799,20
3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES :											
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO.	m ³	179	94,31	100%	100%	100%	-	-	-	100% 16.900,35

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA.
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			TOTAL PARCIAL
					CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS	
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3.	m ³	41,06	22,49	100%	923,44	923,44	100% 923,44
3.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM.	m ³	41,06	7,42	100%	304,67	304,67	100% 304,67
4 MOVIMENTO DE TERRA:								
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos dos Pilares)	m ³	13,0	43,75	100%	568,75	568,75	100% 568,75
4.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apilamento	m ³	74,68	102,61	100%	7.662,91	7.662,91	100% 7.662,91
5 FUNDAÇÃO:								
5.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	9,78	2.307,87	100%	22.570,97	11.285,49	100% 22.570,97
6 BALDRAME:								
6.1	Baldrame em Alvenaria Dobrada	m ²	34,00	92,75	100%	3.153,50	1.576,75	100% 3.153,50
7 ESTRUTURA:								
7.1	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca(Pilares e Cintas)	m ³	17,272	2.476,11	100%	42.767,37	21.383,69	100% 42.767,37

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 1516042964



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA.
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
					CRONOGRAMA FÍSICO	CRONOGRAMA FINANCEIRO	Data: 01/02/2.018				
VERGAS E CONTRA-VERGAS											
7.2	Concreto c/ seixo e aditivo imperm. Fck = 13,5 MPA (incl preparo e lançamento)	m ³	0,288	704,57		100%	50%	50%	-	-	100%
					202,92		101,46	101,46	-	-	202,92
8 PAREDES E PAINÉIS:											
8.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo. (incluindo Muro)	m ²	404,25	56,50	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
8.2	Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm-Fachada Principal	m ²	19,5	123,32	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
					2.404,74		721,42	1.683,32	-	-	2.404,74
9 REVESTIMENTO:											
9.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	788,60	9,65	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
9.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	788,60	39,17	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
9.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	62,40	33,26	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
9.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m ²	62,40	78,37	100%	30%	70%	70%	-	-	100%
					4.890,29		1.467,09	3.423,20	-	-	4.890,29
10 INSTALAÇÕES:											
10.1	ELÉTRICA:										

Liana Sabryna S. Aguiar
Engenharia Civil
CREA - PA 451604296-4



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACETIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSSES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
									Data: 01/02/2.018	Total Parcial
10.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	36	154,98		100%	50%	50%		100%
10.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND.	27	157,06		100%	50%	50%		100%
10.1.3	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDOSUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR. CONDICIONADO)	UND.	9	175,01		100%	50%	50%		100%
10.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND.	12	142,10		100%	50%	50%		100%
					1.705,20		852,60	852,60		1.705,20

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARÁ.**

Data:
01/02/2.018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CRONOGRAMA		TOTAL PARCIAL
					03 MÊSES	30 DIAS	
10.1.5	OUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASTICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	2	534,54	100%	50%	100%
10.2 HIDROSANITÁRIA:				1.069,08	1.069,08	534,54	1.069,08
	LOUCAS E METAIS						
10.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	6	316,76	100%	50%	100%
10.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	4	410,43	1.900,56	950,28	1.900,56
10.2.3	Torneira plastica de 1/2"	UND	7	26,24	1.641,72	820,86	1.641,72
					100%	50%	100%
10.2.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	1	337,86	183,68	91,84	183,68
					100%	50%	100%

Lana Sessinga S. Souza

Engenheira Civil

CREA - PA 151004296-4

**AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
					100%	50%	50%				
10.2.5	Chuveiro cromado	UND.	2	71,98	100%	50%	50%	-	-	-	100%
10.2.6	Registro de pressao c/ canopla- 1/2"	UND.	2	109,96	100%	50%	50%	-	-	-	100%
10.2.7	Registro de gaveta 2" - Bruto	UND	2	175,30	100%	50%	50%	-	-	-	100%
10.2.8	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	UND.	2	115,50	100%	50%	50%	-	-	-	100%
10.2.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UND.	1,0	3.882,34	100%	50%	50%	-	-	-	231,00
PONTO DE ESGOTO											
10.2.10	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	66,6	16,17	100%	50%	50%	-	-	-	100%
10.2.11	Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	3,0	22,27	100%	50%	50%	-	-	-	1.076,11
10.2.12	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	48,1	30,09	100%	50%	50%	-	-	-	66,81
					1.447,33	723,67	723,67	-	-	-	1.447,33

Lana Sabrina S. Aquiar
Engenheira Civil
CREA - PA 131604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
									Data: 01/02/2.018	Total Parcial
10.2.13	Tubo em PVC - 150mm (LS)	M	7,5	52,16	391,20	195,60	195,60	195,60	50%	100%
10.2.14	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UND	1,0	45,04	45,04	22,52	22,52	22,52	-	391,20
10.2.15	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UND	12,0	20,25	243,00	121,50	121,50	121,50	-	100%
10.2.16	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UND	4,0	14,99	59,96	29,98	29,98	29,98	-	243,00
10.2.17	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS	UND	2,0	86,10	172,20	86,10	86,10	86,10	-	100%
10.2.18	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UND	4,0	24,69	98,76	49,38	49,38	49,38	-	172,20
10.2.19	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UND	20,0	15,68	313,60	156,80	156,80	156,80	-	100%
10.2.20	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UND	5,0	432,36	2.161,80	1.080,90	1.080,90	1.080,90	-	98,76
10.2.21	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UND	5,0	24,31	100%	50%	50%	50%	-	100%
					121,55	60,78	60,78	60,78	-	121,55

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
DRENAGEM- TUBOS E CONFECÇÕES										
10.2.22	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	126,0	30,09	3.791,34	1.895,67	1.895,67	1.895,67	-	100%
10.2.23	Té curto em PVC - JS - 100x100mm- LS	UND	8,0	33,54	268,32	134,16	134,16	134,16	-	100%
10.2.24	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS	UND	2,0	29,22	58,44	29,22	29,22	29,22	-	100%
10.2.25	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UND	36,0	24,69	888,84	444,42	444,42	444,42	-	100%
AGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES										
10.2.26	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	31,7	27,59	875,71	437,86	437,86	437,86	-	100%
10.2.27	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	4,0	16,66	66,64	33,32	33,32	33,32	-	100%
10.2.28	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	28,7	11,49	329,76	164,88	164,88	164,88	-	100%
10.2.29	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	unid.	16,0	14,17	226,72	113,36	113,36	113,36	-	100%
										226,72

Lançamento

Engenheira Civil
CREA - PA 15164296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA.
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
									Data: 01/02/2.018	Total Parcial
10.2.30	Adaptador curto PVC SR - 25mm X 3/4" (LH)	unid.	4,0	4,56		100%	50%	50%	-	100%
10.2.31	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	unid.	5,0	7,50		100%	50%	50%	-	100%
10.2.32	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	unid.	15,0	7,83	37,50	18,75	18,75	18,75	-	37,50
10.2.33	Tê em PVC - JS - 50mm-LH	unid.	2,0	20,79	117,45	58,73	58,73	58,73	-	117,45
10.2.34	Tê de redução 90° JS - 50mm X 32mm (LH)	unid.	1,0	25,93	41,58	20,79	20,79	20,79	-	41,58
11	PAVIMENTAÇÃO:				100%	50%	50%	50%	-	100%
11.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	m ²	373,00	55,86	20.835,78	-	20.835,78	-	-	20.835,78
11.2	Cimentado liso c/ junta plástica	m ²	373,00	51,09	19.056,57	-	19.056,57	-	-	100%
12	FORRO:				100%	-	100%	-	-	100%
12.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m ³	40,00	45,01	1.800,40	-	1.800,40	-	-	1.800,40

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
COPA 0454649064



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		TOTAL PARCIAL
					CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	
12.2	Forro em lambrí de PVC	m ³	40,00	41,35	100%	-	100%
13 ESQUADRIAS:							
13.1	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,60X 1,80)m X 6 unid.	m ²	2,16	532,57	100%	-	100%
13.2	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (1,00X 1,15)m X 1 unid.	m ²	1,15	532,57	100%	-	100%
13.3	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,90X 2,10)m X 3 unid.	m ²	5,67	532,57	100%	-	100%
13.4	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,80X 2,10)m X 1 unid.	m ²	1,68	532,57	100%	-	100%
13.5	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16"-incl. ferragens e pintura antiferruginosa. (1,20x2,10+0,40)m x 2 unid.	m ²	7	771,18	100%	-	100%
13.6	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16"-incl. ferragens e pintura antiferruginosa. (2,00x2,50+0,40)m x 1 unid.	m ²	5	771,18	100%	-	100%
13.7	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) (1,20x1,00)m x 1 unid.	m ²	1,20	318,31	100%	-	100%
				381,97	100%	-	381,97

01/02/2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 1616042964



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
 ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
 ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			TOTAL PARCIAL
					CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS	
13.8	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva). (1,50x0,50)mx2 unid.	m ²	1,50	318,31	100%	-	100%	-
14	PINTURA:				477,47	-	477,47	-
14.1	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador.	m ²	788,60	22,57	100%	-	-	100%
14.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa -(Portas em Madeira).	m ²	21,32	22,41	100%	-	-	100%
14.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - Balancinhos; portões e esquadrias basculantes.	m ²	14,90	46,75	100%	-	-	100%
15	COMBATE A INCENDIO				696,58	-	-	696,58
15.1	Luminária c/ lâmp de emergência	UND	20,00	64,81	100%	-	-	100%
15.2	Placa de sinalização fotoluminescente	UND	36,00	68,78	100%	-	-	1.296,20
15.3	Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg	UND	3,00	442,48	100%	-	-	100%
16	DIVERSOS:				1.327,44	-	-	1.327,44
16.1	Exaustor eólico 24"	UND.	4	456,54	100%	1.826,16	-	1.826,16

Lana Sabynna S. Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA - PA 151604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA.

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO CUSTO PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE DE ITAITUBA
ESTADO DO PARÁ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CRONOGRAMA P/ 03 MÊSES			60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCIAL
					CONTRATO P/ 03 MÊSES	30 DIAS	60 DIAS			
16.2	Barra em aço inox (PNE)	M	4	261,45	100%	-	-	-	100%	100%
16.3	Limpeza geral e entrega da obra.	m³	373,00	5,69	941,22	-	-	-	941,22	941,22
					100%	-	-	-	100%	100%
					2.122,37	-	-	-	2.122,37	2.122,37
TOTAL SIMPLES R\$				316.379,82	126.278,74	161.138,55	28.962,53	316.379,82		
TOTAL ACUMULADO R\$				-	126.278,74	287.417,29	316.379,82	-	-	
Percentual Simples %				-	39,91%	50,93%	9,15%	-	-	
Percentual Acumulado %				-	39,91%	90,85%	100,00%	-	-	

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Data:
	01/02/2.018



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:		CONCORRÊNCIA:			CONTRATO:			VALOR DA EXPEDIÇÃO:	
PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA		DATA DA VISTORIA:						R\$ 316.379,82	
LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 – BAIRRO DA BELA VISTA – ITAITUBA/PARÁ.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	SINAPI/PA - 02/2018	SEDOP/PA - 09/2017	TABELA	B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
			UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código	Custo		28,82%	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:				13.556,66					4.2849
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m²	3	583,63	1.750,89	74209/001	SINAPI	453,06	1,2882
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	30	64,06	1.921,80	74220/001	SINAPI	49,73	1,2882
1.3	Locação da obra a trena	m²	404,25	4,50	1.819,13	011171	SEDOP	3,49	1,2882
1.4	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1	6.776,64	6.776,64	011171	SEDOP	5.260,55	1,2882
1.5	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	und.	1,00	1.288,20	1.288,20	000006	SEDOP	1.000,00	1,2882
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12.799,20					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	106,66	12.799,20	90777	SEDOP	82,80	1,2882
3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:				18.128,46					5.7300
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	179,20	94,31	16.900,35	SINAPI	97621	73,21	1,2882
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	m³	41,06	22,49	923,44	SINAPI	72897	17,46	1,2882
									0,2919

*Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA-PA 151604296-4*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA **DATA DA VISTORIA:**

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

CONCORRÊNCIA:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:
R\$ 316.379,82

CONTRATO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		Ref. Código	Custo	B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
				UNITÁRIO	TOTAL				
3.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM.	m³	41,06	7,42	304,67	SINAPI 72900	5,76	1,2882	0,0963
4.0	MOVIMENTO DE TERRA:				8.231,66				2.6018
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos dos Pilares)	m³	13,00	43,75	568,75	SEDOP 30010	33,96	1,2882	0,1798
4.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	m³	74,68	102,61	7.662,91	SEDOP 030011	79,65	1,2882	2,4221
5.0	FUNDAÇÃO:				22.570,97				7.1341
5.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	9,78	2.307,87	22.570,97	SEDOP 040283	1.791,55	1,2882	7,1341
6.0	BALDRAME:				3.153,50				0,997
6.1	Baldrame em Alvenaria Dobrada	m²	34	92,75	3.153,50	Composição Local	72,00	1,2882	0,9967
7.0	ESTRUTURA:				42.970,29				13.5819
7.1	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca(Pilares e Cintas)	m³	17,272	2.476,11	42.767,37	SEDOP 050729	1.922,15	1,2882	13,5177
VERGAS E CONTRA-VERGAS									
7.2	Concreto c/ seixo e aditivo imperm. Fck = 13,5 MPA (incl preparo e lançamento)	m³	0,288	704,57	202,92	SEDOP 50511	546,94	1,2882	0,0641

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 16100/2004-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:	PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA	LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.	DATA DA VISTORIA:	CONCORRÊNCIA:			CONTRATO:	VALOR DA EXPEDIÇÃO: R\$ 316.379,82
				TABELA	SINAPI/PA - 02/2018 SEDOP/PA - 09/2017	B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código	Custo	28,82%
8.0 PAREDES E PAINÉIS:					25.244,87			7.9793
8.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo.	m²	404,25		56,50	22.840,13	SEDOP 060046	43,86	1,2882
Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm - Fachada PRINCIPAL SUPERIOR.	m²	19,50		123,32	2.404,74	SEDOP 060212	95,73	1,2882
9.0 REVESTIMENTO:					45.465,16			14.3704
9.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	788,60		9,65	7.609,99	SEDOP 110143	7,49	1,2882
9.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	788,60		39,17	30.889,46	SEDOP 110763	30,41	1,2882
9.3 Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	62,40		33,26	2.075,42	SEDOP 110762	25,82	1,2882
9.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	62,40		78,37	4.890,29	SEDOP 110644	60,84	1,2882
10 INSTALAÇÕES:					14.169,27			4.4786
10.1 ELÉTRICA:								
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUIINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	36		154,98	5.579,28	SINAPI 93140	120,31	1,2882

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 131603206-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:	PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA	LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.	CONCORRÊNCIA:		CONTRATO:	DATA DA EXPEDIÇÃO:	VALOR DA OBRA: R\$ 316.379,82
			DATA DA VISTORIA:	CONTRATO:			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	SINAPI/PA - 02/2018 SEDOP/PA - 09/2017	B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
10.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	27	157,06	4.240,62	SINAPI 93142	121,92 1,2882 1,3404
10.1.3	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO)	UND	9	175,01	1.575,09	SINAPI 93144	135,86 1,2882 0,4978
10.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	12	142,10	1.705,20	SINAPI 93143	110,31 1,2882 0,5390
10.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	534,54	1.069,08	SINAPI 74131/004	414,95 1,2882 0,3379

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA **DATA DA VISTORIA:**

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

CONCORRÊNCIA:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

R\$ 316.379,82

CONTRATO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		Ref. Código	Custo	B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)	VALOR DA OBRA:
				UNITÁRIO	TOTAL					
10.2	HIDROSSANITÁRIA:				21.835,47					
	LOUÇAS E METAIS									
10.2.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	6	316,76	1.900,56	SINAPI 86903	245,89	1,2882	0,6007	
10.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4	410,43	1.641,72	SINAPI 868888	318,61	1,2882	0,5189	
10.2.3	Torneira plástica de 1/2"	UND	7	26,24	183,68	SEDOP 190230	20,37	1,2882	0,0581	
10.2.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1	337,86	337,86	SINAPI 86934	262,27	1,2882	0,1068	
10.2.5	Chuveiro cromado	UND	2	71,98	143,96	SEDOP 190231	55,88	1,2882	0,0455	
10.2.6	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	UND	2	109,96	219,92	SEDOP 180445	85,36	1,2882	0,0695	

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CRFA - PA 46180-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:	PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA	LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.	CONCORRÊNCIA:	CONTRATO:			VALOR DA OBRA: R\$ 316.379,82
				DATA DA VISTORIA:	DATA DA EXPEDIÇÃO:		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TABELA SINAPI/PA - 02/2018 SEDOP/PA - 09/2017	E.D. I (%)	CURVA DO ABC (%)
10.2.7	Registro de gaveta 2" - Bruto	UND	2	175,30	350,60	SEDOP 180799	136,08 1,2882 0,1108
10.2.8	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UND	2	115,50	231,00	SEDOP 180441	89,66 1,2882 0,0730
10.2.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UND	1	3.882,34	3.882,34	SINAPI 93214	3.013,77 1,2882 1,2271
10.2.10	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	66,55	16,17	1.076,11	SEDOP 180104	12,55 1,2882 0,3401
10.2.11	Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	3,0	22,27	66,81	SEDOP 180103	17,29 1,2882 0,0211
10.2.12	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	48,1	30,09	1.447,33	SEDOP 180102	23,36 1,2882 0,4575
10.2.13	Tubo em PVC - 150mm (LS)	M	7,5	52,16	391,20	SEDOP 180508	40,49 1,2882 0,1236
10.2.14	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UND	1	45,04	45,04	SEDOP 180245	34,96 1,2882 0,0142
10.2.15	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UND	12	20,25	243,00	SEDOP 180247	15,72 1,2882 0,0768

Lana Sampaio S. Aguiar
Engenheira Civil

Caixa de classificações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

CONCORRÊNCIA:

CONTRATO:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

R\$ 316.379,82

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TABELA		B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
					UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código	Custo
10.2.16	Joelho/Cotovel 45° PVC JS - 50mm - LS	UND	4	14,99	59,96	SEDOP 180243	11,64	1,2882 0,0190
10.2.17	Joelho/Cotovel 45° PVC JS - 150mm - LS	UND	2	86,10	172,20	SEDOP 180240	66,84	1,2882 0,0544
10.2.18	Joelho/Cotovel 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UND	4	24,69	98,76	SEDOP 180472	19,17	1,2882 0,0312
10.2.19	Joelho/Cotovel 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UND	20	15,68	313,60	SEDOP 180472	12,17	1,2882 0,0991
10.2.20	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UND	5	432,36	2.161,80	SEDOP 180678	335,63	1,2882 0,6833
10.2.21	Câixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UND	5	24,31	121,55	SEDOP 180093	18,87	1,2882 0,0384
DRENAGEM- TUBOS E CONFECCÕES								
10.2.22	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	126	30,09	3.791,34	SEDOP 180102	23,36	1,2882 1,1984
10.2.23	Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	UND	8	33,54	268,32	SEDOP 180478	26,04	1,2882 0,0848
10.2.24	Joelho/Cotovel 45° PVC JS - 100mm - LS	UND	2	29,22	58,44	SEDOP 180241	22,68	1,2882 0,0185

Laura Steynna S. Aguiar
Engenheira Civil

CREA - PA 161604296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA **DATA DA VISTORIA:**

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

CONCORRÊNCIA:

CONTRATO:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

R\$ 316.379,82

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TABELA		B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
					UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código	Custo
10.2.25	Joelho/Cotovel o 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UND	36	24,69	888,84	SEDOP 180474	19,17	1,2882 0,2809
	AGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES							
10.2.26	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	31,74	27,59	875,71	SEDOP 180423	21,42	1,2882 0,2768
10.2.27	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	4,00	16,66	66,64	SEDOP 180106	12,93	1,2882 0,0211
10.2.28	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	28,70	11,49	329,76	SEDOP 180107	8,92	1,2882 0,1042
10.2.29	Joelho/Cotovel o 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	unid.	16	14,17	226,72	SEDOP 180220	11,00	1,2882 0,0717
10.2.30	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	unid.	4	4,56	18,24	SEDOP 180238	3,54	1,2882 0,0058
10.2.31	Joelho/Cotovel o 90° PVC - JS - 25mm-LH	unid.	5	7,50	37,50	SEDOP 180427	5,82	1,2882 0,0119
10.2.32	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	unid.	15	7,83	117,45	SEDOP 180434	6,08	1,2882 0,0371
10.2.33	Tê em PVC - JS - 50mm-LH	unid.	2	20,79	41,58	SEDOP 180437	16,14	1,2882 0,0131

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA-PA 119000002964



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS. NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:		CONCORRÊNCIA:		CONTRATO:	
PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA		DATA DA VISTORIA:		DATA DA EXPEDIÇÃO:	
LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.				VALOR DA OBRA: R\$ 316.379,82	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TABELA SINAPI/PA - 02/2018 SEDOP/PA - 09/2017
			UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código Custo
10.2.34	Te de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH)	unid.	1	25,93	25,93 SEDOP 180226 20,13 1,2882 0,0082
11.0	PAVIMENTAÇÃO:			39.892,35	12.6090
11.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	m ²	373	55,86 20.835,78 SEDOP 130111 43,36 1,2882 6,5857	
11.2	Cimentado liso c/ junta plastica	m ²	373	51,09 19.056,57 SEDOP 130233 39,66 1,2882 6,0233	
12.0	FORRO:			3.454,40	1.0919
12.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m ²	40,00	45,01 1.800,40 SEDOP 140348 34,94 1,2882 0,5691	
12.2	Forro em lambri de PVC	m ²	40,00	41,35 1.654,00 SEDOP 141336 32,10 1,2882 0,5228	
13.0	ESQUADRIAS:			15.945,03	5.0398
13.1	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,60X 1,80)m X 2 unid.	m ²	2,16	532,57 1.150,35 SEDOP 090062 413,42 1,2882 0,3636	
13.2	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (1,00X 1,15)m X 1 unid.	m ²	1,15	532,57 612,46 SEDOP 090062 413,42 1,2882 0,1936	
13.3	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,90X 2,10)m X 3 unid.	m ²	5,67	532,57 3.019,67 SEDOP 090062 413,42 1,2882 0,9544	
13.4	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar (0,80X 2,10)m X 1 unid.	m ²	1,68	532,57 894,72 SEDOP 090062 413,42 1,2882 0,2828	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:

CONCORRÊNCIA:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

VALOR DA OBRA:
R\$ 316.379,82

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	TABELA		B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
					UNITÁRIO	TOTAL	Ref. Código	Custo
13.5	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16"-incl. ferragens e pintura antiferruginosa. (1,20x2,50+0,40)m x 2 unid.	m ²	6,8	771,18	5.244,02	SEDOP 091500	598,65	1,2882 1,6575
13.6	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16"-incl. ferragens e pintura antiferruginosa. (2,00x2,50+0,40)m x 1 unid.	m ²	5,4	771,18	4.164,37	SEDOP 091500	598,65	1,2882 1,3163
13.7	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) (1,20x1,00)m x 1 unid.	m ²	1,20	318,31	381,97	SEDOP 090069	247,10	1,2882 0,1207
13.8	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva). (1,50x0,50)mx2 unid.	m ²	1,50	318,31	477,47	SEDOP 090069	247,10	1,2882 0,1509
14.0 PINTURA:					18.973,06			5.9969
14.1	Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador.	m ²	788,60	22,57	17.798,70	SEDOP 150180	17,52	1,2882 5,6257
14.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa - (Portas em Madeira).	m ²	21,32	22,41	477,78	SEDOP 150377	17,40	1,2882 0,1510
14.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - Balancinhos; portões e esquadrias basculantes.	m ²	14,90	46,75	696,58	SEDOP 150491	36,29	1,2882 0,2202

Lana Sabrina S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151004296-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA:

PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:

CONCORRÊNCIA:

CONTRATO:

DATA DA EXPEDIÇÃO:

R\$ 316.379,82

LOCAL DA OBRA: AVENIDA FORTUNATO CARNEIRO N° 707 - BAIRRO DA BELA VISTA - ITAITUBA/PARÁ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO	PREÇO	TABELA		B.D.I (%)	CURVA DO ABC (%)
						TOTAL	Ref. Código		
15.0 COMBATE A INCENDIO									
15.1	Luminária c/ lâmp de emergência	UND	20,00	64,81	1.296,20	170978		50,31	1,2882
15.2	Placa de sinalização fotoluminoscente	UND	36,00	68,78	2.476,08	SEDOP 241468		53,39	1,2882
15.3	Extintor de incêndio (pó químico) - 12 Kg	UND	3,00	442,48	1.327,44	SEDOP 201328		343,49	1,2882
16.0 DIVERSOS:									
16.1	Exaustor eólico 24"	UND.	4,00	456,54	1.826,16	SEDOP 251508		354,40	1,2882
16.2	Barra em aço inox (PNE)	M	3,60	261,45	941,22	SEDOP 251509		202,96	1,2882
16.3	Limpeza geral e entrega da obra.	m ²	373,000	5,69	2.122,37	SEDOP 270220		4,42	1,2882
CUSTO TOTAL				M²	404,25	782,63	316.379,82		
								100,0000	

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR	151604296-4
Engenheira Civil	CREA - PA

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS -

Grupo A	<i>Despesas indiretas</i>	
AC	Administração central	3,00
S	Seguro	0,40
R	Risco	0,97
G	Garantia	0,40
Total do grupo A		4,77
Grupo B	<i>Bonificação</i>	
DF	Despesas Financeiras	0,59
Total do grupo B		0,59
Grupo C	<i>Bonificação</i>	
L	Lucro	6,16
Total do grupo C		6,16
Grupo D	<i>Impostos</i>	
C.1	PIS	0,65
C.2	COFINS	3,00
C.3	ISSQN	5,00
C.4	CPRB	4,50
Total do grupo D		13,15
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
$BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1$		28,82%

Lana Sabryna S. Aguiar
Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 161604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (SEDOP)

PRODUTOS	DURAÇÃO			
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES:	9.983,89	-	-	9.983,89
ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	9.426,06			9.426,06
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:	13.350,82	-	-	13.350,82
MOVIMENTO DE TERRA:	6.062,26	-	-	6.062,26
FUNDAÇÃO:	8.311,27	8.311,27	-	16.622,54
BALDRAME:	1.161,21	1.161,21	-	2.322,42
ESTRUTURA:	15.822,88	15.822,88	-	31.645,75
PAREDES E PAINÉIS:	5.577,53	13.014,23	-	18.591,75
REVESTIMENTO:	10.044,93	23.438,18	-	33.483,12
INSTALAÇÕES ELÉTRICA:	5.217,53	5.217,53	-	10.435,05
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA:	8.040,44	8.040,44	-	16.080,88
PAVIMENTAÇÃO:	-	29.378,98	-	29.378,98
FORRO:	-	2.544,02	-	2.544,02
ESQUADRIAS:	-	11.742,82	-	11.742,82
PINTURA:	-	-	13.972,83	13.972,83
COMBATE A INCENDIO:	-	-	3.755,72	3.755,72
DIVERSOS:	-	-	3.601,09	3.601,09
TOTAL	92.998,81	118.671,55	21.329,65	233.000,00

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 1	ATIVIDADES	PRODUTOS	DURAÇÃO			
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA	SERVIÇOS PRELIMINARES:		13.556,66	-	-	13.556,66
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		12.799,20			12.799,20
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:		18.128,46	-	-	18.128,46
	MOVIMENTO DE TERRA:		8.231,66	-	-	8.231,66
	FUNDADAÇÃO:		11.285,49	11.285,49	-	22.570,97
	BALDRAME:		1.576,75	1.576,75	-	3.153,50
	ESTRUTURA:		21.485,15	21.485,15	-	42.970,29
	PAREDES E PAINÉIS:		7.573,46	17.671,41	-	25.244,87
	REVESTIMENTO:		13.639,55	31.825,61	-	45.465,16
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA:		7.084,64	7.084,64	-	14.169,27
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA:		10.917,74	10.917,74	-	21.835,47
	PAVIMENTAÇÃO:		-	39.892,35	-	39.892,35
	FORRO:		-	3.454,40	-	3.454,40
	ESQUADRIAS:		-	15.945,03	-	15.945,03
	PINTURA:		-	-	18.973,06	18.973,06
	COMBATE A INCENDIO:		-	-	5.099,72	5.099,72
	DIVERSOS:		-	-	4.889,75	4.889,75
TOTAL			126.278,74	161.138,55	28.962,53	316.379,82

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 1	ATIVIDADES	PRODUTOS	INDICADOR FÍSICO		VALORES (R\$)			Total
			UNID.	QUANT.	%	SEDOF	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES:				3,156	9.983,89	1,129	3.572,77	13.556,66
ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				2,979	9.426,06	1.066	3.373,14	12.799,20
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:				4,220	13.350,82	1.510	4.777,64	18.128,46
MOVIMENTO DE TERRA:				1,916	6.062,26	0,686	2.169,40	8.231,66
FUNDAÇÃO:				5,254	16.622,54	1,880	5.948,43	22.570,97
BALDRAME:				0,734	2.322,42	0,263	831,08	3.153,50
ESTRUTURA:				10,002	31.645,75	3,579	11.324,54	42.970,29
PAREDES E PAINÉIS:				5,876	18.591,75	2,103	6.653,12	25.244,87
REVESTIMENTO:				10,583	33.483,12	3,787	11.982,04	45.465,16
INSTALAÇÕES ELÉTRICA:				3,298	10.435,05	1,180	3.734,22	14.169,27
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA:				5,083	16.080,88	1,819	5.754,59	21.835,47
NECESSÁRIA:				9,286	29.378,98	3,323	10.513,37	39.892,35
PAVIMENTAÇÃO:				0,804	2.544,02	0,288	910,38	3.454,40
FORRO:				3,712	11.742,82	1,328	4.202,21	15.945,03
ESQUADRIAS:				4,416	13.972,83	1,580	5.000,23	18.973,06
PINTURA:				1,187	3.755,72	0,425	1.344,00	5.099,72
COMBATE A INCENDIO:				1,138	3.601,09	0,407	1.288,66	4.889,75
DIVERSOS:								
TOTAL				73,646	233.000,00	26,354	83.379,82	316.379,82

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
[Signature]
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
CREA-PA 45604296-4

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA



2. Proponente (ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE ITAITUBA)

PRODUTOS	DURAÇÃO			
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES:	3.572,77	-	-	3.572,77
ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	3.373,14			3.373,14
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:	4.777,64	-	-	4.777,64
MOVIMENTO DE TERRA:	2.169,40	-	-	2.169,40
FUNDAÇÃO:	2.974,22	2.974,22	-	5.948,43
BALDRAME:	415,54	415,54	-	831,08
ESTRUTURA:	5.662,27	5.662,27	-	11.324,54
PAREDES E PAINÉIS:	1.995,94	4.657,18	-	6.653,12
REVESTIMENTO:	3.594,61	8.387,43	-	11.982,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICA:	1.867,11	1.867,11	-	3.734,22
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA:	2.877,30	2.877,30	-	5.754,59
PAVIMENTAÇÃO:	-	10.513,37	-	10.513,37
FORRO:	-	910,38	-	910,38
ESQUADRIAS:	-	4.202,21	-	4.202,21
PINTURA:	-	-	5.000,23	5.000,23
DIVERSOS:	-	-	1.344,00	1.344,00
TOTAL	33.279,93	42.467,00	7.632,88	83.379,82

Itaituba - Pa, 01 de Fevereiro de 2.018

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil

CREA - PA 151604296-4

LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
