



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BIJATPU.**

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATO:

EMPREENDIMENTO: PROJETO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BIJATPU.

PROGRAMA:

MODALIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO

GESTOR:

Cálculo do BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

DEMONSTRATIVO BDI

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		G	0,40%
TAXA DE SEGURO		S	0,40%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
Sub-Total			6,07%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,40%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		5,00%
	CPRB (INSS)		3,60%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO		I	12,25%
BDI RESULTANTE			31,42%

LIMITE RECOMENDADOS	
INFERIOR	SUPERIOR
3,00%	5,50%
0,40%	0,50%
0,40%	0,50%
0,97%	1,27%

0,59%	1,39%
6,16%	8,96%
VARIÁVEL	
20,34%	25,00%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = ((1+ AC+ S+ R+ G)(1+ DF)(1+ L)/(1-D))-1$$

Itaituba - Pa, 27 de maio de 2025

Victor
Freire

Assinado digitalmente por Victor Freire
Id: C=BR, O=CREA-PA 15186789-8, CN=Victor Freire, E=ang.vfreire@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.27 16:44:25-0300'
Post: PDF Reader Versão: 1.2.1.1

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

BDI: 31,42%

DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BIJATPU

TABELA

VALOR DA
OBRA:

R\$ 1.440.303,93

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS,
ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ

SINAPI/PA - 04/2025
SEDOPI/PA - 02/2025
ORSE 02/2025 - SERGIPE
SEINFRA - 028 - CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS

Código	Descrição	Desonerado Horista	Desonerado Mensalista
Grupo A		21,80%	21,80%
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B		50,98%	19,22%
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13%	0,00%
B2	Feridos	4,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,22%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,83%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,82%	9,53%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Grupo C		11,17%	8,29%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,77%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,36%
Grupo D		11,05%	4,14%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,55%	3,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%
Total(A+B+C+D)		95,00%	53,45%

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉCN. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA



DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025

R\$ 1.440.303,93

SEINFRA - 028 - CEARA

Total sem BDI	1.096.023,31
Total do BDI	344.280,62
Total Geral	1.440.303,93

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. T C. PELA FISCALIZA O



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RUA BLATPU

BOI: 31,42%

DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2023

TABELA

SINAPIPA - 04/2023

SEDOPIPA - 02/2023

ORSE 02/2023 - SERGIPE

SEINFRA - 02/8 - CEARÁ

VALOR DA

OBRA:

R\$ 1.440.353,93

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA/PA

CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário			Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
M061100 SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	H	5.866,008379	19,46			114.133,07		7,92%	114.133,07	7,92%
EC373700 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Outros	H	16.433,1821785	6,88			113.060,36		7,85%	227.193,43	15,77%
M0475000 SEDOP	PECUREIRO	Mão de Obra	H	3.866,009610	26,88			103.819,72		7,22%	331.113,15	22,99%
D00490 SEDOP	Telha termocústica - chapa chapa	Material	m²	300,3000000	220,82			77.373,12		5,37%	408.486,27	28,36%
J00003 SEDOP	Cimento	Material	SC	988,878640	72,38			71.454,53		4,96%	478.940,80	33,32%
D00414 SEDOP	Perfil aço estrutural em "U"	Material	KG	4.793,6795000	11,32			54.263,27		3,77%	534.204,08	37,09%
D00038 SEDOP	Tijolo de barro 14x18x6	Material	UN	43.305,1800000	1,11			48.068,75		3,34%	582.272,83	40,43%
00040918 SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	8,0894200	7.281,61			44.295,47		3,07%	626.538,30	43,50%
M0611000 SEDOP	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1.470,1438468	26,59			39.651,87		2,75%	666.190,18	46,25%
D00425 SEDOP	Aço CA 5080 - Perfil médio	Material	KG	3.116,6750000	10,96			34.157,66		2,37%	700.347,82	48,63%
EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CADA)	Material	H	16.433,1821786	1,87			30.730,07		2,13%	731.077,89	50,76%
J00005 SEDOP	Areia	Material	m³	185,0056890	167,70			26.317,33		2,04%	760.395,22	52,70%
M0478000 SEDOP	PINTOR	Mão de Obra	H	1.022,0001344	20,88			27.471,35		1,91%	787.866,58	54,70%
M0121400 SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	807,4974542	26,88			26.811,93		1,96%	814.678,51	56,66%
D00418 SEDOP	Acessórios de fixação (telha termocústica)	Material	CJ	350,3800000	66,95			24.158,38		1,68%	838.837,89	58,34%
J00007 SEDOP	Servo travado	Material	m³	70,2340712	302,28			23.040,29		1,86%	862.767,19	59,80%
M0252000 SEDOP	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1.155,1375828	10,46			22.478,98		1,56%	885.266,17	61,49%
U00003 SEDOP	Grasse em placa	Material	m²	1.167,7785000	19,05			22.246,16		1,54%	907.512,35	63,01%
EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CADA)	Material	H	16.433,1821786	1,31			21.527,48		1,46%	929.039,83	64,50%
M0912700 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	1.075,2004059	19,46			20.925,15		1,45%	949.984,98	65,95%
D00030 SEDOP	Chapa de madeira compensada retardada 15mm	Material	m²	215,3089000	74,67			16.077,11		1,12%	966.062,09	67,07%
2894 ORSE	Cabo de cobre nu 50 mm² - 1/0 AWG	Material	kg	83,7600000	180,34			14.183,92		0,95%	980.246,01	68,08%
EC434890 SEDOP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	8.002,1703170	1,72			13.763,73		0,96%	993.989,74	69,01%
P00050 SEDOP	Lafix acrílica acústica	Material	QL	66,6544000	180,48			12.754,14		0,88%	1.006.743,88	69,89%
D00482 SEDOP	Soldo tipo descendente chanfrado chapafperfurado aço convensor diesel	Material	M	45,8531000	254,87			11.826,47		0,81%	1.018.570,35	70,71%
I00013 SEDOP	Manta sintética 585-3mm c/ filme de polietileno	Material	m²	200,2850000	57,25			11.587,04		0,80%	1.029.937,40	71,51%
D00021 SEDOP	Régua 3"x7/8" 4 m apo.	Material	Dz	30,7684000	364,41			11.208,67		0,78%	1.041.146,08	72,29%
00036325 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	274,1306640	49,63			10.868,14		0,76%	1.052.135,20	73,05%
D00170 SEDOP	Ponto de solda	Material	UN	1.172,2000000	8,86			10.502,81		0,73%	1.062.638,12	73,78%
EC434610 SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	5.737,0721292	1,82			10.441,47		0,72%	1.073.079,59	74,50%
00012597 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	8,0000000	1.287,39			10.138,86		0,70%	1.083.218,47	75,21%
J00008 SEDOP	Terra preta vegetal	Material	m³	58,6083000	177,41			8.865,30		0,68%	1.092.083,87	75,88%
A00055 SEDOP	Lajota cerâmica - (Pedro Médio)	Material	m²	196,1650000	52,43			9.780,63		0,66%	1.102.844,80	76,57%
D00012 SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" ext.	Material	Dz	29,5389892	328,55			9.705,03		0,67%	1.112.549,83	77,24%
00034364 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L) 4 FLG, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATE-VENTO QUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAO ALIZAR	Material	UN	14,0696000	645,36			9.080,96		0,63%	1.121.630,58	77,87%
D00281 SEDOP	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	32,6655484	262,84			8.585,84		0,60%	1.130.216,43	78,47%
EC434650 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	5.002,1709170	1,62			8.182,21		0,57%	1.138.378,64	79,04%
P00022 SEDOP	Mosses sintéticos	Material	QL	101,1623000	78,09			7.898,96		0,53%	1.146.277,61	79,57%
D00254 SEDOP	Cartolina em feltro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	Material	M	87,9150000	86,24			7.590,58		0,53%	1.153.868,19	80,10%
D00018 SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	48,4597044	149,03			7.221,95		0,50%	1.161.090,14	80,60%
00035427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DE WALL, E = 0,5 MM, 1/4" X 1/8" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	767,1451600	9,27			7.073,08		0,49%	1.167.963,21	81,09%
M0445030 SEDOP	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	335,4193503	20,18			6.788,76		0,47%	1.174.731,96	81,56%
00000892 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 CU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	814,3028800	8,00			6.514,42		0,45%	1.181.246,40	82,01%
D00087 SEDOP	Portão de ferro em metal (no. p/rlant.co)	Material	m²	16,3000000	381,53			6.253,28		0,43%	1.187.499,68	82,45%
M0378000 SEDOP	ARMADOR	Mão de Obra	H	228,4025860	29,88			6.166,34		0,43%	1.193.666,02	82,88%
M0611700 SEDOP	CARPINTEIRO AJUDAR	Mão de Obra	H	312,2168987	19,46			6.075,74		0,42%	1.199.741,76	83,30%
D00034 SEDOP	Esquadria de madeira maciça	Material	m³	15,5400000	345,65			5.371,56		0,37%	1.205.113,31	83,67%
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	774,8979050	8,88			5.329,92		0,37%	1.210.443,24	84,04%
00043447 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	887,15			5.322,90		0,37%	1.215.766,14	84,41%
D00387 SEDOP	Terra do PNB (B)	Material	UN	1,0000000	5.180,84			5.180,84		0,38%	1.220.955,96	84,77%
00000891 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 CU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	973,9705400	9,57			5.146,52		0,35%	1.226.102,49	85,13%
E00537 SEDOP	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	Material	un	20,0000000	248,57			4.931,40		0,34%	1.231.033,89	85,47%
A00041 SEDOP	Armário em MDF c/ gavetas, prateleiras e portas	Material	m²	2.250,00000	2.122,19			4.774,93		0,33%	1.235.808,82	85,80%
A00056 SEDOP	Revestimento Cerâmico Pedra Médio	Material	m²	82,6575000	51,12			4.231,54		0,33%	1.240.040,35	86,13%
EC434670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	6.737,0721202	0,80			4.580,66		0,32%	1.244.620,92	86,45%
00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	181,0583639	24,03			4.350,78		0,30%	1.249.480,80	86,75%
E00771 SEDOP	Ventilador de teto	Material	UN	11,0000000	392,84			4.322,34		0,30%	1.253.803,14	87,05%
D00255 SEDOP	Tela aluminada prate galvanizada 120 # 2"	Material	m²	58,9100000	70,30			4.120,28		0,28%	1.257.923,42	87,34%
I0005 SINAPI	PORTÃO DE ALUMINIO ANOZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI DOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	Material	m²	6,3000000	637,46			4.016,00		0,28%	1.261.939,42	87,62%
00002705 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	24,3542400	150,29			3.660,20		0,25%	1.265.599,62	87,87%
P00019 SEDOP	Tinta esmalte	Material	QL	16,3894000	191,74			3.142,31		0,22%	1.268.741,83	88,09%
00002685 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	130,1978220	24,03			3.128,65		0,22%	1.271.870,58	88,31%
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	198,1498905	15,31			3.042,20		0,21%	1.274.912,79	88,52%
J00001 SEDOP	Assento sanitário	Material	m²	22,9250000	131,42			3.012,80		0,21%	1.277.925,58	88,73%



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				BOI: 31,42%		TABELA		DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BUATUPU				SINAPPA - 04/2025		SEDOPIPA - 02/2025		ORSE 02/2025 - SERGIPE	
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SILEY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ				SEINFRA - 028 - CEARÁ		VALOR DA OBRA:		R\$ 1.440.303,93	
CURVA ABC DE INSUMOS									
D00986 SEDOP	Prego 2 1/2"x12	Material	KG	118,6100000	24,64	2.847,34	2.847,34	0,20%	1.280.872,83
I00011 SEDOP	Primer asfáltico	Material	L	106,6240000	27,37	2.923,77	2.923,77	0,20%	1.283.766,70
I02929 SEINFRA	CUMEIRA TERMOACUSTICA	Material	UN	24,0315000	116,55	2.890,83	2.890,83	0,20%	1.286.677,54
D00354 SEDOP	Grade de ferro em Metalum (incl. Pint.Latex-corrosiva)	Material	M²	8,9130000	316,52	2.820,19	2.820,19	0,20%	1.289.497,73
D00117 SEDOP	Mastro 5 m go. h = 6m	Material	UN	3,0000000	908,40	2.725,20	2.725,20	0,19%	1.292.222,83
EC434660 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.006,4009200	2,69	2.707,22	2.707,22	0,19%	1.294.930,15
D0044697 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	131,2895227	20,31	2.686,00	2.686,00	0,19%	1.297.596,15
M0243600 SEDOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	97,7887200	26,88	2.628,56	2.628,56	0,18%	1.300.224,71
H00391 SEDOP	Bacia sanitária p/PCD	Material	UN	2,0000000	1.304,34	2.608,68	2.608,68	0,18%	1.302.833,36
EC434830 SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.380,8678624	1,87	2.582,22	2.582,22	0,18%	1.305.415,61
D00337 SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragem - <sem.mola>	Material	m²	3,8400000	669,08	2.565,43	2.565,43	0,18%	1.307.981,04
P00228 SEDOP	Líquido selador acrílico	Material	GL	41,8480000	59,86	2.504,83	2.504,83	0,17%	1.310.485,97
M0128690 SEDOP	TELHADISTA	Mão de Obra	H	92,2770030	29,89	2.480,41	2.480,41	0,17%	1.312.969,38
EC434800 SEDOP	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.000,4009200	2,43	2.445,56	2.445,56	0,17%	1.315.411,93
I00004 SEDOP	Impermeabilizante asfáltico disperso em água	Material	L	71,2160000	34,11	2.429,18	2.429,18	0,17%	1.317.841,11
E00728 SEDOP	Tubo de cobre de 5/8"	Material	M	48,0000000	49,86	2.398,08	2.398,08	0,17%	1.320.239,19
I10058 ORSE	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	Material	m	148,3200000	16,16	2.348,37	2.348,37	0,16%	1.322.587,56
00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	319,3300000	7,33	2.340,69	2.340,69	0,16%	1.324.926,25
D00096 SEDOP	Candeeiro em madeira de lei	Material	m²	9,3240000	239,65	2.205,59	2.205,59	0,15%	1.327.133,84
I0246 SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	Material	UN	7,0000000	315,81	2.205,07	2.205,07	0,15%	1.329.338,91
D00080 SEDOP	Argamassa AC-II	Material	KG	1.238,1000000	1,77	2.193,21	2.193,21	0,15%	1.331.532,12
00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MEG	6,0000000	365,50	2.133,00	2.133,00	0,15%	1.333.665,12
00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	5,2871300	373,18	1.973,05	1.973,05	0,14%	1.335.638,17
L00011 SEDOP	Switch 24 portas	Material	un	1,0000000	1.944,42	1.944,42	1.944,42	0,14%	1.337.582,59
6827 ORSE	Fundo de aço galvanizado cilíndrico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura (clí 5m)total 6m). Compost ref. Sema 000533base 50da Compost ou similar	Material	un	1,0000000	1.931,87	1.931,87	1.931,87	0,13%	1.339.514,46
D00087 SEDOP	Alizar em madeira de lei	Material	M	83,2400000	20,48	1.909,56	1.909,56	0,13%	1.341.424,02
00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MEG	6,0000000	318,02	1.908,12	1.908,12	0,13%	1.343.332,14
D00142 SEDOP	Placa de inauguração em aço inoxidável br. relevo - (40 x 30cm)	Material	UN	1,0000000	1.839,88	1.839,88	1.839,88	0,12%	1.345.172,02
D00348 SEDOP	Ativador plastificante	Material	L	87,3640740	26,18	1.761,31	1.761,31	0,12%	1.346.933,32
00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FODAR PEÇA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	86,0000000	28,32	1.737,12	1.737,12	0,12%	1.348.670,44
D00343 SEDOP	Taxa de Invalidez	Material	UN	1,0000000	1.736,25	1.736,25	1.736,25	0,12%	1.350.406,68
EC372739 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	H	16.433,1921785	0,10	1.643,32	1.643,32	0,11%	1.352.050,01
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1.064,6908949	1,52	1.618,31	1.618,31	0,11%	1.353.668,33
00003362 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	518,3887100	3,08	1.596,64	1.596,64	0,11%	1.355.264,97
M0247000 SEDOP	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	81,7850400	19,48	1.591,54	1.591,54	0,11%	1.356.859,50
E00727 SEDOP	Tubo de cobre de 3/8"	Material	M	48,0000000	32,86	1.577,28	1.577,28	0,11%	1.358.433,78
00000896 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BVF-3, COBERTURA PVC-STI (ANTICHAMA BVF-3, 1 CONDUTOR, 6,0/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM²	Material	M	97,6400650	23,24	1.571,98	1.571,98	0,11%	1.360.005,78
D00389 SEDOP	Taxa do CREA (R)	Material	UN	1,0000000	1.509,77	1.509,77	1.509,77	0,10%	1.361.515,53
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	788,6979056	1,87	1.493,57	1.493,57	0,10%	1.363.009,08
D00082 SEDOP	Prego 2"x11	Material	KG	54,6133880	26,75	1.460,81	1.460,81	0,10%	1.364.470,00
H00393 SEDOP	Lavatório PCD w/ coluna	Material	UN	2,0000000	717,31	1.434,82	1.434,82	0,10%	1.365.904,62
I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	58,2198017	24,28	1.393,68	1.393,68	0,09%	1.367.298,40
D00043 SEDOP	Arame recoberto No. 18	Material	KG	75,8230584	17,72	1.343,58	1.343,58	0,09%	1.368.612,07
CRSE	Eletrodos (horista)	Mão de Obra	H	52,4592000	24,96	1.310,98	1.310,98	0,09%	1.369.923,03
00002435/5	TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	56,7822790	21,89	1.292,84	1.292,84	0,09%	1.371.215,87
00006874 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	86,7238673	18,31	1.276,03	1.276,03	0,09%	1.372.492,45
00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RANOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	20,0000000	63,37	1.267,40	1.267,40	0,09%	1.373.759,88
H00032 SEDOP	Eixo metálico de 1 1/2"	Material	UN	2,0000000	622,86	1.245,72	1.245,72	0,09%	1.375.005,81
CRSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	62,7014400	19,18	1.201,36	1.201,36	0,08%	1.376.206,97
00008111/5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000	296,40	1.185,60	1.185,60	0,08%	1.377.392,57
M0375680 SEDOP	OPERADOR DE SETONEIRA MISTURADOR	Mão de Obra	H	43,5829083	26,88	1.171,78	1.171,78	0,08%	1.378.564,35
00036207 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000	568,52	1.137,04	1.137,04	0,08%	1.379.701,38
E00127 SEDOP	Centro de distribuição p/ 32 diá. c/ barramento	Material	UN	1,0000000	1.132,02	1.132,02	1.132,02	0,08%	1.380.833,41
8430 ORSE	Suporte em ferro galv. para descida do cabo fio reforçado com chapa de enrolado em 90°	Material	un	20,0000000	56,37	1.127,40	1.127,40	0,08%	1.381.960,81
D00291 SEDOP	Vidro temperado 6mm x 6mm	Material	m²	1,8000000	694,04	1.110,46	1.110,46	0,08%	1.383.071,27
0000189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 72,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,9903298	32,52	1.107,32	1.107,32	0,08%	1.384.178,58
2062 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox 1/4"x0,1" - Jackbol ou similar	Material	un	8,0000000	137,85	1.102,80	1.102,80	0,08%	1.385.281,36
00039377 SINAPI	CAIXA DE COORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SADA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO	Material	UN	2,0000000	550,30	1.100,60	1.100,60	0,08%	1.386.381,99
E00299 SEDOP	Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA	Material	UN	1,0000000	1.085,07	1.085,07	1.085,07	0,08%	1.387.477,06
00032220 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000	255,02	1.020,08	1.020,08	0,07%	1.388.497,14
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	774,6079050	1,31	1.014,85	1.014,85	0,07%	1.389.512,00
00039191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	46,0000000	21,98	1.011,08	1.011,08	0,07%	1.390.523,08
H00041 SEDOP	Tanque de loca	Material	UN	1,0000000	1.002,97	1.002,97	1.002,97	0,07%	1.391.526,05
P00007 SEDOP	Lixa para parede	Material	UN	601,8650000	1,44	862,80	862,80	0,07%	1.392.478,84
00038430 SINAPI	PENDURAL OU PRELIMINAR REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLE E REBITO, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS ORYVALL	Material	UN	268,3108760	3,46	917,87	917,87	0,06%	1.393.396,82
00039590 SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	68,7750000	12,61	867,25	867,25	0,06%	1.394.264,07



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA		RDI: 31,42%		DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BUATUPU		TABELA		VALOR DA OBRA:	
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES BILLY COM AVENIDA TRANSMAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ		SINAPIPA - 04/02/25 SEDOPPA - 02/02/25 ORSE 02/02/25 - BERGEIPE SEINFRA - 028 - CEARÁ		R\$ 1.440.303,93	
CURVA ABC DE INSUMOS					
600726 SEDOP	Cabo "PP" 4x2,5mm	Material	M	48,0000000	18,05
D00015 SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	2,8000000	302,28
0004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,9571119	24,03
00038536 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5988)	Material	M	32,6702530	24,64
00000157 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECÇÃO EM TRINÇAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	Material	KG	3,4200000	231,15
D00419 SEDOP	Editor de modelo ABC - 08kg	Material	UN	3,0000000	262,84
EC434590 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.380.897924	0,57
H00392 SEDOP	Assento sanitário p/ PCO	Material	UN	2,0000000	392,94
D00467 SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	Material	UN	14,0000000	53,96
L00004 SEDOP	Rack de 16" 05 UTA	Material	un	1,0000000	735,22
00006111 SINAPI	SERVEITE DE OBRAS	Mão de Obra	H	40,9142271	17,57
D00321 SEDOP	Ligação provisória - água/egoto	Material	UN	1,0000000	695,15
00034536 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	671,55
D00078 SEDOP	Junta (p/ cerâmica)	Material	KG	69,5615000	7,34
0002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUBA	Material	M	78,7258700	8,14
00001358 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2300 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	8,8844700	68,73
D00475 SEDOP	Luna com proteção de gráfica	Material	m²	6,1600000	96,56
K0001 SEDOP	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto	Material	L	29,0107200	19,97
17893 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	Material	m²	1,2500000	450,21
H00009 SEDOP	Tubo em PVC - JG - 25mm (LH)	Material	M	48,0000000	11,64
00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	334,7144800	1,65
D00330 SEDOP	Gás butano	Material	kg	46,2004000	11,61
00040352 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CASECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	2,2670080	73,85
00033961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	15,2071064	35,19
M0259500 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	19,5071460	20,88
00043550 SINAPI	ACO CA-90, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERSALHAO	Material	KG	45,9471452	11,28
00036331 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LEVADA 88 HP, PISO OPERACIONAL LIMPO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADERA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0007695	867.517,38
12381 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	15,8424000	31,75
0004721 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 18 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,5153659	323,22
ORSE	Eléctrolito de pvc rígido roscaavel de 1", sem lúva	Material	m	47,2500000	10,25
000228850	MONITADOR DE MAQUINAS	Mão de Obra	H	20,6480000	22,56
M0444970 SEDOP	MONITADOR	Mão de Obra	H	18,7117952	20,88
00008859 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	30,4821650	14,00
H00051 SEDOP	Ducha higiênica cromada	Material	UN	2,0000000	213,11
D00019 SEDOP	Regua 2"x1" 4 m apar.	Material	Dz	1,0000000	423,17
ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	H	16,8458000	24,68
000475005	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	10,4615210	30,70
00000673 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETIRADO NA JARDIM, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	2,5619738	157,70
00038773 SINAPI	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	46,0000000	8,62
00038738 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5988)	Material	M	22,1845470	17,78
00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	334,7144800	1,13
00008875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	15,5586260	24,12
M0446000 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	18,8496500	19,48
00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERSALHAO	Material	KG	28,7623200	12,62
H00373 SEDOP	Tubo de polietileno 3/8"	Material	M	66,0000000	3,57
D00040 SEDOP	Tela fibrotex (1,22x0,55m) e=4mm	Material	UN	18,4000000	20,37
D00332 SEDOP	Ligação provisória - luz	Material	UN	1,0000000	329,29
M0444990 SEDOP	AJUDANTE DE MONITADOR	Mão de Obra	H	18,7117952	19,46
00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	8,0023600	-40,13
EC434840 SEDOP	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	192,8000000	1,65
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	31,0000000	10,22
00000005 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLIS, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	4,0000000	78,12
00001747 SINAPI	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	301,75
00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	198,3889640	1,48
H00374 SEDOP	Tubo de polietileno 5/8"	Material	M	48,0000000	9,95
P00008 SEDOP	Líquido selador p/ parede	Material	GL	5,1200000	31,19
P00027 SEDOP	Agua sanit.	Material	GL	3,3371000	84,80
10805 SEINFRA	CEMENTO PORTLAND	Material	KG	204,4336000	0,93
11052 ORSE	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm	Material	un	15,0000000	17,85
H00059 SEDOP	Torneira metálica p/ lavatório de 1/2"	Material	UN	2,0000000	131,32
2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	331,8400000	0,78
158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	14,9170249	18,28
D00081 SEDOP	Preço 2 1/2"x10	Material	KG	10,4658900	24,54
00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	13,0000000	19,25
H00438 SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	Material	UN	2,0000000	123,50
00038043 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 P08, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	5,0000000	48,77
00008898 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	35,2878500	6,49



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				BDI: 31,42%		TABELA		DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/09/2025	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IRON BUATUPU				SINAPIPA - 04/2025 SEDOPPA - 02/2025 ORSE 02/2025 - BERGEPE SEINFRA - 028 - CEARÁ		VALOR DA OBRA:		R\$ 1.440.303,93	
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SIBLY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ									
CURVA ABC DE INSUMOS									
00006138 SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	Material	UN	1,0000000	227,87	227,87	227,87	0,02%	1.426.301,45
00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA	Mão de Obra	H	8,3887280	28,62	233,25	233,25	0,02%	1.426.524,71
EC434600 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	192,8000000	1,13	217,66	217,66	0,02%	1.426.742,57
00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,9520000	107,10	209,06	209,06	0,01%	1.426.851,83
H00028 SEDOP	Veh. p/ lavat. d = 1" - cromada	Material	UN	2,0000000	90,35	198,70	198,70	0,01%	1.427.150,33
00011712 SINAPI	CAIXA SFONADA PVC, 150 X 150 X 60 MM, COM GRELHA QUADRA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	85,18	195,54	195,54	0,01%	1.427.345,87
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	22,1806712	8,79	193,46	193,46	0,01%	1.427.536,33
00011576 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	3,0000000	64,01	182,03	182,03	0,01%	1.427.731,36
00038985 SINAPI	POLISTIRENO EXPANDIDOREP6 (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,3252151	578,14	188,02	188,02	0,01%	1.427.819,38
00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	48,0000000	3,90	187,20	187,20	0,01%	1.428.106,58
H00019 SEDOP	Torneira longa metalica de 3/4"	Material	UN	2,0000000	83,33	180,66	180,66	0,01%	1.428.263,24
00038443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (L8), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	478,7141520	0,38	181,91	181,91	0,01%	1.428.475,15
H00013 SEDOP	Torneira para jardim cromada de 1/2"	Material	UN	2,0000000	90,77	181,54	181,54	0,01%	1.428.656,90
ORSE	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	183,2493400	0,96	181,42	181,42	0,01%	1.428.838,11
000013798 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000	45,24	180,96	180,96	0,01%	1.429.019,07
00004517 SINAPI	SARFAO "2,5 X 7,5" CM EM PNUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,5798856	4,45	180,58	180,58	0,01%	1.429.199,05
E00081 SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN	Material	UN	4,0000000	44,26	177,04	177,04	0,01%	1.429.376,69
00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	2,0000000	87,47	174,94	174,94	0,01%	1.429.561,83
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	146,0038058	1,16	169,38	169,38	0,01%	1.429.720,89
00012532 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,90 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	164,18	164,18	164,18	0,01%	1.429.885,17
00038084 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	43,0000000	3,81	163,83	163,83	0,01%	1.430.048,00
00000578 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,7762888	24,03	162,83	162,83	0,01%	1.430.211,83
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	16,0000000	8,99	161,84	161,84	0,01%	1.430.374,47
E00052 SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN	Material	UN	14,0000000	11,48	160,72	160,72	0,01%	1.430.534,18
D00174 SEDOP	Corrente p/ balancim	Material	un	4,0000000	40,05	160,20	160,20	0,01%	1.430.694,39
D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	6,3862200	24,47	156,27	156,27	0,01%	1.430.850,66
00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	2,0000000	77,97	155,94	155,94	0,01%	1.431.006,60
10492 ORSE	Caixa Básica	Material	un	0,8196627	249,69	154,72	154,72	0,01%	1.431.161,33
M00008 SEDOP	Betonaria elastica - 320	Equipamento	H	43,2108208	3,57	154,28	154,28	0,01%	1.431.315,61
00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,7520368	22,81	152,66	152,66	0,01%	1.431.468,27
D00168 SEDOP	Gonzo p/ balancim em madeira	Material	PAR	4,0000000	39,05	152,20	152,20	0,01%	1.431.620,47
00011756 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	2,0000000	74,88	148,78	148,78	0,01%	1.431.770,25
D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0,3439000	23,30	147,81	147,81	0,01%	1.431.918,07
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1328845	24,03	147,37	147,37	0,01%	1.432.065,44
00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BTOLA 3/4" (REF 1419)	Material	UN	2,0000000	73,68	147,36	147,36	0,01%	1.432.212,80
00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	22,0000000	6,43	141,46	141,46	0,01%	1.432.354,28
H00043 SEDOP	Chuveiro em PVC	Material	UN	2,0000000	69,52	138,04	138,04	0,01%	1.432.483,30
H00439 SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	Material	UN	1,0000000	134,86	134,86	134,86	0,01%	1.432.628,16
00024823 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINMIC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	2,0000000	85,74	131,48	131,48	0,01%	1.432.759,84
00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	13,0225000	9,55	130,38	130,38	0,01%	1.432.890,02
D00002 SEDOP	Dobradça 3/2" com parafuso	Material	UN	5,8000000	33,88	128,74	128,74	0,01%	1.433.018,77
00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	1,3429000	94,54	126,93	126,93	0,01%	1.433.145,70
H00014 SEDOP	Torneira de tanque pia cromada de 1/2"	Material	UN	1,0000000	124,27	124,27	124,27	0,01%	1.433.269,97
H00042 SEDOP	Parafuso niquelado para locais sanitas	Material	UN	10,0000000	12,35	123,50	123,50	0,01%	1.433.393,47
E00042 SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750V	Material	M	8,0000000	13,60	122,40	122,40	0,01%	1.433.515,87
00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	6,0000000	20,31	121,86	121,86	0,01%	1.433.637,73
00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	6,0000000	20,31	121,86	121,86	0,01%	1.433.759,58
00008935 SINAPI	TUBO PVC - SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	11,2978780	10,76	121,57	121,57	0,01%	1.433.881,15
00011678 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	121,06	121,06	121,06	0,01%	1.434.002,21
00027399 SINAPI	CABIDEQUINHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Material	UN	2,0000000	57,81	115,82	115,82	0,01%	1.434.118,03
10070 SEINFRA	TELHACISTA	Mão de Obra	H	3,5264000	31,75	115,14	115,14	0,01%	1.434.233,17
00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,8802440	43,13	114,74	114,74	0,01%	1.434.347,91
ORSE	Carpinteiro de formas (horista)	Mão de Obra	h	4,5289000	24,99	113,17	113,17	0,01%	1.434.461,08
000012135 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	31,73	111,06	111,06	0,01%	1.434.572,14
D00427 SEDOP	Desumidante	Material	L	6,8352000	15,21	103,96	103,96	0,01%	1.434.676,10
00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 1 1/2", MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	384,5498827	0,28	102,07	102,07	0,01%	1.434.778,17
00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	28,0000000	3,64	101,92	101,92	0,01%	1.434.880,06
10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	14,0179249	6,57	92,10	92,10	0,01%	1.434.972,18
ORSE	Arreia grossa - posto jardim/tenis (retirado na jardim,sem transporte)	Material	m³	6,6002750	133,12	91,89	91,89	0,01%	1.435.064,08
000003975 SINAPI	10047 SEINFRA	Mão de Obra	H	3,8284000	25,10	91,02	91,02	0,01%	1.435.155,10
E00083 SEDOP	Disjuntor 2P-40A a 50A	Material	UN	1,0000000	90,65	90,65	90,65	0,01%	1.435.245,75
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	3,9850482	24,52	89,87	89,87	0,01%	1.435.335,62
00037868 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	4,3574350	20,31	88,50	88,50	0,01%	1.435.424,12
EC434880 SEDOP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	70,2408208	1,16	88,44	88,44	0,01%	1.435.512,56
630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar	Material	m²	1,5134400	58,04	87,84	87,84	0,01%	1.435.600,40
00003969 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000	10,64	86,72	86,72	0,01%	1.435.687,12
00038089 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	43,0000000	1,97	84,71	84,71	0,01%	1.435.771,83
00000032 SINAPI	ACO CA-50, 8,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	6,7110400	12,98	84,29	84,29	0,01%	1.435.856,12



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				RDI: 31,42%		DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025				
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IKON BUATUPU				TABELA		VALOR DA OBRA:				
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SILEY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BARRIO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ				SINAPIPA - 04/2025 SEDOPIPA - 02/2025 ORSE 02/2025 - SERGIPE SEINFRA - 028 - CEARÁ		R\$ 1.440.303,93				
CURVA ABC DE INSUMOS										
00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	10,000000	8,37	83,70	0,01%	1.435.838,52	99,70%	
M00005 SEDOP	Compactor de solo CM-13	Equipamento	Hp	11,5680000	7,16	82,83	82,83	0,01%	1.436.022,65	99,70%
00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	2,1020000	39,01	82,02	82,02	0,01%	1.436.104,66	99,71%
P00015 SEDOP	Solvente	Material	OL	0,5341200	153,32	81,89	81,89	0,01%	1.436.186,56	99,71%
00001859 SINAPI	CURVA DE PVC 80 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000	20,38	81,56	81,56	0,01%	1.436.268,12	99,72%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	788,6978050	0,10	79,87	79,87	0,01%	1.436.347,99	99,73%
00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	26,44	79,32	79,32	0,01%	1.436.427,31	99,73%
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	198,3980400	0,40	78,66	78,66	0,01%	1.436.505,86	99,74%
805 ORSE	Curva 45 longa evc sanitario d= 100mm	Material	un	1,0000000	77,20	77,20	77,20	0,01%	1.436.583,06	99,74%
00001866 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	38,55	77,10	77,10	0,01%	1.436.660,16	99,75%
00043466 SINAPI	EPH - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	42,4900896	1,72	73,10	73,10	0,01%	1.436.733,26	99,75%
00043491 SINAPI	EPH - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	39,6731562	1,82	72,31	72,31	0,01%	1.436.805,47	99,76%
P00041 SEDOP	Rolo de espuma	Material	un	3,5600000	19,71	70,18	70,18	0,00%	1.436.875,65	99,76%
ORSE	Cal hidratada chi para argamassas	Material	kg	40,6800200	1,70	69,48	69,48	0,00%	1.436.945,13	99,77%
000011956	Targeta	Material	un	4,0000000	17,68	68,32	68,32	0,00%	1.437.013,45	99,77%
M00013 SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico de 2 cv	Equipamento	H	27,8600470	2,44	68,00	68,00	0,00%	1.437.081,45	99,78%
M0104830 SEDOP	MOLHACERO	Mão de Obra	h	2,4550728	26,88	65,99	65,99	0,00%	1.437.147,44	99,78%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	10,8051530	5,51	63,69	63,69	0,00%	1.437.211,30	99,78%
00010938 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	31,54	63,08	63,08	0,00%	1.437.274,38	99,79%
E00050 SEDOP	Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço	Material	un	1,0000000	61,50	61,50	61,50	0,00%	1.437.335,88	99,79%
00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 26 MM, COM CORPO OMIDIDO	Material	UN	2,0000000	30,14	60,28	60,28	0,00%	1.437.396,16	99,80%
00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	4,0000000	15,67	60,28	60,28	0,00%	1.437.456,44	99,80%
00003975 SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11,0000000	5,46	60,06	60,06	0,00%	1.437.516,50	99,81%
00008857 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5648)	Material	M	2,5730560	23,32	60,02	60,02	0,00%	1.437.576,53	99,81%
EC434850 SEDOP	EPH - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	37,8400000	1,48	55,71	55,71	0,00%	1.437.632,23	99,81%
00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	12,0000000	4,82	54,24	54,24	0,00%	1.437.686,47	99,82%
841 ORSE	Fartamento com mangue curta	Material	un	0,2005510	254,21	52,51	52,51	0,00%	1.437.738,98	99,82%
00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	4,0000000	13,08	52,32	52,32	0,00%	1.437.791,30	99,83%
00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBIA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	184,6900000	0,28	51,71	51,71	0,00%	1.437.843,01	99,83%
00042677 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPRENDIDA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	0,6029748	85,26	51,41	51,41	0,00%	1.437.894,42	99,83%
ORSE	Pedra britada n. 3 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2621500	161,89	51,35	51,35	0,00%	1.437.945,77	99,84%
0000471695	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7408898	16,31	50,19	50,19	0,00%	1.437.995,96	99,84%
00006117 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	12,41	48,84	48,84	0,00%	1.438.045,00	99,84%
00007143 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	48,38	48,38	48,38	0,00%	1.438.093,88	99,85%
00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	16,96	47,88	47,88	0,00%	1.438.141,36	99,85%
00001891 SINAPI	LUNA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	24,0000000	1,95	46,80	46,80	0,00%	1.438.188,86	99,85%
00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	43,36	43,36	43,36	0,00%	1.438.232,02	99,86%
00043495 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	42,4900898	1,02	43,35	43,35	0,00%	1.438.275,37	99,86%
H00025 SEDOP	Tubo de ligação em PVC cl sanpila (L8)	Material	UN	2,0000000	21,01	42,02	42,02	0,00%	1.438.317,39	99,86%
00003870 SINAPI	LUNA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	4,0000000	10,26	41,04	41,04	0,00%	1.438.358,43	99,86%
81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	3,4600000	11,85	41,00	41,00	0,00%	1.438.399,43	99,87%
D00081 SEDOP	Fechadura de subapre comum	Material	UN	4,0000000	101,46	40,58	40,58	0,00%	1.438.440,01	99,87%
00020085 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5648)	Material	M	0,8222810	64,40	40,08	40,08	0,00%	1.438.480,08	99,87%
00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	40,08	40,08	40,08	0,00%	1.438.520,17	99,88%
ORSE	Sarrafio 2,5 x 10" com pinus, mista ou equivalente da região - bruto	Material	m	5,4388000	7,24	36,78	36,78	0,00%	1.438.559,96	99,88%
0000450845	CURVA DE PVC 80 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	18,79	37,58	37,58	0,00%	1.438.597,53	99,88%
00043132 SINAPI	ARABE RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1,0735314	34,55	37,09	37,09	0,00%	1.438.634,87	99,88%
00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	13,6406018	2,62	35,74	35,74	0,00%	1.438.670,36	99,89%
00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,0000000	5,05	35,35	35,35	0,00%	1.438.705,71	99,89%
D00141 SEDOP	Lixa pl ferro	Material	UN	6,9130000	3,81	33,96	33,96	0,00%	1.438.736,57	99,89%
E00287 SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 1"	Material	M	3,0000000	11,18	33,84	33,84	0,00%	1.438.773,21	99,89%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	39,6731562	0,80	31,74	31,74	0,00%	1.438.804,84	99,90%
00028319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,08	30,16	30,16	0,00%	1.438.835,10	99,90%
00043483 SINAPI	EPH - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4177664	1,87	28,83	28,83	0,00%	1.438.863,84	99,90%
00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	2,0000000	14,41	28,82	28,82	0,00%	1.438.892,76	99,90%
00003535 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000	9,22	27,86	27,86	0,00%	1.438.920,42	99,90%
00011730 SINAPI	RALO BECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2,0000000	13,72	27,44	27,44	0,00%	1.438.947,96	99,91%
D00236 SEDOP	Linha de nylon no. 80	Material	RJ	1,6633000	19,95	26,33	26,33	0,00%	1.438.974,18	99,91%
H00023 SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	UN	2,0000000	12,39	24,72	24,72	0,00%	1.438.998,90	99,91%
00043486 SINAPI	EPH - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	24,0000000	1,01	24,24	24,24	0,00%	1.439.023,14	99,91%
00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	1,8670824	12,73	23,78	23,78	0,00%	1.439.046,92	99,91%
00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,9798658	23,39	22,92	22,92	0,00%	1.439.069,84	99,91%
00003888 SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	11,08	22,18	22,18	0,00%	1.439.092,02	99,92%
10517 ORSE	Exames admissionais/terminacionais (checkup)	Serviços	qj	0,0660788	384,26	21,73	21,72	0,00%	1.439.113,74	99,92%
ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 1 1/2)	Material	kg	0,9856000	23,72	21,01	21,01	0,00%	1.439.134,75	99,92%
000050876	MASSA PLASTICA PARA MARMORE GRANITO	Material	KG	0,3490000	56,74	20,32	20,32	0,00%	1.439.155,07	99,92%
00004823 SINAPI	LUXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	Material	UN	6,9169840	2,93	20,26	20,26	0,00%	1.439.175,33	99,92%



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA		BOI: 31,42%		DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (KON BUATU)		TABELA		VALOR DA OBRA:	
LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ		SINAPIPA - 04/2025 SEDOPPA - 02/2025 ORSE 02/2025 - BORGIFE SEINFRA - 028 - CEARÁ		R\$ 1.440.303,93	
CURVA ABC DE INSUMOS					
00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1038850	18,31
00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000	6,82
803 ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario di= 50mm	Material	un	1,0000000	19,30
000453 SEDOP	Caixa Coletora	Material	m²	0,1700000	109,07
000059 SEDOP	Cadeado No. 30	Material	UN	0,4000000	46,25
ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	24,89
000026905	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, (NSR 5648)	Material	UN	5,0000000	3,48
00003517 SINAPI	ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	kg	1,5400000	11,21
62 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 6,8 mm	Material	m²	0,0940500	181,03
0000472195	Pedra britada n. 1 (9,5 a 10 mm) posco pedreira/encanador,sem frete	Material	UN	8,0000000	1,87
00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, (NSR 5648)	Material	UN	2,0000000	8,30
00001933 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,91
00007129 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,41
00002045 SINAPI	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,41
00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	8,0000000	1,80
EC434610 SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	37,6400000	0,40
ORSE	Arame galvanizado 12 bvg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bvg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,4428000	33,21
0004313095	Bucha e arruela de 1"-alumínio	Material	UN	3,0000000	4,77
000063 SEDOP	Joelho/Conexão 90° em PVC - JS - 25mm-LH	Material	UN	6,0000000	1,74
00002060 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,4485000	30,85
00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,73
00002047 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 16 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,4664508	25,90
00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	11,0000000	1,13
00004756 SINAPI	MARMONISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4644464	25,12
H00040 SEDOP	Sites plastico de 2"	Material	UN	1,0000000	11,88
1569 ORSE	Madeira mista serrada (barras) 8 x 6cm - 0,0026 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,3719800	8,52
00043682 SINAPI	CHAFAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE E RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 MM	Material	m²	0,4470867	26,13
ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,4666000	24,89
0000037815	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,66
00003515 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0003600	32,075,37
00003509 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,49
00000819 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	11,40
0000275 SEDOP	Bucha (parafuso) (módulo)	Material	UN	6,0000000	5,70
00001184 SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,09
00000297 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NSR 5688)	Material	UN	2,0000000	10,68
10862 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,8196527	10,21
00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	KWH	6,3388919	1,49
0000344 SEDOP	Arruela concava em PVC dn50/60	Material	UN	10,0000000	9,10
ORSE	Bota de segurança com biqueiro de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,1044616	98,73
0001288315	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,4177684	0,57
H00039 SEDOP	Vale, p/ tanque d = 2" - plastico	Material	UN	1,0000000	8,01
00003507 SEDOP	Curva 90° pvc, P20 1" (B)	Material	UN	1,0000000	7,81
ORSE	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	7,81
0000713995	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,80
00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,78
00003522 SINAPI	LUNA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,82
00003803 SINAPI	Luna p/ elev. P20 de 1" (E)	Material	UN	1,0000000	5,97
EC0304 SEDOP	Protetor solar fts 30 com 120ml	Material	un	0,2478608	23,65
10586 ORSE	Área media - posto jazida/encanador (retrato na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,0443880	131,42
ORSE	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,80
0000037015	ALDRABA p/ cadeado (4x1/2")	Material	KG	0,2421702	23,83
00000298 SINAPI	Linha rasp de couro, cinto curto (punho 7" cm)	Material	UN	0,4000000	14,08
000007073 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	par	0,3167111	19,25
D00080 SEDOP	ANEL BORRACHA DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0011375	4.456,43
ORSE	FEIRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A1, FATOR DE FORMA 150° L/D, COMPRIMENTO DE 30" MM E RESISTÊNCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	Material	UN	1,0000000	4,77
0000713995	CARRI-GADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,2772000	17,08
ORSE	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO predial, dn 100 mm (nsr 5688)	Material	UN	0,0101008	431,08
0000030116	Protetor autcular	Material	un	1,0000000	4,21
10599 ORSE	Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas Valacton ou similar	Material	un	0,6196527	8,43
00001123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3578880	3,97
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,3554716	3,79
00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,78
1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Valacton ou similar	Material	kg	0,3640000	3,71
00778 SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CAJÁMINA E ESC, HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,3640000	3,71
ORSE	Arame recoado 16 bvg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0086022	3,50
0004313025	Fita de vedacao	Material	kg	0,1000000	3,33
H00055 SEDOP	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	M	8,3000000	3,15
1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,9330000	2,78



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ISON BUATUPU

BDI: 31,42%

DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025

LOCAL DA OBRA: RUA ANTÔNIO GOMES SILEY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARÁ

TABELA
SINAPPA - 04/2025
SEDOPPA - 02/2025
ORSE 02/2025 - SERGIPE
SEINFRA - 028 - CEARÁ

VALOR DA OBRA:

R\$ 1.440.303,93

CURVA ABC DE INSUMOS

2038 ORSE	Solução Impulsora pvc	Material	I	0,0280000	91,65	2,57	2,57	0,00%	1.438.860,94	99,97%
ORSE	Carinho de mão de aço capacidade 60 a 60 l, pneu com cantaria	Material	un	0,0125405	203,78	2,56	2,56	0,00%	1.438.862,50	99,97%
0000271155	ORSE	Bucha de redução de pvc, soldável, curta, com 40 x 32 mm, para água fria predial	Material	un	1,0000000	2,45	2,45	0,00%	1.438.865,94	99,97%
0000061256	ORSE	Anel borrachia para tubo vergalho predial, em 50 mm (nôr 5688)	Material	un	1,0000000	2,37	2,37	0,00%	1.438.867,41	99,97%
0000029956	ORSE	Alcates volt-ampímetro	Material	un	0,0104818	203,70	2,14	0,00%	1.438.869,55	99,97%
138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	95,16	1,81	1,81	0,00%	1.438.871,36	99,97%
80108 SENFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0100000	157,15	1,57	1,57	0,00%	1.438.872,93	99,97%
000001 SEDOP	Parafuso 1/2 po 5/16" em 110mm	Material	UN	0,8000000	1,94	1,55	1,55	0,00%	1.438.874,48	99,97%
ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0520208	18,27	1,49	1,49	0,00%	1.438.875,97	99,97%
00012885/5	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,48	1,48	0,00%	1.438.877,45	99,97%	
00000329 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	Equipamento	H	146,0038088	0,01	1,46	1,46	0,00%	1.438.878,91	99,97%
00043464 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0795000	18,48	1,31	1,31	0,00%	1.438.880,22	99,97%
1631 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,1097076	8,85	0,97	0,97	0,00%	1.438.881,19	99,97%
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001163	7.885,20	0,92	0,92	0,00%	1.438.882,11	99,97%
ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, comprimento "20" mm, para ferragens de lajes e fuso de vigas	Material	un	2,0000000	0,42	0,84	0,84	0,00%	1.438.882,95	99,97%
000393155 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	Material	H	70,2409208	0,01	0,70	0,70	0,00%	1.438.883,71	99,97%
11247 ORSE	Serra máquina	Material	un	0,0016845	430,79	0,73	0,73	0,00%	1.438.884,43	99,97%
00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0003427	2.046,72	0,70	0,70	0,00%	1.438.885,14	99,97%
11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0104818	82,67	0,88	0,88	0,00%	1.438.885,76	99,97%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,0796905	8,18	0,65	0,65	0,00%	1.438.886,44	99,97%
ORSE	Capa para chave em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0275405	23,48	0,65	0,65	0,00%	1.438.887,09	99,97%
000138945 SINAPI	Pá quadrada	Material	un	0,0125405	48,48	0,61	0,61	0,00%	1.438.887,70	99,97%
ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	I	0,0442800	12,11	0,54	0,54	0,00%	1.438.888,24	99,97%
000028025 ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 x 12,5" mm, comprimento 20 mm	Material	un	2,0000000	0,26	0,52	0,52	0,00%	1.438.888,76	99,97%
000390179 SINAPI	Talhadore chata 10"	Material	un	0,0188102	24,41	0,46	0,46	0,00%	1.438.889,21	99,97%
10570 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0113977	35,33	0,40	0,40	0,00%	1.438.889,62	99,97%
11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0004528	812,10	0,37	0,37	0,00%	1.438.889,98	99,97%
00013454 SINAPI	COMPACTADOR DE BOLOS DE PERCURSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000156	20.818,56	0,32	0,32	0,00%	1.438.890,31	99,97%
4729 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0062702	49,67	0,31	0,31	0,00%	1.438.890,62	99,97%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	Equipamento	H	24,0000000	0,01	0,24	0,24	0,00%	1.438.890,86	99,97%
11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002480	44,88	0,23	0,23	0,00%	1.438.891,09	99,97%
10282 ORSE	Regua de alumínio de 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003682	57,82	0,19	0,19	0,00%	1.438.891,28	99,97%
11245 ORSE	Desmoldadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0117019	15,24	0,18	0,18	0,00%	1.438.891,47	99,97%
4723 ORSE	Culher de pedreiro	Material	un	0,0087381	24,70	0,17	0,17	0,00%	1.438.891,63	99,97%
11265 ORSE	Martelo de borachia com cabo	Material	un	0,0067381	24,64	0,17	0,17	0,00%	1.438.891,80	99,97%
11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0117019	13,43	0,16	0,16	0,00%	1.438.891,96	99,97%
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,46	0,15	0,15	0,00%	1.438.892,11	99,97%
11248 ORSE	Furadeira e Perfuradeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0004528	323,29	0,15	0,15	0,00%	1.438.892,25	99,97%
4174 ORSE	Desmoldadeira de aço inox, cabo madeira, ref 143, Ades ou similar	Material	un	0,0084229	15,77	0,13	0,13	0,00%	1.438.892,38	99,97%
10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003682	20,23	0,07	0,07	0,00%	1.438.892,45	99,97%
80669 SENFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CALÁMINA E ESO. HP 155 (CH)	Equipamento	H	0,0005087	122,47	0,06	0,06	0,00%	1.438.892,52	99,97%
11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0016845	36,70	0,09	0,09	0,00%	1.438.892,58	99,97%
11264 ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003682	17,76	0,09	0,09	0,00%	1.438.892,64	99,97%
11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0006059	64,33	0,08	0,08	0,00%	1.438.892,70	99,97%
10780 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0016845	34,10	0,08	0,08	0,00%	1.438.892,75	99,97%
11255 ORSE	Tamacha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0004200	82,78	0,03	0,03	0,00%	1.438.892,79	99,97%
11253 ORSE	Tamacha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0007700	36,11	0,03	0,03	0,00%	1.438.892,82	99,97%
11256 ORSE	Tamacha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002600	78,83	0,02	0,02	0,00%	1.438.892,84	99,97%
10576 ORSE	Fornido grande	Material	un	0,0009059	19,81	0,02	0,02	0,00%	1.438.892,86	99,97%
10577 ORSE	Semete 40cm	Material	un	0,0004528	39,29	0,02	0,02	0,00%	1.438.892,88	99,97%
11254 ORSE	Tamacha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0004600	36,12	0,02	0,02	0,00%	1.438.892,89	99,97%
11257 ORSE	Tamacha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002600	42,44	0,01	0,01	0,00%	1.438.892,91	99,97%
10596 ORSE	Tonqueira	Material	un	0,0000031	51,25	0,00	0,00	0,00%	1.438.892,91	99,97%
10592 ORSE	Unna chata 12"	Material	un	0,0000700	49,36	0,00	0,00	0,00%	1.438.892,91	99,97%
10595 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000031	28,15	0,00	0,00	0,00%	1.438.892,92	99,97%
10593 ORSE	Priso simples 30cm	Material	un	0,0000700	25,71	0,00	0,00	0,00%	1.438.892,92	99,97%
80596 SENFRA	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CH)	Equipamento	H	0,0000000	139,75	0,00	0,00	0,00%	1.438.892,92	99,97%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 4.027,40
Equipamento para Aqueduto Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 454.825,02
Material	R\$ 858.537,50
Servicos	R\$ 1.138,89
Taxa	R\$ 78,87
Administrativo	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Frangula	R\$ 0,00
Outros	R\$ 110.893,85

Total sem BDI 1.898.023,31
Total do BDI 344.280,62
Total Geral 1.440.303,93

MEMÓRIA DA REUNIÃO
PROJETO DE REPARO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IKON BIJATPU
ALDEIA PRAIA DO MANGUE

Aos dias quatorze de dezembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se na escola Ikon Bijatpu, aldeia Praia do Mangue, as lideranças indígenas: cacique Tiago Sirma de Moraes, cacique Brasilino Painhum, representantes da SEMED: Secretário Municipal de Educação Srº Amilton Pinho, Engenheiro Victor Freire, representantes da UNOPS: Oficial de Igualdade de Gênero, Diversidade e Inclusão, Srª Livia Alen, Arquiteta Sênior, srª, Heloisa de Cassia Machado, representante da Coordenação Multirracial-Semed, srº profº Honésio Dace Munduruku, representantes da CR/Funai/Tapajós: Ivanildo Saw Munduruku, Emerson Saw Mundurucu, João Adalto Saw Munduruku, representante da Associação Pariri, srª Alessandra Korap, professores indígenas e pais de alunos. A reunião iniciou-se às quatorze horas, tendo como o principal objetivo discutir e apresentar o projeto de reparo e ampliação da escola Ikon Bijatpu, localizada na aldeia Praia do Mangue, visando também oportunamente lavrar ATA DE ANUÊNCIA da comunidade sobre o projeto de reparo e ampliação. Para dar início dos trabalhos, o cacique Tiago deu boas vindas aos presentes, destacando que o momento é para dialogar entre os entes presentes sobre a construção da escola, segundo o cacique, o momento é oportuno também para exigir a melhoria de ensino tanto para o ensino fundamental e ensino médio, haja vista, que as comunidades necessitam de melhorias. Em seguida, o secretário municipal de educação, srº Amilton Pinho tomou as palavras para dar suas considerações iniciais, se apresentando, de acordo com ele, o objetivo da reunião é para tratar da ampliação e reparo da escola Ikon Bijatpu, segundo Amilton, o padrão da estrutura será o mesmo modelo da escola Inácio Paygo Bamuybu, da Praia do Índio, para ele, a escola tem possibilidade de ser maior em relação à outra, mas destacou que quanto a responsabilidade para construir, será de responsabilidade da UNOPS, diferente dos demais projetos que foram de responsabilidade da SEMED, no caso, o presente projeto de reparo e ampliação da escola Ikon Bijatpu será de responsabilidade da equipe da UNOPS e não da SEMED, mas, antes, no decorrer do processo todos os detalhes serão feitos conforme os meios legais, mas, quando for concluída, Amilton assegurou que a SEMED se responsabilizará para manter, zelar e gerir o seu funcionamento. A srª Livia, por vez, tomou a palavra dando boa tarde aos presentes, segundo a Livia, o presente momento é para apresentar o projeto à comunidade e tirar dúvidas a respeito, de acordo com a Livia, UNOPS é uma organização do Sistema da ONU assim como a UNICEF, por exemplo. Segundo ela, tudo que for tratado na presente reunião será registrada e em seguida assinado por todos. Na sequência, Heloisa, informou que devido a obra ainda não ter começado, por isso, não tem como ainda informar detalhes e informações mais precisas sobre o recurso disponível, mas que a organização vai seguir o mesmo padrão de processo de licitação a nível federal, inclusive, de acordo com ela, a equipe tem o engenheiro próprio que também acompanhará o processo, na oportunidade, ela sugeriu que a comunidade também acompanhe todo o processo de projeto. Quanto a isso, a Livia, mencionou que, a ideia é que a obra comece no segundo semestre de 2024 e seja concluída no começo de 2025 para o ano letivo de 2025. Heloisa, reforçou que a obra começará somente no segundo semestre de 2024, enquanto isso, a escola atual ainda pode continuar funcionando sem interdição. Por vez, o Engenheiro Victor, da SEMED informou que a escola vai ter a mesma estrutura da escola Inácio Paygo Bamuybu, da aldeia Praia do Índio, algumas partes da estrutura serão demolidas e outras serão reaproveitadas, e ainda, será adequada conforme o modelo da escola Inácio Paygo, e será maior do que a estrutura atual. Na oportunidade, o Engenheiro Victor fez exposição de projeto impresso aos participantes juntamente com a arquiteta Heloisa, os mesmos fizeram exposição de detalhes da planta arquitetônica. Na ocasião, Alessandra destacou

A

a importância de as lideranças presentes se apresentarem à equipe, por vez, a mesma apresentou os componentes da Associação Pariri à equipe da UNOPS, apresentou também lideranças indígenas, pajé e representantes da FUNAI. Feito a apresentação, o srº Ivanildo Saw como representante do coordenador da FUNAI/Itaituba-PA, deu boas vindas aos presentes, de acordo com ele, o mesmo estava na reunião na condição de representante do coordenador titular que se encontra ausente, na oportunidade apresentou à equipe da UNOPS os demais servidores da Funai e suas respectivas funções. Segundo a Livia, a lista de presença está passando na reunião para serem assinados pelos participantes, esses serão anexados no processo, incluindo o pedido de utilização de fotos, se caso a comunidade autorizar o uso de imagens. Reforçando sobre a explanação anterior, Victor, destacou que haverá também o muro dentro do padrão exigido a nível nacional. Quanto a isso, Marcos Sirma, destacou que a parte do muro que fica do lado da cidade/rua, que fique mais alta para evitar que as pessoas mal intencionadas adentrem no pátio da escola, segundo a liderança, já aconteceu o incidente há dias atrás, em que o elemento adentrou na escola amedrontando os servidores, isso também evitaria, segundo ele, a depredação da escola, então, para o Marcos, o muro tem que ser alto para evitar tudo isso. Quanto a questão do muro, Amilton destacou que o muro será de dois metros de altura, que é o padrão exigido no município de Itaituba. Na sequência, Francisco Ikon, tomou as palavras agradecendo a presença dos participantes e lideranças, para ele, o projeto é muito bom, mas, relacionado a isso, para ele seria bom também o repasse de informes a respeito do recurso disponível, e também, o ideal é que seria iniciar logo a construção, isso para atender a expectativa da comunidade que espera ansiosamente a nova escola, para ele, é interessante que começasse logo a obra e não no meio do ano de 2024 como foi mencionado pela equipe responsável, na sequência, o mesmo ainda relatou o contexto da escola Ikon Bijatpu, seus desafios e sua expectativa, e pediu que todos valorizassem a escola, o mesmo espera que o retorno da escola traga novamente o processo de contratação de professor de língua materna e outros trabalhos conforme de direito. Quanto ao tempo para executar o projeto, a Livia, reforçou que demandará o tempo porque precisa passar por devidos processos burocráticos, assim como qualquer processo de construção que são submetidos, inclusive, segundo a Livia, precisará passar pela aprovação da Funai-DF, e cada segmento como a FUNAI e UNOPS, terão seus processos a seguir, quando concluir esses processos preliminares, na sequência as empresas também precisarão de tempo para atender os respectivos processos de licitação e outros necessários, evitando que ocorra o erro durante a execução do projeto, de acordo com ela, o projeto de construção precisará obedecer todas as etapas e, por isso, vai demandar tempo, segundo a Livia, no quesito "processo" sua organização também requer muita burocracia, mas, sugeriu que todos interessados sejam comunicados e que todos pudessem também acompanhar o processo durante o procedimento do projeto. Já referente ao valor, segundo a Livia, o orçamento feito pela SEMED em conformidade ao projeto está em torno do valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), mas, segundo ela, isso ainda precisará ser adequado a vários fatores, com isso, provavelmente o valor ainda pode ser abaixo do que se espera, mas, que o valor estimado no momento é de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), mas, a mesma novamente sugeriu que todos acompanhassem e se informem sobre o andamento do processo. Na oportunidade também, a Livia pediu que a comunidade indique alguém para servir de referência de comunicação, e os presentes sugeriram que fossem os próprios representantes de segmentos que atuam com as comunidades indígenas como: Emerson Saw, da Funai/Itaituba-PA, Honésio Dace, da Coordenação Multirracial/SEMED, Francisco Ikon, Líder da Associação de Professores do Médio Tapajós e representantes da Associação Pariri. De acordo com a Livia, quando a obra começar será designado um engenheiro da organização (UNOPS) para acompanhar os trabalhos. Quanto ao orçamento do projeto, Idelita Ikon, questionou se o valor pudesse contemplar a

construção do parquinho para atender as crianças no pátio da escola. De acordo com a Heloisa, para isso, é preciso antes verificar junto com MPT sobre a possibilidade de mais recurso para tal finalidade, sendo que só MPT pode possibilitar a destinação do recurso para tal finalidade. Mas a Livia, mencionou que verá junto ao MPT sobre essa possibilidade. Em seguida, Emerson Saw, se apresentou como filho do cacique Juarez e como servidor da CR Tapajós/Funai, e comentou que a escola Ikon Bijatpu é uma escola de referência, através da qual nasceram várias outras, e atualmente a comunidade está tendo oportunidade de ter uma boa escola, mas, pediu que a comunidade valorize a escola, principalmente no que tange a matrícula na própria escola, segundo Emerson, demais escolas passam pelas dificuldades devido falta de infraestrutura, exemplo disso, a escola Sawre Baay que passa por diversas dificuldades apesar de atender várias modalidades como educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, por isso o mesmo se sente triste quando soube que os pais da comunidade Praia do Mangue não matriculam seus filhos na escola Ikon. Também cacique Brasilino, teve oportunidade de cumprimentar os presentes, se apresentou como cacique da Praia do Índio, disse que a porta da sua aldeia está aberta para quem pretende visitar. Em seguida, cacique Jairo Saw também se apresentou, deu boas vindas aos presentes, de acordo com o cacique, é gratificante quando órgãos chegam até a comunidade para discutir construção de escola, e "isso nos traz felicidades", então, isso ajudará muitos alunos principalmente daqueles que necessitam, em breve relato, o mesmo relatou que já passou por dificuldades devido a falta de escola, e para ele, a escola trás resultado positivo. Por vez, Alessandra, tomou a palavra para informar que se sente feliz pela visita da equipe à comunidade indígena urbana, a qual enfrenta diversas preocupações, principalmente por causa de empreendimentos que estão se instalando no entorno, exemplo disso, a sua aldeia Praia do Índio, que quase não há mais espaço para ser terreno, além disso, trazendo diversos problemas sobre moradia, caça, pesca, para ela, somente a demarcação de TI pode ser uma solução, outro problema segundo ela, é referente a aquisição de poços artesianos, que há tempo as comunidades vinham enfrentando séries de problemas, ultimamente a mesma se sente muito feliz, uma vez que, recentemente já estão sendo construídas 5 escolas, outra felicidade, é referente a inauguração de poços artesianos na aldeia Sawre Apompu, de acordo com ela, na oportunidade da inauguração até o cacique Adriano Saw se emocionou porque isso era o sonho da finada esposa que recentemente faleceu, segundo ela, os trabalhos não param, inclusive recentemente há trabalhos que está sendo desenvolvidos em parceria com Saúde e Alegria, está sendo feito mais trabalhos de poços artesianos e placa solar, mas, a mesma ressaltou que esse tipo de trabalho requer muita burocracia e o processo demora a ser executado, mas, ainda assim não se deve parar, mas é preciso fazer conforme os critérios e trâmites legais, é difícil, mas, segundo ela, tem que ser dessa forma, para ela por tudo isso passa também a prefeitura, assim como o UNOPS também passa quanto a organização, tudo isso é demorado, o exemplo disso, segundo Alessandra mencionou, o projeto que foi feito por Victor Freire, mas, a mesma recomendou que o projeto seja conforme a exigência da comunidade, e o muro deve ser alto. Quanto à colocação da Alessandra, o engenheiro Victor, reforçou que todos os muros agora vão ser conforme o padrão recomendado pelo MEC, que equivale a mais de 2,50 mts de altura, essa altura do muro agora é a exigência a nível nacional devido a tragédia ocorrida em uma determinada escola, em que vitimou crianças. Quanto a isso, para a Alessandra, a segurança deve ser prioridade devido as crianças, e, sugeriu que se faça busca de recurso especificamente para a questão de segurança na aldeia em geral. Mediante o exposto, Livia, explicou que enviaria para Alessandra como é o processo burocrático para solicitar recursos ao MPT. Alessandra também questionou como ficou agora a conclusão da escola Sawre Baay, considerando que a princípio a prefeitura alegava que não ia concluir devido estar no território de Trairão, de repente, segundo a Alessandra, ficou sabendo que a escola Sawre Baay ia ser construída pelo

A

MPT deixando-a repentinamente muito feliz, mas que, logo foi informada de que não ia ser mais e isso, segundo ela, lhe trouxe muita preocupação, e mediante a isso, questionou, se a prefeitura ainda vai continuar com o projeto de conclusão da escola Sawre Baay. De acordo com Alessandra, os alunos passam por dificuldades, porque a escola está praticamente abandonada pelo Estado, e mediante a essas dificuldades mencionadas, sugeriu que os moradores da Praia do Mangue valorizassem a escola dentro da aldeia e além disso, relatou também outras questões problemáticas que acontecem nas comunidades. Mas, demonstrou ser otimista, que através da participação da ONU tudo vai melhorar, depois de muitas lutas, a "ONU está presente", e agradeceu pela atenção. Por vez, o Ivanildo Saw, representante da FUNAI, também deu suas considerações a respeito do contexto das dificuldades da escola, ressaltou sobre a importância de valorização da escola e do professor local. Oportunamente questionou, se o projeto de construção pode contemplar a mão-de-obra local, sendo que, na comunidade existem muitos pais de famílias que necessitam de trabalho. Quanto a isso, a Livia, mencionou que pode haver espaço sim, mas que, precisa saber se a comunidade local tem interesse, caso tiver interesse, os interessados podem fazer relação de nomes e respectivas funções e organização encaminhará e recomendará que a empresa que ganhar a licitação, atenda a mão-de-obra local, mediante a isso, a comunidade de forma unânime informou que há sim interesse por parte da comunidade em oferecer mão-de-obra e há pessoas interessadas. Por fim, Francisco Iko, também colocou sobre a possibilidade de deslocar o projeto para mais para frente de modo a não implicar na passagem dos moradores que habitam nas casas mais próximas da escola. Quanto a essas possibilidades de mudança ou adequação do projeto, o engenheiro Victor ficou de estudar os detalhes, conforme dito, para não atrapalhar a passagem, considerando o tamanho e a extensão do terreno propriamente dito da escola. Na sequência, professora Brena, questionou se haverá o lugar para atender os alunos durante o período de construção. Segundo a Livia, isso ficará sob responsabilidade da própria SEMED, que conseguirá o espaço temporário para atender o funcionamento das aulas e que a SEMED discutirá a solução temporária com a comunidade. **Logo que foi apresentado e discutido o projeto de reparo e ampliação da escola Ikon na plenária, a comunidade escolar de forma unânime, diante dos representantes da FUNAI, representantes da UNOPS, representante da Educação Escolar Indígena, diante do secretário municipal de educação, representante da Associação Pariri e lideranças indígenas, os presentes aprovaram que seja reformada e ampliada de acordo com o projeto apresentado pela SEMED a escola Ikon Bijatpu em caráter urgente, logo que a comunidade escolar pretende utilizar a escola assim que estiver disponível.** Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e oito minutos, e eu, Honésio Dace Munduruku, lavrei e assinei a presente ata e demais presentes também assinaram a relação abaixo.

Itaituba-PA, 14 de Dezembro de 2023.





ATA DA REUNIÃO E AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Participação na reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2023, às 15h, na Aldeia Praia do Mangue, em Itaituba (PA), sobre o projeto a reforma e manutenção da EMEF Indígena Ikon Bijatpu, parte do projeto "Contribuição do MPT à Agenda 2030: ações de transformação social e econômica decorrentes da atuação do Ministério Público do Trabalho no país", firmado entre o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Neste contexto, a Prefeitura Municipal de Itaituba é a responsável pelo desenvolvimento dos projetos executivos e o UNOPS pela execução das obras.

A reunião tem como objetivo a apresentação do UNOPS e do referido projeto para a comunidade e as diferentes partes interessadas, bem como a realização de atividades de escuta e consulta às comunidades para buscar o Consentimento, Livre, Prévio e Informado da comunidade para realização do mencionado projeto em linha com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Ademais, é autorizado ao UNOPS o direito de reproduzir, mostrar e difundir em todo mundo e em perpetuidade as imagens, vídeos, áudios e fotografias minhas e dos menores de idade sob minha responsabilidade, registradas na Aldeia Praia do Mangue, em Itaituba (PA) no dia 14 de dezembro de 2023, pela a equipe do projeto.



UNOPS

NOME	ASSINATURA	CPF	TELEFONE	AUTORIZA (marcar X)
Idineio Kō Mundurucu			939917913201	X
Marcia F. F. P. Reis				X
Forcinara Kares				X
Wella Kuma Rukuna				X
Muricy Kō Mundurucu		338.529.602-15	(93)9911-2987	X
Teogo Simus de Moraes		134688982-15		X
Adanta Kō Mundurucu		663.660.292-34	(93)991338710	X
Alessandra Karp Silva	Alessandra Karp	835.350.112-49	(94)991790834	X




UNOPS

NOME	ASSINATURA	CPF	TELEFONE	AUTORIZA (marcar X)
Adriana Brito	V. nina	925.620.432-00	(43) 99141-0821	X
Simone de Jesus				X
Luiz Jesuelino S.P. MOK		740-458-572-49	(93) 99118-3258	X
Michelle Gomes de Souza		959.737.292.49	(93) 99145-2920	X
Simone de Jesus		057.944.322-17	(93) 99153-1430	X
Luiz Gomes de Jesus		830.868.892-63		X
Maria Eduarda Gomes de Jesus				X
Maria Eduarda Gomes de Jesus				X



NOME	ASSINATURA	CPF	TELEFONE	AUTORIZA (marcar X)
Celia Helena Da dos Santos		017.357.342-84	(93)992342312	X
Alma Karo-munduru Ku			(93)992440188	X
Domingos Kurap Maenderuku				X
Sandra Karo munduru Ku				X
Alma Maria D. T. Mundurucu Ku				X
Joseia				X
Maria da Graça		414523052-34	(93)9900-5487	X

Miriam Kabe Mundurucu		050.737192.25	(93) 991610330	X
Clara R. da Silva		966.367.502-00	(93) 984287413	X
Personete coto munda				X
Sra. Jandy da Silva Guedes		009.594.002-22	(93) 991753574	X
Robson M. de S. Santos		857.114.402-33	(93) 99223-4950	X
Araceli Kelli Roberto Silva		016.059012-45	(93) 991443278	X
Marcelle Freire de Araújo		02141251250	(93) 991432026	X
José Aloísio Guedes Mundurucu		687934482-87	(93) 991198701	X
Wera Saw mundurucu		035.053.692-92	(93) 99189574	X



UNOPS

NOME	ASSINATURA	CPF	TELEFONE	AUTORIZA (marcar X)
Mari Cristina Cal Contador			93991355156	X
Simone Faria Mendonça			991876434	X
Suzanne Souto MDK				X
Avaliação dos Serviços			93991196860	X
Bruna Siqueira dos MDK	Bruna Siqueira	890.185.672-72	(93)991772073	X
Glória Akop Mendonça				X
Luciane dos MDK				X
Emerson Souto Mendonça	Emerson	012.954.242-31	(93)991091429	X



UNOPS

NOME	ASSINATURA	CPF	TELEFONE	AUTORIZA (marcar X)
Rafaela G. L. dos Santos		066.671.992-34	(93) 9914-1070	X
Francisco de Assis		625.134.602-78	989287143	X
Evandro da Silva		610.055.682-00	(93) 99231-1110	X
Homero da Mota		993.401.872-68	(93) 99169877	X
Francisco de Assis		521062.252-53	(93) 99247-9190	X

[illegible]

TERMO DE RESPONSABILIDADE

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

**ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDÍGENA "IKON
BIJATPU"**

Fundo Municipal de Educação de Itaituba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF, Nº 25.317.772/0001-82, com sede na Travessa 15 de Agosto, nº 169, Bairro Centro, Itaituba – PA, neste ato legalmente representado pelo Sr. Amilton Teixeira Pinho, Secretário Municipal de Educação, mediante este instrumento declara responsabilizar-se pela manutenção e operacionalização da Edificação/Equipamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Indígena "IKON BIJATPU", localizada na Aldeia **PRAIA DO MANGUE**, no Município de Itaituba – PA, a contar da data inicial de sua Edificação.

Itaituba-Pará 31 de Janeiro de 2022


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto M. MCA 006/17 de 02/01/217

Reformar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Licença de Instalação – L.I.

L.I Nº: 052/2023
PROCESSO Nº 1096/2023

VALIDADE ATÉ: 25/07/2024
DATA DO PROTOCOLO: 20/07/2023

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.834/2006, de acordo com a Habilitação 005/2012 – SEMAS/PA, Lei Estadual nº 7.389/2010 de 01/04/2010 e Resoluções COEMA N°s 162/2021 e anexo concede a presente licença ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME/ RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PORTE:

A II

ENDEREÇO: situada na Rua Dr. Hugo de Mendonça, 226 - Paço Municipal

MUNICÍPIO: ITAITUBA – PA

CEP: 68.180-000

CNPJ: 05.135.730/0001-77

ATIVIDADE/ TIPOLOGIA:

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDÍGENA – IKON
BIJATPU

TIPOLOGIA LICENCIADA:

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL – IKON BIJTPU

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA:

ALDEIA (PRAIA DO MANGUE) RUA ANTÔNIO GOMES BIBY S/N (6 RUA DO BAIRRO JARDIM DAS
ARARAS)

VÍNCULO: NÃO

CORDENADAS GEOGRAFICAS Lat.: -4.2590784 Long.: -55.97306376

CORDENADAS GEOGRAFICAS Lat.: - 4°15'32.13" S Long.: - 55°58, 18.40". 1.46 w

OBRIGAÇÕES:

- Solicitar a Renovação da Licença Ambiental em até 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento conforme Resolução CONAMA 237/1997, art.18 parágrafo 4º;
- Apresentar comprovante de publicação em periódico local/regional em até 30 (trinta) dias conforme previsto em Resolução 237/1997;
- Afixar esta Licença em local de fácil visualização;
- Dar cumprimento às condicionantes no verso deste documento (anexo I);



LOCAL E DATA:

Itaituba – PA, 25 de julho de 2023.

Bruno Rolim da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto Municipal Nº009/2017

BRUNO ROLIM DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto Municipal Nº009/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Anexo I – Licença de Instalação Relação de Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Operação, requerida no processo protocolado sob Nº1096/2023, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas, como requisitos necessários à validação desta licença.

Pendências a serem apresentadas junto a SEMMAM, a fins de validação de Licença:

Condicionantes:

PRAZO DE 30 DIAS:

- Apresentar publicação de Recebimento de LI no prazo de 30 dias;

Determinantes:

- Protocolar pedido de renovação de L.I. – Licença Instalação até 120 (cento e vinte dias) dias antes do vencimento desta licença emitida;
- Comunicar de imediato a **SEMMAM** – Itaituba, qualquer acidente ou ação que degrade ou polua, direta ou indiretamente, o meio ambiente na área de influência do empreendimento, resultante das atividades de instalação;
- Esta licença, em conformidade com o que consta no **Artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97**, poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
- O não cumprimento das obrigações aqui apresentadas incide sobre o requerente desta as sanções legais de acordo com a Lei nº 9605/98 que institui a Lei de Crimes Ambientais.



Data e Assinatura do Representante Legal



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241218675

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

VICTOR GIULIANO DE ALMEIDA GOMES FREIRE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJETO, DESEMPENHO E CONST. DE ESTRUT. E FUNDAÇÕES** RNP: 1518676898
 Registro: 952193PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: 25.317.772/0001-82
TRAVESSA QUINZE DE AGOSTO Nº: 169

Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: 68180610
 Cidade: **ITAUTUBA** UF: **PA** ART Vinculada: **PA20241212983**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **28/10/2024**
 Valor: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ANTÔNIO GOMES BILBY Nº: S/Nº
 Complemento: **ALDEIA PRAIA DO MANGUE** Bairro: **BELA VISTA**
 Cidade: **ITAUTUBA** UF: **PA** CEP: 68180260
 Data de Início: **28/10/2024** Previsão de término: **31/12/2024** Coordenadas Geográficas: **04°15'32.68"S, 55°58'22.76"W**
 Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: 25.317.772/0001-82

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
12 - ELABORAÇÃO		
331 - PROJETO ARQUITETÔNICO > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	352,73	m²
331 - PROJETO ARQUITETÔNICO > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	352,73	m²
24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	352,73	m²
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	352,73	m²
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	352,73	m²
90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	352,73	m²
25 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	352,73	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos Projetos Executivos da Escola E.M.E.I.F.IND Ikon Bijatpu para Reforma e Ampliação, localiza na Aldeia Praia do Mangue, Município de Itaituba-PA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3A3y8
 Impresso em: 28/10/2024 às 18:00:48 por: , ip: 149.19.165.100

X

www.creapa.org.br
 Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
 Fax:

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241218675

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Victor Freire

Assinado eletronicamente por Victor Freire
MD: C=BR, OU=CREA-PA-101857089-8, CN=Victor Freire, E=arg.vfreire@gmail.com
Email: E=arg.vfreire@gmail.com
Faltou: E=arg.vfreire@gmail.com
Localização:
Data: 2024.10.28 18:02:14-0200
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

VICTOR GIULIANNI DE ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 925.620.432-00

MONICA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA 511.055.002-68
Assinado de forma digital por MONICA DE
FATIMA VIEIRA OLIVEIRA 511.055.002-68
Data: 2024.10.28 20:29:32 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 25.317.772/0001-82

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **28/10/2024** Valor pago: **R\$ 99,65** Nosso Número: **10580699**

4

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3A3y8
Impresso em: 28/10/2024 às 18:00:48 por: , ip: 149.19.165.100

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Pará



25 VISTA COZINHA 01

26


30 PERSPECTIVA DEPÓSITO ALIMENTOS
EBC-NA


31 VISTA ÁREA DE SERVIÇO

32 PERSPECTIVA ÁREA DE SERVIÇO
ESQUINA


27 VISTA COZINHA 02
EBCAL 1:25

28 **PERSPECTIVA COZINHA 02**




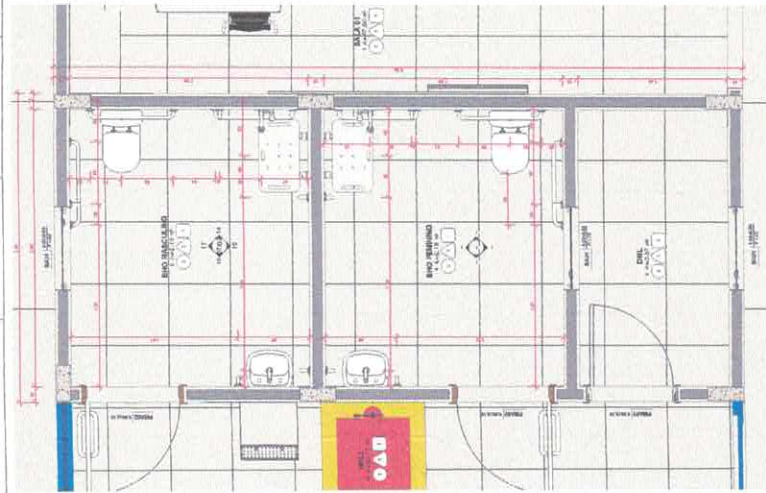


13 PLANTA BAIXA - BANHEIROS

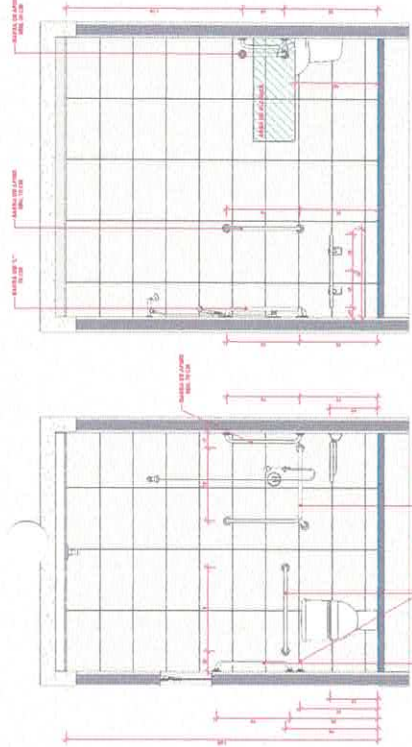


14 ELEVACÃO 01 - BHO MASC. FEM.

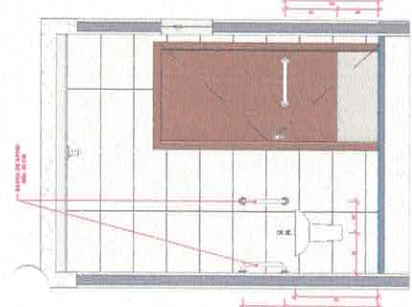


15 ELEVACÃO 02 - BHO MASC. FEM.

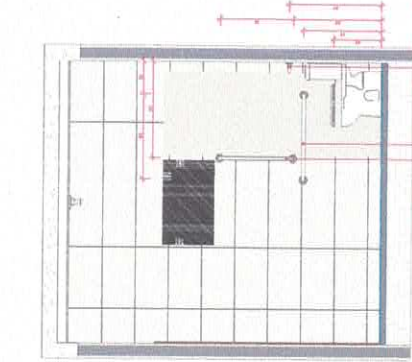

16 ELEVACÃO 03 - BHO MASC. FEM.

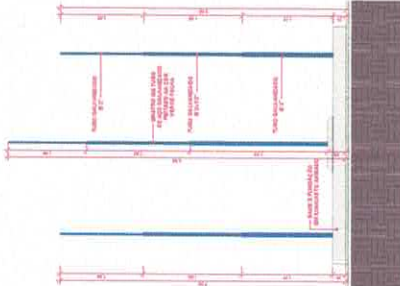


18 VISTA MASTRO




19 PLANTA BAIXA - MASTROS



20 PLANTA BAIXA - MURO



21 VISTA MURO FRONTAL

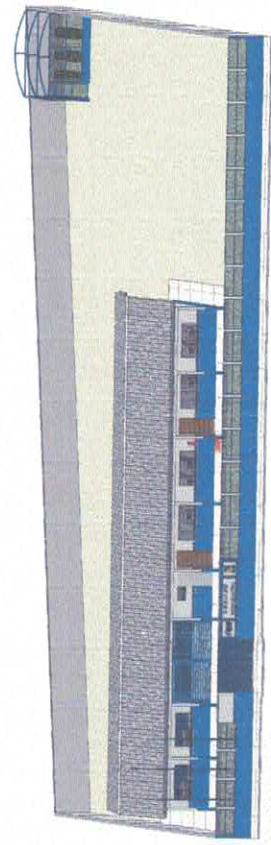

22 PERSPECTIVA FINAL





SEMED
Secretaria Municipal de Educação




Endereço: RUA DO COMENDADOR BILLY COM AVENIDA TRANSAMAZONAS, 1000 - JARDIM DAS ARABAS, ALDEIA PENHA DO MANCUE, ITATUBA PARA.
Tributo do projeto: ARQUITETURA - E.M.E.F. INOBUATPU

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 25.317.772/0001-82

Endereço: RUA DO COMENDADOR BILLY COM AVENIDA TRANSAMAZONAS, 1000 - JARDIM DAS ARABAS, ALDEIA PENHA DO MANCUE, ITATUBA PARA.
Tributo do projeto: ARQUITETURA - E.M.E.F. INOBUATPU


Arquiteto: [Nome do Arquiteto]
Data: [Data]
Assinatura: [Assinatura]

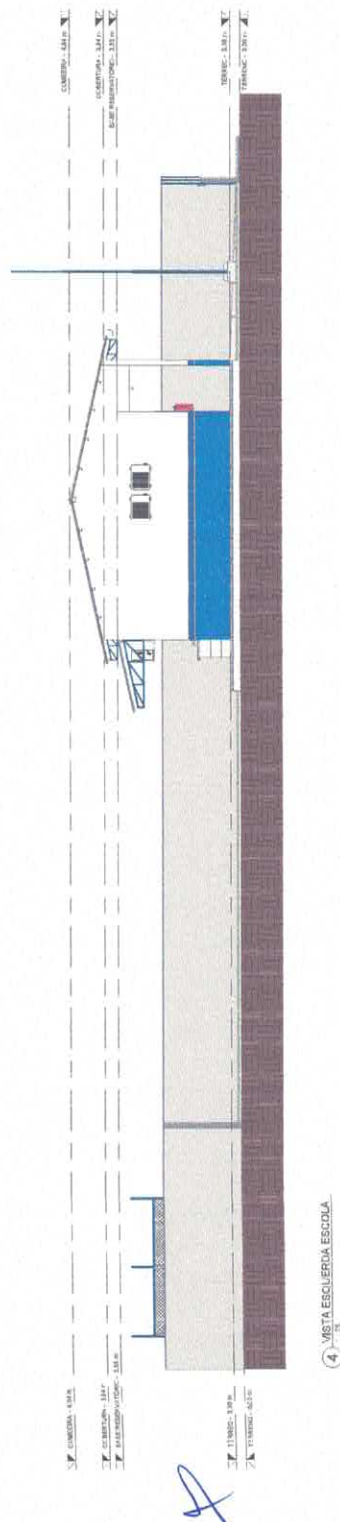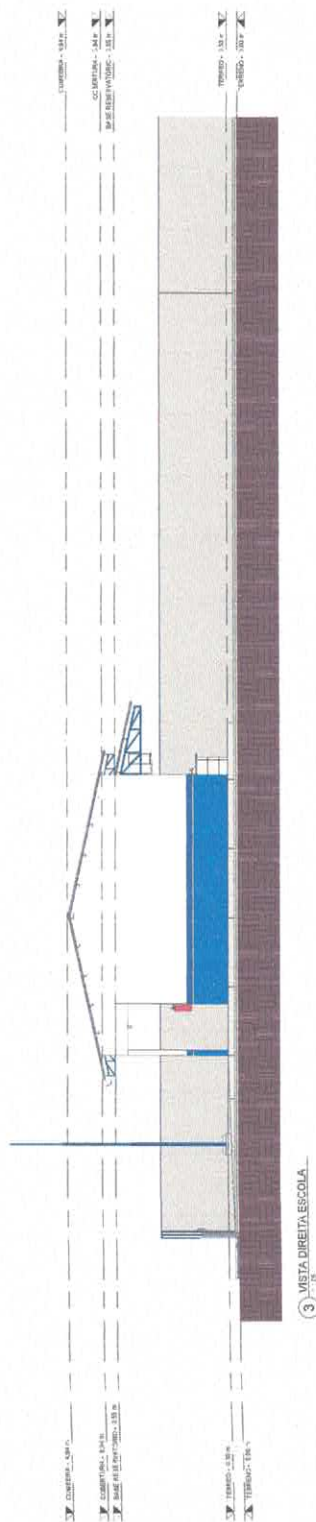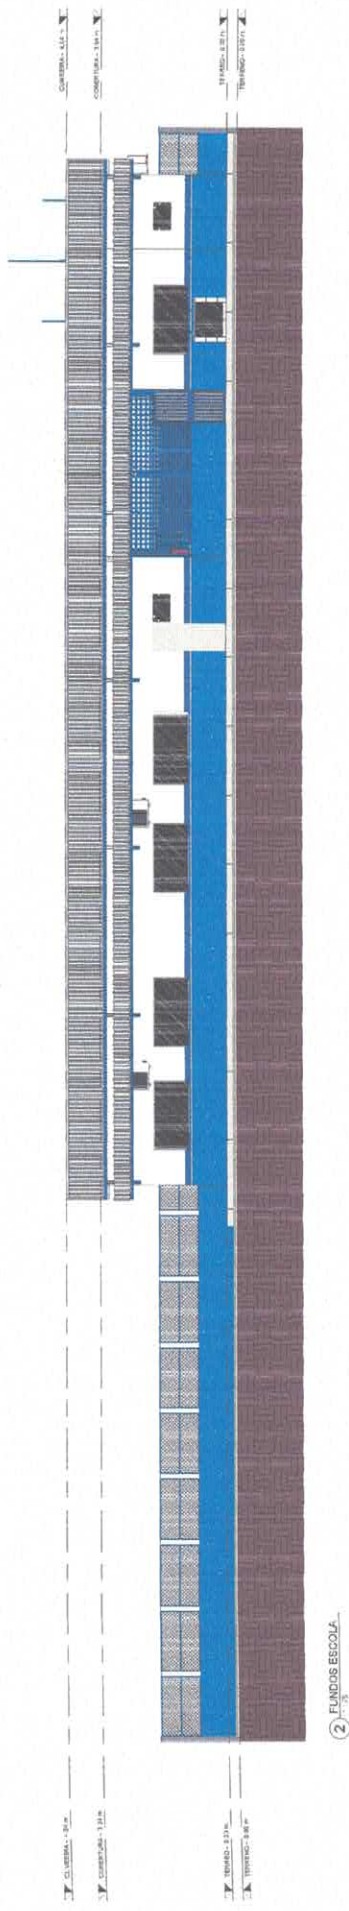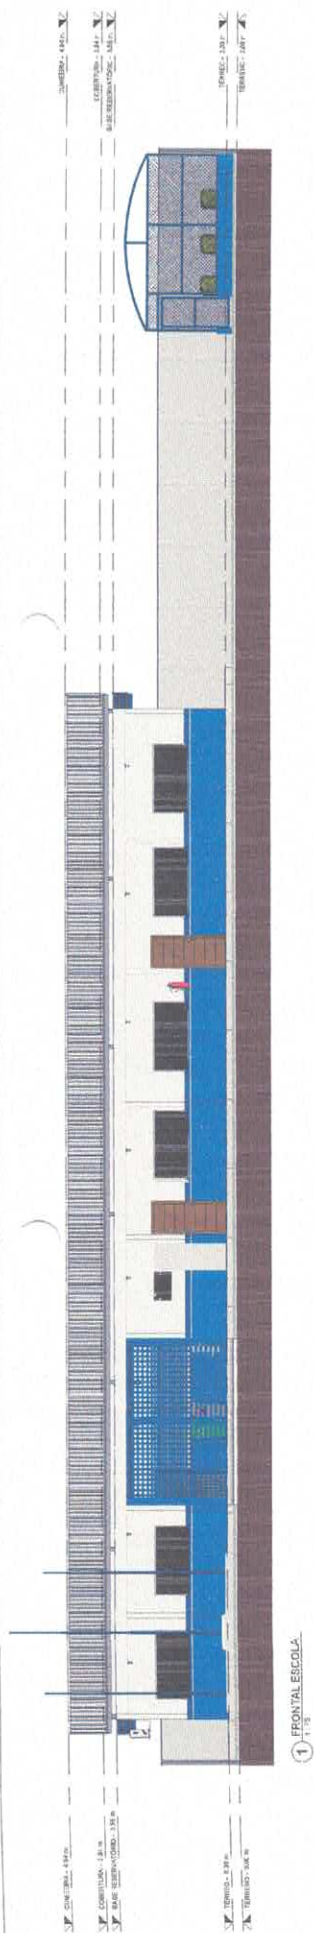

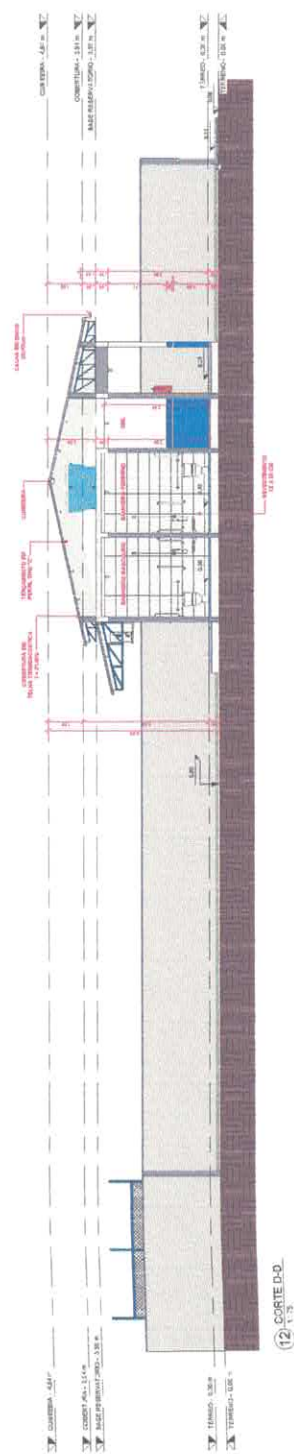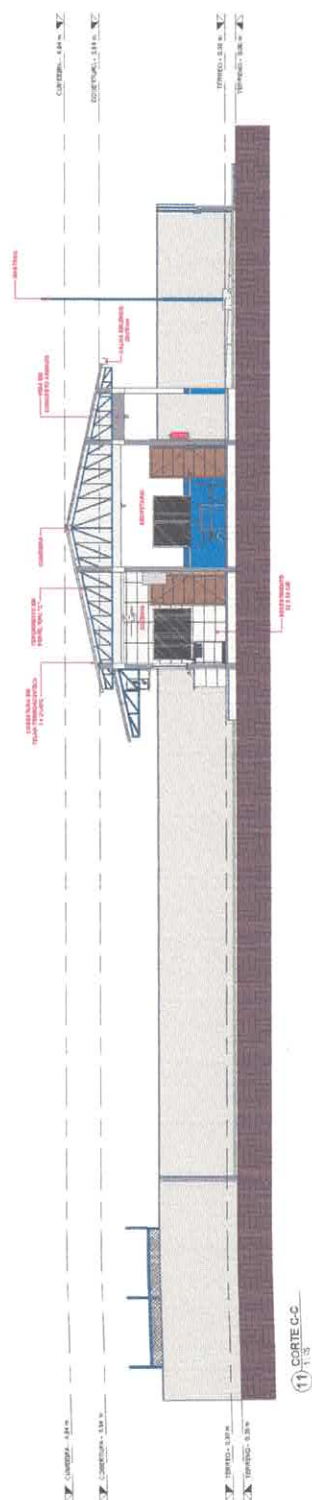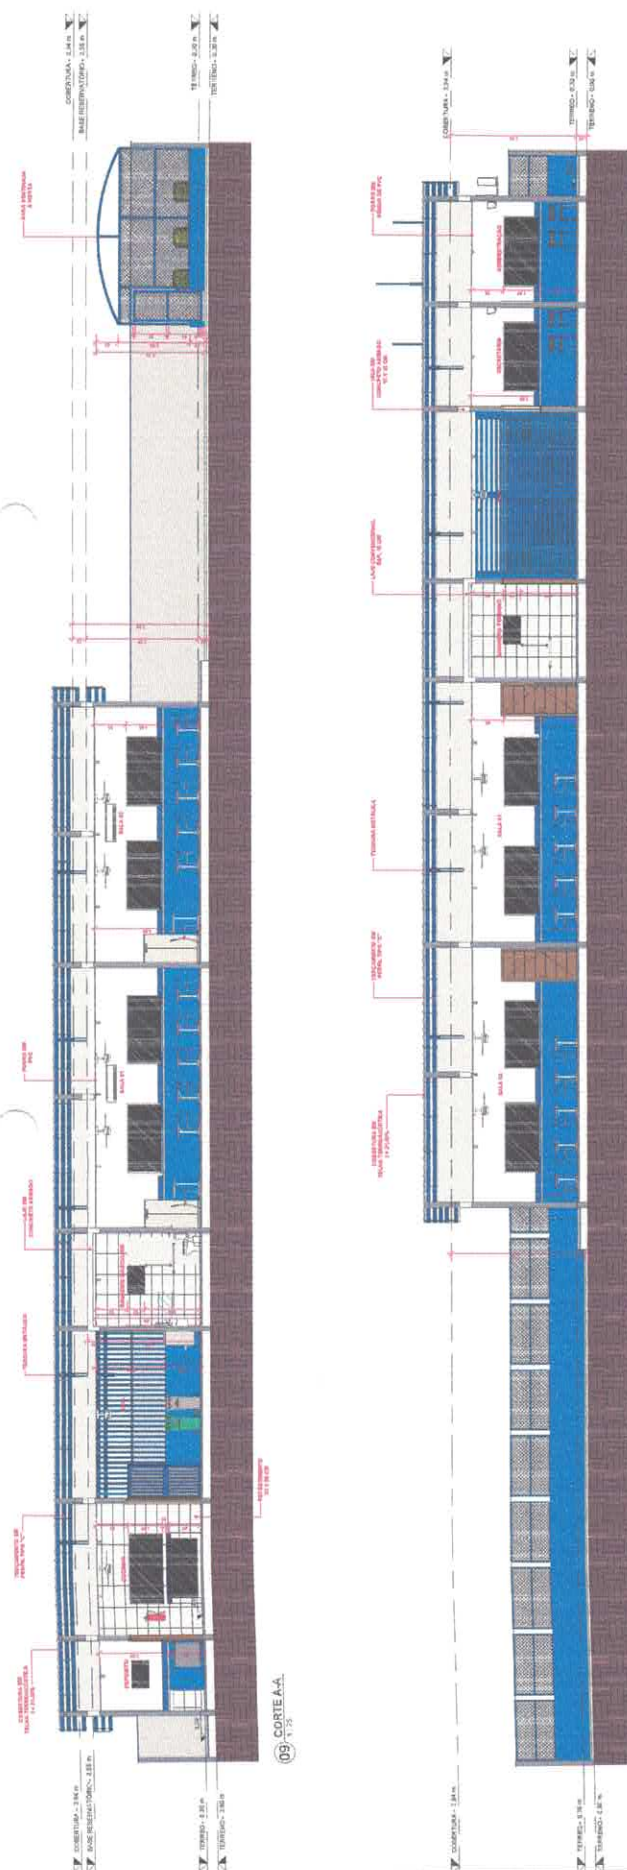


TELHADO

Nomenclatura	ECL		Componente	Tipo de Transporte	Sustentado
	Exercicio	Recurso			
Resolução nº 111 - 20	1.6.2015	1.6.2015	2.50	-	1
Resolução nº 112 - 20	1.6.2015	1.6.2015	0.01	-	2

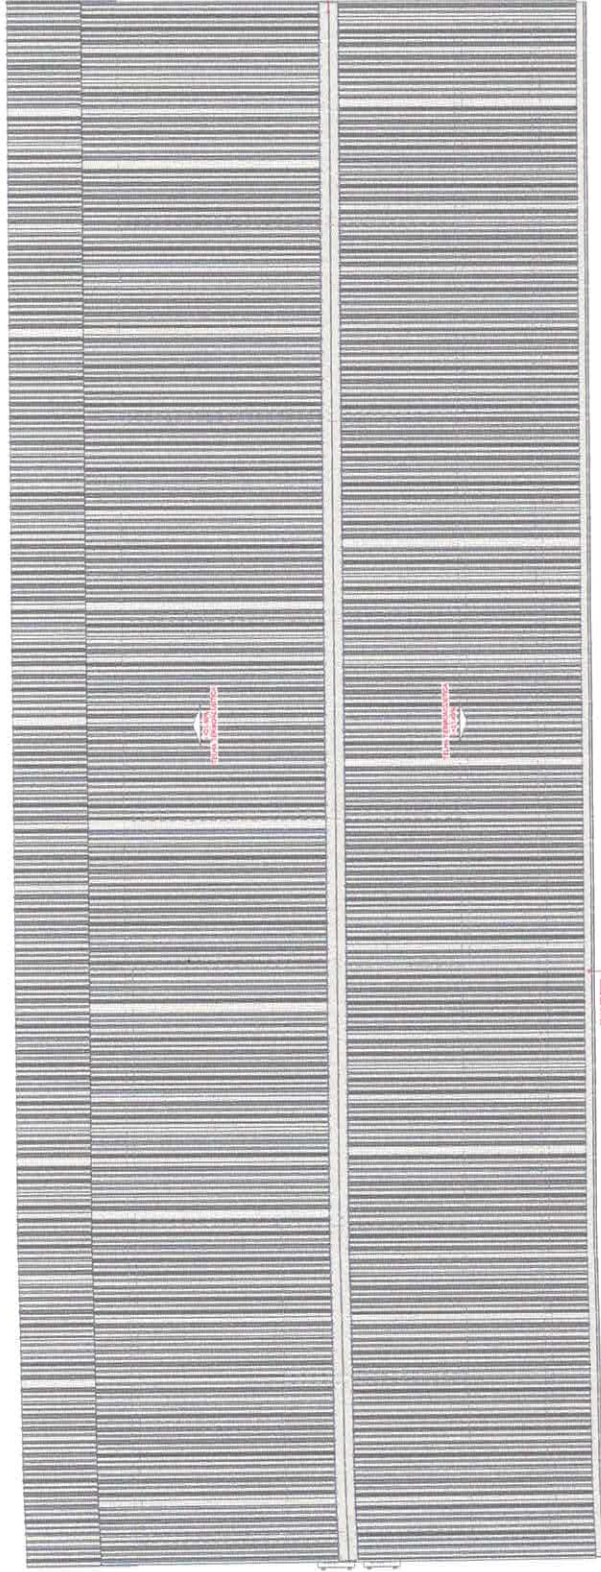

07 COBERTURA

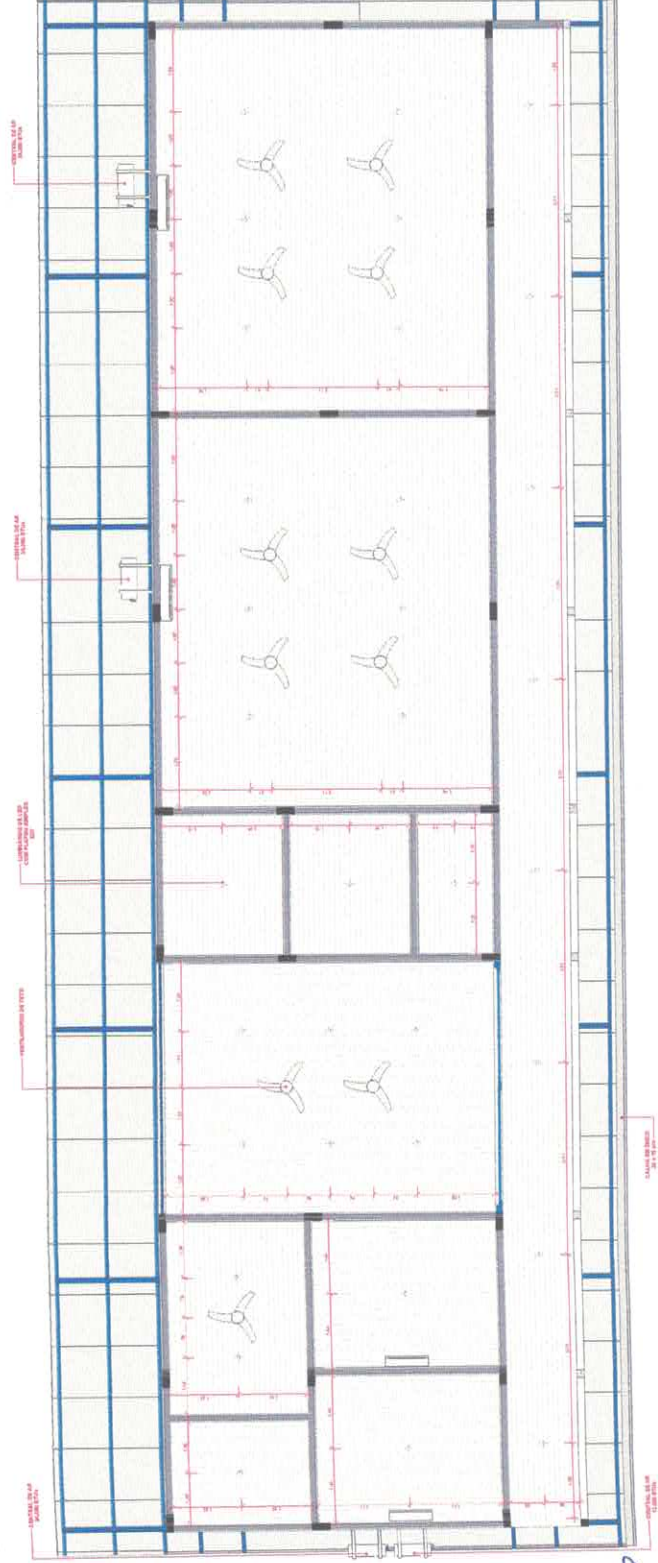

08 PLANTA DE FORRO 1:50



EDRIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VICTOR OLLAIBO DE A. O. FREIRE
CPL-2 - 15/08/2004-2

Assessor:

Caro: 1.426,34 m²
Área construída: 28,77 m²
Área útil: 14,39 m²
Área total: 29,33 m²

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ. 25.317.772/0001-82

Endereço:
RUA ANTONIO GOMES BILBY, COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
BAIRRO JARDIM DAS ARAPAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITATUBA, PARA
ÁRUA

Título do projeto:
ARQUITETURA - E.M.E.F. I. N. D. I. K. O. N. B. I. A. T. U. P. U.

[illegible]

LEGENDA DE MOBILIÁRIO		Quantidade	Observações
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

QUADRO DE ÁREAS		TOTAL EM MILH. DE HECTARE	
USO	ÁREA	USO	ÁREA
1	100	10	100
2	100	11	100
3	100	12	100
4	100	13	100
5	100	14	100
6	100	15	100
7	100	16	100
8	100	17	100
9	100	18	100
10	100	19	100
11	100	20	100
12	100	21	100
13	100	22	100
14	100	23	100
15	100	24	100
16	100	25	100
17	100	26	100
18	100	27	100
19	100	28	100
20	100	29	100
21	100	30	100
22	100	31	100
23	100	32	100
24	100	33	100
25	100	34	100
26	100	35	100
27	100	36	100
28	100	37	100
29	100	38	100
30	100	39	100
31	100	40	100
32	100	41	100
33	100	42	100
34	100	43	100
35	100	44	100
36	100	45	100
37	100	46	100
38	100	47	100
39	100	48	100
40	100	49	100
41	100	50	100
42	100	51	100
43	100	52	100
44	100	53	100
45	100	54	100
46	100	55	100
47	100	56	100
48	100	57	100
49	100	58	100
50	100	59	100
51	100	60	100
52	100	61	100
53	100	62	100
54	100	63	100
55	100	64	100
56	100	65	100
57	100	66	100
58	100	67	100
59	100	68	100
60	100	69	100
61	100	70	100
62	100	71	100
63	100	72	100
64	100	73	100
65	100	74	100
66	100	75	100
67	100	76	100
68	100	77	100
69	100	78	100
70	100	79	100
71	100	80	100
72	100	81	100
73	100	82	100
74	100	83	100
75	100	84	100
76	100	85	100
77	100	86	100
78	100	87	100
79	100	88	100
80	100	89	100
81	100	90	100
82	100	91	100
83	100	92	100
84	100	93	100
85	100	94	100
86	100	95	100
87	100	96	100
88	100	97	100
89	100	98	100
90	100	99	100
91	100	100	100

PARADES		PERFORMANCES		VOLUME	
	PARADES ON TV	CARD TOTAL	# PERFORMERS	# SLS	
1	1980-81	10,312.7	1,000	1,000	1,000
2	1981-82	10,312.7	1,000	1,000	1,000
3	1982-83	10,312.7	1,000	1,000	1,000
4	1983-84	10,312.7	1,000	1,000	1,000
5	1984-85	10,312.7	1,000	1,000	1,000
6	1985-86	10,312.7	1,000	1,000	1,000
7	1986-87	10,312.7	1,000	1,000	1,000
8	1987-88	10,312.7	1,000	1,000	1,000
9	1988-89	10,312.7	1,000	1,000	1,000
10	1989-90	10,312.7	1,000	1,000	1,000
11	1990-91	10,312.7	1,000	1,000	1,000
12	1991-92	10,312.7	1,000	1,000	1,000
13	1992-93	10,312.7	1,000	1,000	1,000
14	1993-94	10,312.7	1,000	1,000	1,000
15	1994-95	10,312.7	1,000	1,000	1,000
16	1995-96	10,312.7	1,000	1,000	1,000
17	1996-97	10,312.7	1,000	1,000	1,000
18	1997-98	10,312.7	1,000	1,000	1,000
19	1998-99	10,312.7	1,000	1,000	1,000
20	1999-00	10,312.7	1,000	1,000	1,000
21	2000-01	10,312.7	1,000	1,000	1,000
22	2001-02	10,312.7	1,000	1,000	1,000
23	2002-03	10,312.7	1,000	1,000	1,000
24	2003-04	10,312.7	1,000	1,000	1,000
25	2004-05	10,312.7	1,000	1,000	1,000
26	2005-06	10,312.7	1,000	1,000	1,000
27	2006-07	10,312.7	1,000	1,000	1,000
28	2007-08	10,312.7	1,000	1,000	1,000
29	2008-09	10,312.7	1,000	1,000	1,000
30	2009-10	10,312.7	1,000	1,000	1,000
31	2010-11	10,312.7	1,000	1,000	1,000
32	2011-12	10,312.7	1,000	1,000	1,000
33	2012-13	10,312.7	1,000	1,000	1,000
34	2013-14	10,312.7	1,000	1,000	1,000
35	2014-15	10,312.7	1,000	1,000	1,000
36	2015-16	10,312.7	1,000	1,000	1,000
37	2016-17	10,312.7	1,000	1,000	1,000
38	2017-18	10,312.7	1,000	1,000	1,000
39	2018-19	10,312.7	1,000	1,000	1,000
40	2019-20	10,312.7	1,000	1,000	1,000
41	2020-21	10,312.7	1,000	1,000	1,000
42	2021-22	10,312.7	1,000	1,000	1,000
43	2022-23	10,312.7	1,000	1,000	1,000
44	2023-24	10,312.7	1,000	1,000	1,000
45	2024-25	10,312.7	1,000	1,000	1,000
46	2025-26	10,312.7	1,000	1,000	1,000
47	2026-27	10,312.7	1,000	1,000	1,000
48	2027-28	10,312.7	1,000	1,000	1,000
49	2028-29	10,312.7	1,000	1,000	1,000
50	2029-30	10,312.7	1,000	1,000	1,000
51	2030-31	10,312.7	1,000	1,000	1,000
52	2031-32	10,312.7	1,000	1,000	1,000
53	2032-33	10,312.7	1,000	1,000	1,000
54	2033-3				

PROGOS 1 - PREGO SEM CONDIÇÃO E IMPULSO DE IDENTIFICAÇÃO 2 - PREGO SEM O RET. NA CORR. ONDA 03.00.00 3 - PREGO SEM O RET. NA CORR. ONDA 03.00.00 - ANTI-DEGRAD. P. 02.00.00 4 - PREGO SEM O RET. NA CORR. ONDA 03.00.00 - ANTI-DEGRAD. P. 02.00.00	PAREDES 1 - PAREDE COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 2 - PAREDE COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 3 - PAREDE COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 4 - PAREDE COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS	TETO 1 - TETO COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 2 - TETO COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 3 - TETO COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS 4 - TETO COM PAREDE DE LINDO LUSTRO COM VÁRIAS
--	---	--



Endereço: RUA ANTONIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
BAIRRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARA
Título do projeto: ARQUITETURA - EM.E.I.F.IND IKON BIJATPU

[illegible]

A

[illegible]

NO.	D FACTORY NO.	LABORERS		ACTUALS		PERCENT. QUANT.
		DTL	PM/DTA	DTL	PM/DTA	
		1.40		1.29	0.92	
				1.13	0.81	
				1.13	0.81	

NO	SAUING MATRYAL	RECHERCHES A. M.	RECHERCHES A. M.
10			

AL. 2000

POBRO MATERIAL

COMO TANTO

RECHERCHES

AL.







IC TYPE	VELOCITY (M/SEC)	PROFUNDITIES (M)
1	10	1000
2	20	2000
3	30	3000
4	40	4000
5	50	5000
6	60	6000
7	70	7000
8	80	8000
9	90	9000
10	100	10000





Endereço: AUA ANTONIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSMANZÔNICA
AURRO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA FREIA DO MANGUE, ITAJU
Título do projeto: PROJETURA - EM E.I.F. IND KON BILATPU

[illegible]

LEGENDA DEMOLIR e CONSTRUIR



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

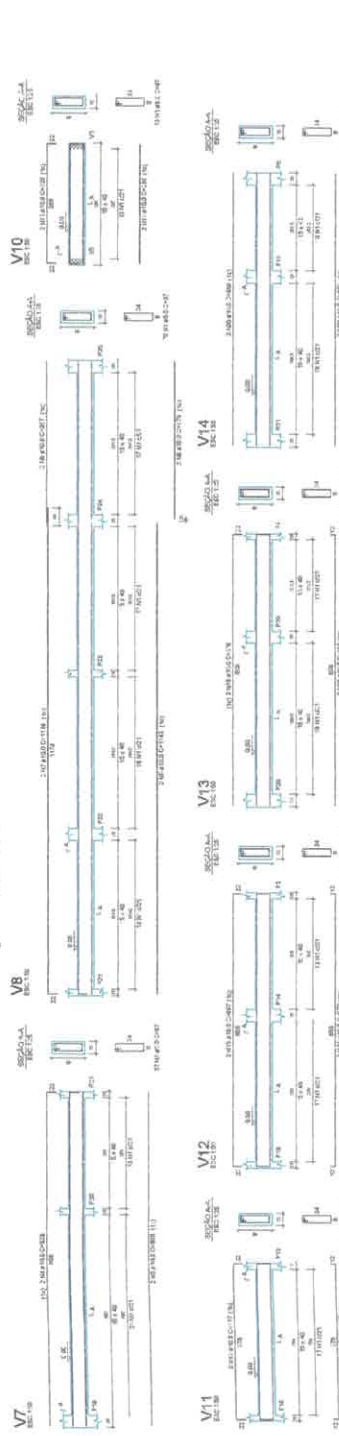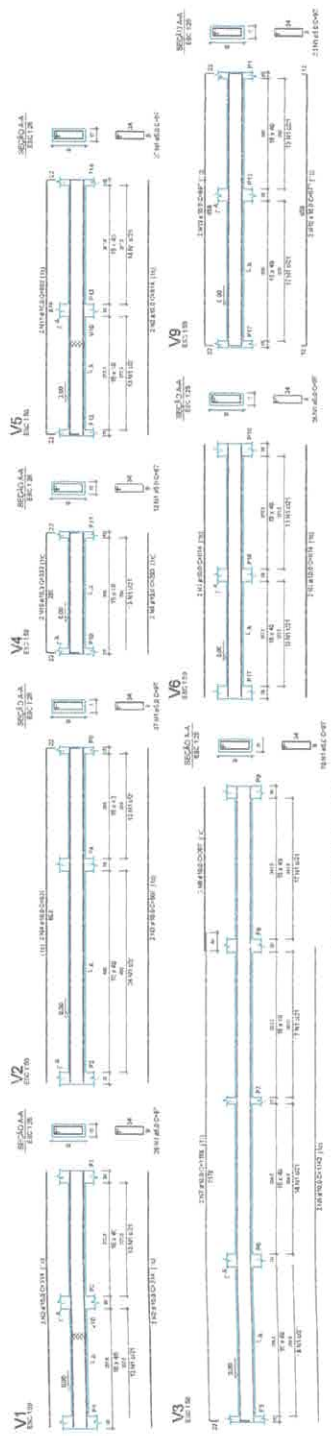

8




SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PA
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM
CENTRO - ITAITUBA - PA
CEP: 67.100-000
FONE: (91) 3611-1234
FAX: (91) 3611-1234
E-MAIL: semed@itaituba.pa.gov.br

CLIENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 25.317.772/0001-42

ENDEREÇO:
RUA ANTÔNIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
BARRO JARDIM DAS ÁRABAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARA
Título do projeto:
ESTRUTURA - E.M.E.F. F. N. K. N. B. U. T. P. U.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

1 VIGAS: TERREIRO



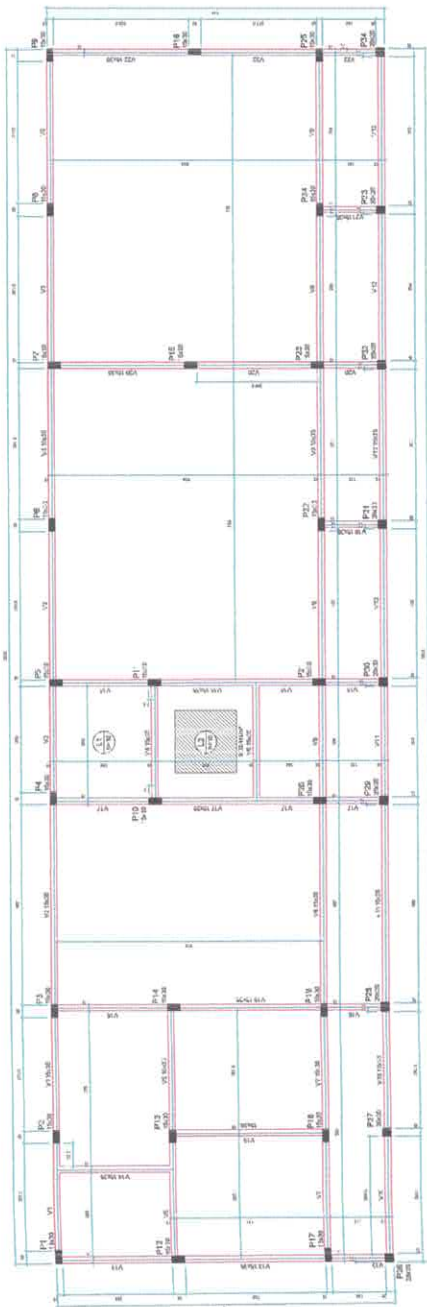


1 PLANTA DE FORMAS, VIGAS DA COBERTURA (NÍVEL 3.25)


Item	Qtd	Unidade	Valor	Valor Total	Valor Unitário
1	1	m²	1.00	1.00	1.00
2	1	m²	1.00	1.00	1.00

Item	Qtd	Unidade	Valor	Valor Total	Valor Unitário
1	1	m²	1.00	1.00	1.00
2	1	m²	1.00	1.00	1.00


Item	Qtd	Unidade	Valor	Valor Total	Valor Unitário
1	1	m²	1.00	1.00	1.00
2	1	m²	1.00	1.00	1.00
3	1	m²	1.00	1.00	1.00
4	1	m²	1.00	1.00	1.00
5	1	m²	1.00	1.00	1.00
6	1	m²	1.00	1.00	1.00
7	1	m²	1.00	1.00	1.00
8	1	m²	1.00	1.00	1.00
9	1	m²	1.00	1.00	1.00
10	1	m²	1.00	1.00	1.00
11	1	m²	1.00	1.00	1.00
12	1	m²	1.00	1.00	1.00
13	1	m²	1.00	1.00	1.00
14	1	m²	1.00	1.00	1.00
15	1	m²	1.00	1.00	1.00
16	1	m²	1.00	1.00	1.00
17	1	m²	1.00	1.00	1.00
18	1	m²	1.00	1.00	1.00
19	1	m²	1.00	1.00	1.00
20	1	m²	1.00	1.00	1.00
21	1	m²	1.00	1.00	1.00
22	1	m²	1.00	1.00	1.00
23	1	m²	1.00	1.00	1.00
24	1	m²	1.00	1.00	1.00
25	1	m²	1.00	1.00	1.00
26	1	m²	1.00	1.00	1.00
27	1	m²	1.00	1.00	1.00
28	1	m²	1.00	1.00	1.00

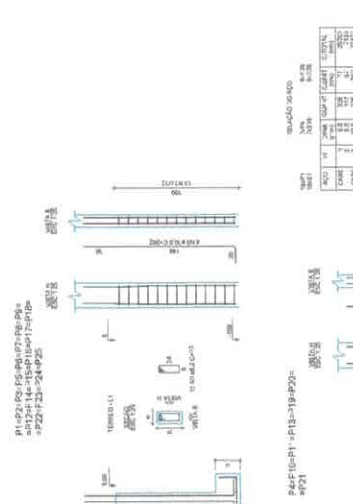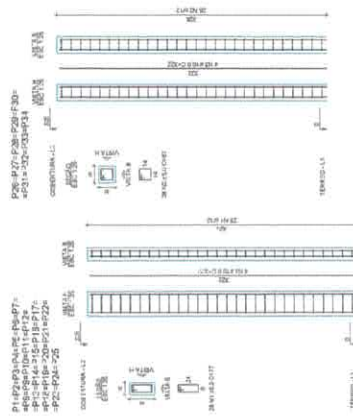


3 PLARES




2 SACAS



Prefeitura de Itaituba SEMED Secretaria Municipal de Educação	
Endereço: RUA ANTONIO GOMES BILEY, COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ÁRARIAS, ALDEIA FRIA DO MANIQUE, ITAITUBA, PARA Título de projeto: ESTRUTURA - EM E.F.F. NO MONUATU	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____ Hora: _____
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 25.317.772/0001-42	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____ Hora: _____
Endereço: RUA ANTONIO GOMES BILEY, COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA BAIRRO JARDIM DAS ÁRARIAS, ALDEIA FRIA DO MANIQUE, ITAITUBA, PARA Título de projeto: ESTRUTURA - EM E.F.F. NO MONUATU	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____ Hora: _____
Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____ Hora: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____ Hora: _____

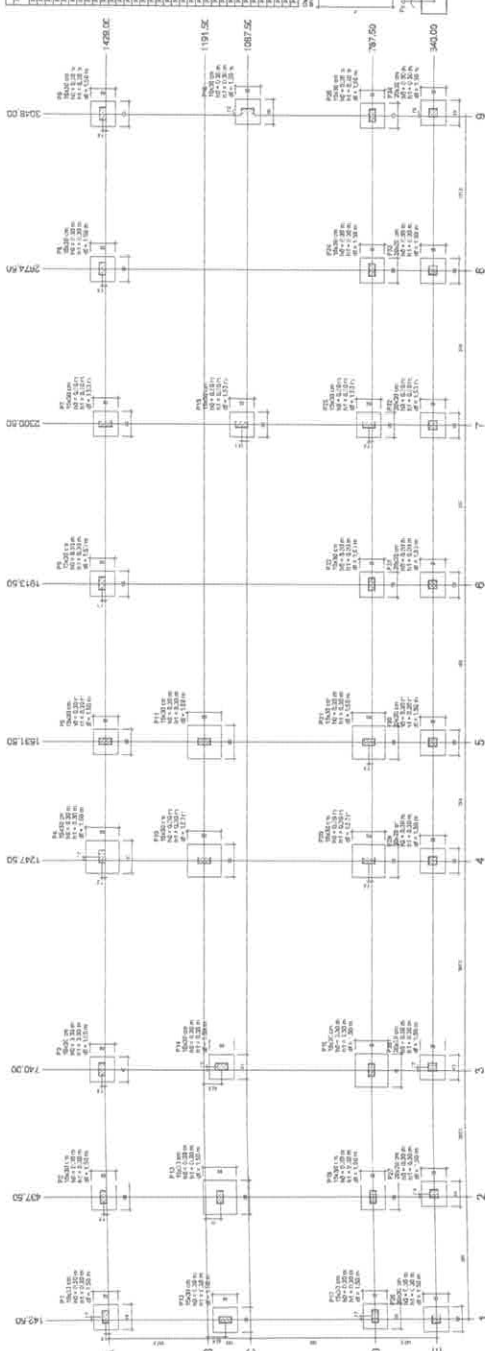[illegible]

② PLAN

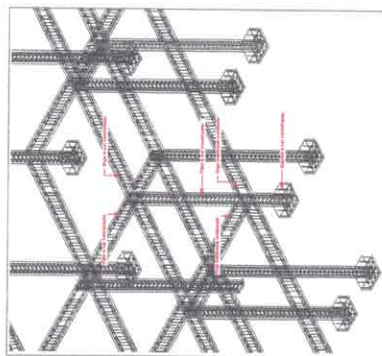[illegible]

3 DETALHE DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA EXISTENTE E O PILAR DE CONCRETO ARMADO A EXECUTAR

52



Área	Área
Terra 13.406,24 m ²	
Área Construída 28.18 m ²	
Área Expansão 12,07 m ²	
Área 2 ^a 252,73 m ²	

Unidade: 11

Endereço:
LUIZ ANTONIO GOMES RIBEIRO, AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
ARRIO JARDIM DAS ARARIAS, ALDEIA PROJA DO MANGUE, ITAITUBA PARA
TÍTULO DO PROJETO:
ESTRUTURA - E-ME/F/IND/KONJUTPU

anhang 2	3.1.10	Projektname	Stationsname
ADN	7-24-2014	Veterinär	V. der Farn
Abn.	8.1.10	Bes. Abn.	C. von der Farn
	1.1.10	Extrem	4-12.1.10
	- 01.1.10		5-12.1.10
Gestrichen			

Lista de Materiais	
Quantidade	Unidade
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Torneiras (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCA	In' (A)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Luminárias	F+N	B1	127 V	46	36	1656	2179	1656	1656	1656	1,00	0,54	4,20	20,0	1,14	2,92	Ok
2	Torneiras de Uso Geral 127V	F+N+T	B1	127 V		28	3111	3111	2800	2800	2800	1,00	0,54	4,20	20,0	0,96	2,74	Ok
3	Torneiras de Uso Específico 220V	F+N+T	B1	220 V		3	333	333	300	300	300	1,00	0,54	4,20	10,0	0,07	1,85	Ok
4	AVC Administração	F+N+T	B1	220 V		1	2889	2889	2600	2600	2600	1,00	0,54	4,20	16,0	1,17	2,84	Ok
5	AVC Secretaria	F+N+T	B1	220 V		1	2889	2889	2600	2600	2600	1,00	0,54	4,20	16,0	1,17	2,84	Ok
6	AVC Sala - 01	F+N+T	B1	220 V		1	4000	4000	3600	3600	3600	1,00	0,54	4,20	20,0	0,75	2,52	Ok
7	AVC Sala - 02	F+N+T	B1	220 V		1	4000	4000	3600	3600	3600	1,00	0,54	4,20	20,0	0,75	2,52	Ok
8	Luminária de emergência	F+N	B1	127 V	7		28	28	14	14	14	1,00	0,54	4,20	20,0	1,78	1,78	Ok
9	Reservatório	F+N	B1	220 V			0	0	0	0	0	1,00	1,00	0,0	1,5	23,0	10,0	Ok
TOTAL					46	31	2	19401	17156	8020	0						1,78	Ok

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's	5,62	45	2,53
Condicionador de Ar Frio (residência)	13,78	100	13,78
TOTAL			16,31

DIAGRAMA MULTIFILAR QD1


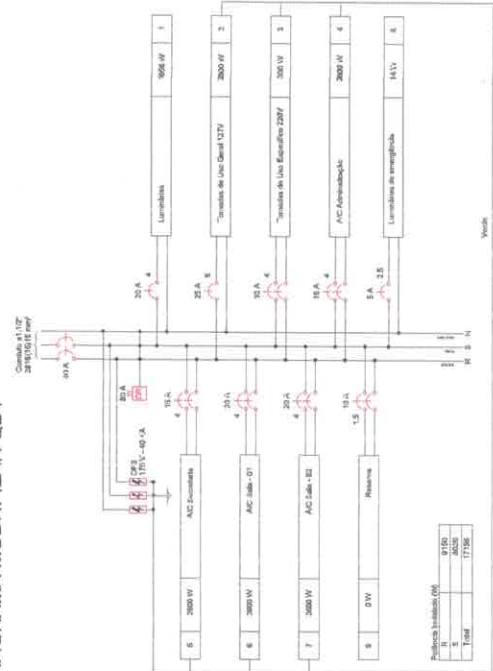


DIAGRAMA UNIFILAR QD1







Nome: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 CEP: _____
 Telefone: _____
 E-mail: _____
 Assinatura: _____
 Data: _____


Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 25.317.772/0001-82
 Endereço: RUA ANTÔNIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSMANZONICA
 BAIRRO JARDIM DAS ÁRABAS, ALDEIA PRIMA DO MANGUE, ITAITUBA PARA
 ELETRICO - E.M.E.F. JOAO BATISTA

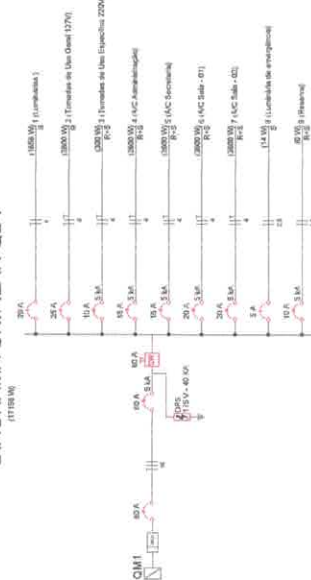

CALCAMENTO ESTERNO

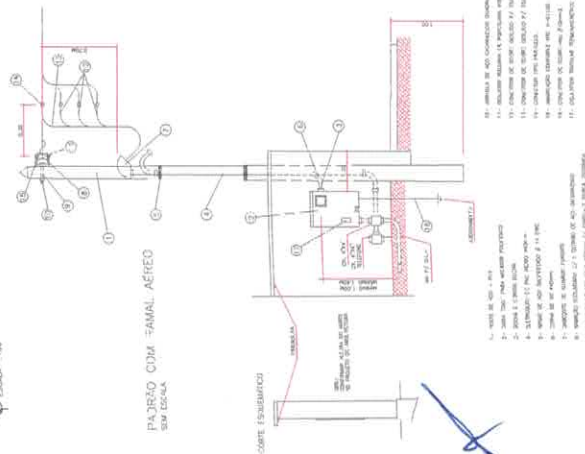

DETALHE DA CONEXÃO DO CABO
COM A HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA.





Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED



Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de Itaituba



SEMED

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Itaituba

SEMED

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Itaituba

SEMED

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Itaituba


SEMED

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Itaituba



01 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
ESC. 1:300

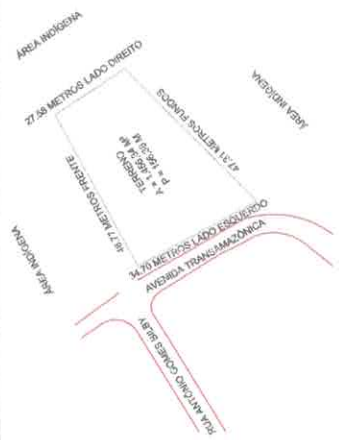

02 PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRENO
ESC. 1:750



02 CURVAS DE NÍVEL
ESC. 1:750

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

FRENTE : ÁREA INDÍGENA
LATERAL DIREITA : ÁREA INDÍGENA
LATERAL ESQUERDA : AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
FUNDOS : ÁREA INDÍGENA

COORDENADAS

P01 - 21M
4°15'32.80"S
55°58'22.50"O

LEGENDA

- RUA/ACESSO
- DRENAGEM
- CANCELAMENTO
- MURTO
- TUBULAÇÃO PLUVIAL
- VERTICIZANTES
- MURTO PLUVIAL
- PONTO DE COTA
- POSTE SIMPLES
- POSTE DE PARADA DE VEÍCULO
- BOCA DE LÓGICA
- RUA/ACESSO
- DRENAGEM
- MURTO
- TUBULAÇÃO PLUVIAL
- VERTICIZANTES
- MURTO PLUVIAL
- PONTO DE COTA
- LOCALIZAÇÃO DO NÍVEL DA MARÉ






LEGENDA	DADOS TÉCNICOS	OBSERVAÇÕES	ALTERAÇÕES	TOPOGRAFIA
TERRENO DA ESCOLA KON BUATPU				LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
1 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA				
2 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRENO				
3 - CURVAS DE NÍVEL				
FOLHA 001				001

[illegible][illegible]

LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS			
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor unitário
100	Condutor de cobre, 1/2" x 1/2"	m	1,20
100	Condutor de cobre, 3/4" x 3/4"	m	1,50
100	Condutor de cobre, 1" x 1"	m	1,80
100	Condutor de cobre, 1 1/4" x 1 1/4"	m	2,10
100	Condutor de cobre, 1 1/2" x 1 1/2"	m	2,40
100	Condutor de cobre, 2" x 2"	m	2,80
100	Condutor de cobre, 2 1/2" x 2 1/2"	m	3,20
100	Condutor de cobre, 3" x 3"	m	3,60
100	Condutor de cobre, 3 1/2" x 3 1/2"	m	4,00
100	Condutor de cobre, 4" x 4"	m	4,40
100	Condutor de cobre, 4 1/2" x 4 1/2"	m	4,80
100	Condutor de cobre, 5" x 5"	m	5,20
100	Condutor de cobre, 5 1/2" x 5 1/2"	m	5,60
100	Condutor de cobre, 6" x 6"	m	6,00
100	Condutor de cobre, 6 1/2" x 6 1/2"	m	6,40
100	Condutor de cobre, 7" x 7"	m	6,80
100	Condutor de cobre, 7 1/2" x 7 1/2"	m	7,20
100	Condutor de cobre, 8" x 8"	m	7,60
100	Condutor de cobre, 8 1/2" x 8 1/2"	m	8,00
100	Condutor de cobre, 9" x 9"	m	8,40
100	Condutor de cobre, 9 1/2" x 9 1/2"	m	8,80
100	Condutor de cobre, 10" x 10"	m	9,20
100	Condutor de cobre, 10 1/2" x 10 1/2"	m	9,60
100	Condutor de cobre, 11" x 11"	m	10,00
100	Condutor de cobre, 11 1/2" x 11 1/2"	m	10,40
100	Condutor de cobre, 12" x 12"	m	10,80
100	Condutor de cobre, 12 1/2" x 12 1/2"	m	11,20
100	Condutor de cobre, 13" x 13"	m	11,60
100	Condutor de cobre, 13 1/2" x 13 1/2"	m	12,00
100	Condutor de cobre, 14" x 14"	m	12,40
100	Condutor de cobre, 14 1/2" x 14 1/2"	m	12,80
100	Condutor de cobre, 15" x 15"	m	13,20
100	Condutor de cobre, 15 1/2" x 15 1/2"	m	13,60
100	Condutor de cobre, 16" x 16"	m	14,00
100	Condutor de cobre, 16 1/2" x 16 1/2"	m	14,40
100	Condutor de cobre, 17" x 17"	m	14,80
100	Condutor de cobre, 17 1/2" x 17 1/2"	m	15,20
100	Condutor de cobre, 18" x 18"	m	15,60
100	Condutor de cobre, 18 1/2" x 18 1/2"	m	16,00
100	Condutor de cobre, 19" x 19"	m	16,40
100	Condutor de cobre, 19 1/2" x 19 1/2"	m	16,80
100	Condutor de cobre, 20" x 20"	m	17,20
100	Condutor de cobre, 20 1/2" x 20 1/2"	m	17,60
100	Condutor de cobre, 21" x 21"	m	18,00
100	Condutor de cobre, 21 1/2" x 21 1/2"	m	18,40
100	Condutor de cobre, 22" x 22"	m	18,80
100	Condutor de cobre, 22 1/2" x 22 1/2"	m	19,20
100	Condutor de cobre, 23" x 23"	m	19,60
100	Condutor de cobre, 23 1/2" x 23 1/2"	m	20,00
100	Condutor de cobre, 24" x 24"	m	20,40
100	Condutor de cobre, 24 1/2" x 24 1/2"	m	20,80
100	Condutor de cobre, 25" x 25"	m	21,20
100	Condutor de cobre, 25 1/2" x 25 1/2"	m	21,60
100	Condutor de cobre, 26" x 26"	m	22,00
100	Condutor de cobre, 26 1/2" x 26 1/2"	m	22,40
100	Condutor de cobre, 27" x 27"	m	22,80
100	Condutor de cobre, 27 1/2" x 27 1/2"	m	23,20
100	Condutor de cobre, 28" x 28"	m	23,60
100	Condutor de cobre, 28 1/2" x 28 1/2"	m	24,00
100	Condutor de cobre, 29" x 29"	m	24,40
100	Condutor de cobre, 29 1/2" x 29 1/2"	m	24,80
100	Condutor de cobre, 30" x 30"	m	25,20
100	Condutor de cobre, 30 1/2" x 30 1/2"	m	25,60
100	Condutor de cobre, 31" x 31"	m	26,00
100	Condutor de cobre, 31 1/2" x 31 1/2"	m	26,40
100	Condutor de cobre, 32" x 32"	m	26,80
100	Condutor de cobre, 32 1/2" x 32 1/2"	m	27,20
100	Condutor de cobre, 33" x 33"	m	27,60
100	Condutor de cobre, 33 1/2" x 33 1/2"	m	28,00
100	Condutor de cobre, 34" x 34"	m	28,40
100	Condutor de cobre, 34 1/2" x 34 1/2"	m	28,80
100	Condutor de cobre, 35" x 35"	m	29,20
100	Condutor de cobre, 35 1/2" x 35 1/2"	m	29,60
100	Condutor de cobre, 36" x 36"	m	30,00
100	Condutor de cobre, 36 1/2" x 36 1/2"	m	30,40
100	Condutor de cobre, 37" x 37"	m	30,80
100	Condutor de cobre, 37 1/2" x 37 1/2"	m	31,20
100	Condutor de cobre, 38" x 38"	m	31,60
100	Condutor de cobre, 38 1/2" x 38 1/2"	m	32,00
100	Condutor de cobre, 39" x 39"	m	32,40
100	Condutor de cobre, 39 1/2" x 39 1/2"	m	32,80
100	Condutor de cobre, 40" x 40"	m	33,20
100	Condutor de cobre, 40 1/2" x 40 1/2"	m	33,60
100	Condutor de cobre, 41" x 41"	m	34,00
100	Condutor de cobre, 41 1/2" x 41 1/2"	m	34,40
100	Condutor de cobre, 42" x 42"	m	34,80
100	Condutor de cobre, 42 1/2" x 42 1/2"	m	35,20
100	Condutor de cobre, 43" x 43"	m	35,60
100	Condutor de cobre, 43 1/2" x 43 1/2"	m	36,00
100	Condutor de cobre, 44" x 44"	m	36,40
100	Condutor de cobre, 44 1/2" x 44 1/2"	m	36,80
100	Condutor de cobre, 45" x 45"	m	37,20
100	Condutor de cobre, 45 1/2" x 45 1/2"	m	37,60
100	Condutor de cobre, 46" x 46"	m	38,00
100	Condutor de cobre, 46 1/2" x 46 1/2"	m	38,40
100	Condutor de cobre, 47" x 47"	m	38,80
100	Condutor de cobre, 47 1/2" x 47 1/2"	m	39,20
100	Condutor de cobre, 48" x 48"	m	39,60
100	Condutor de cobre, 48 1/2" x 48 1/2"	m	40,00
100	Condutor de cobre, 49" x 49"	m	40,40
100	Condutor de cobre, 49 1/2" x 49 1/2"	m	40,80
100	Condutor de cobre, 50" x 50"	m	41,20
100	Condutor de cobre, 50 1/2" x 50 1/2"	m	41,60
100	Condutor de cobre, 51" x 51"	m	42,00
100	Condutor de cobre, 51 1/2" x 51 1/2"	m	42,40
100	Condutor de cobre, 52" x 52"	m	42,80
100	Condutor de cobre, 52 1/2" x 52 1/2"	m	43,20
100	Condutor de cobre, 53" x 53"	m	43,60
100	Condutor de cobre, 53 1/2" x 53 1/2"	m	44,00
100	Condutor de cobre, 54" x 54"	m	44,40
100	Condutor de cobre, 54 1/2" x 54 1/2"	m	44,80
100	Condutor de cobre, 55" x 55"	m	45,20
100	Condutor de cobre, 55 1/2" x 55 1/2"	m	45,60
100	Condutor de cobre, 56" x 56"	m	46,00
100	Condutor de cobre, 56 1/2" x 56 1/2"	m	46,40
100	Condutor de cobre, 57" x 57"	m	46,80
100	Condutor de cobre, 57 1/2" x 57 1/2"	m	47,20
100	Condutor de cobre, 58" x 58"	m	47,60
100	Condutor de cobre, 58 1/2" x 58 1/2"	m	48,00
100	Condutor de cobre, 59" x 59"	m	48,40
100	Condutor de cobre, 59 1/2" x 59 1/2"	m	48,80
100	Condutor de cobre, 60" x 60"	m	49,20
100	Condutor de cobre, 60 1/2" x 60 1/2"	m	49,60
100	Condutor de cobre, 61" x 61"	m	50,00
100	Condutor de cobre, 61 1/2" x 61 1/2"	m	50,40
100	Condutor de cobre, 62" x 62"	m	50,80
100	Condutor de cobre, 62 1/2" x 62 1/2"	m	51,20
100	Condutor de cobre, 63" x 63"	m	51,60
100	Condutor de cobre, 63 1/2" x 63 1/2"	m	52,00
100	Condutor de cobre, 64" x 64"	m	52,40
100	Condutor de cobre, 64 1/2" x 64 1/2"	m	52,80
100	Condutor de cobre, 65" x 65"	m	53,20
100	Condutor de cobre, 65 1/2" x 65 1/2"	m	53,60
100	Condutor de cobre, 66" x 66"	m	54,00
100	Condutor de cobre, 66 1/2" x 66 1/2"	m	54,40
100	Condutor de cobre, 67" x 67"	m	54,80
100	Condutor de cobre, 67 1/2" x 67 1/2"	m	55,20
100	Condutor de cobre, 68" x 68"	m	55,60
100	Condutor de cobre, 68 1/2" x 68 1/2"	m	56,00
100	Condutor de cobre, 69" x 69"	m	56,40
100	Condutor de cobre, 69 1/2" x 69 1/2"	m	56,80
100	Condutor de cobre, 70" x 70"	m	57,20
100	Condutor de cobre, 70 1/2" x 70 1/2"	m	57,60
100	Condutor de cobre, 71" x 71"	m	58,00
100	Condutor de cobre, 71 1/2" x 71 1/2"	m	58,40
100	Condutor de cobre, 72" x 72"	m	58,80
100	Condutor de cobre, 72 1/2" x 72 1/2"	m	59,20
100	Condutor de cobre, 73" x 73"	m	59,60
100	Condutor de cobre, 73 1/2" x 73 1/2"	m	60,00
100	Condutor de cobre, 74" x 74"	m	60,40
100	Condutor de cobre, 74 1/2" x 74 1/2"	m	60,80
100	Condutor de cobre, 75" x 75"	m	61,20
100	Condutor de cobre, 75 1/2" x 75 1/2"	m	61,60
100	Condutor de cobre, 76" x 76"	m	62,00
100	Condutor de cobre, 76 1/2" x 76 1/2"	m	62,40
100	Condutor de cobre, 77" x 77"	m	62,80
100	Condutor de cobre, 77 1/2" x 77 1/2"	m	63,20
100	Condutor de cobre, 78" x 78"	m	63,60
100	Condutor de cobre, 78 1/2" x 78 1/2"	m	64,00
100	Condutor de cobre, 79" x 79"	m	64,40
100	Condutor de cobre, 79 1/2" x 79 1/2"	m	64,80
100	Condutor de cobre, 80" x 80"	m	65,20
100	Condutor de cobre, 80 1/2" x 80 1/2"	m	65,60
100	Condutor de cobre, 81" x 81"	m	66,00
100	Condutor de cobre, 81 1/2" x 81 1/2"	m	66,40
100	Condutor de cobre, 82" x 82"	m	66,80
100	Condutor de cobre, 82 1/2" x 82 1/2"	m	67,20
100	Condutor de cobre, 83" x 83"	m	67,60
100	Condutor de cobre, 83 1/2" x 83 1/2"	m	68,00
100	Condutor de cobre, 84" x 84"	m	68,40
100	Condutor de cobre, 84 1/2" x 84 1/2"	m	68,80
100	Condutor de cobre, 85" x 85"	m	69,20
100	Condutor de cobre, 85 1/2" x 85 1/2"	m	69,60
100	Condutor de cobre, 86" x 86"	m	70,00
100	Condutor de cobre, 86 1/2" x 86 1/2"	m	70,40
100	Condutor de cobre, 87" x 87"	m	70,80
100	Condutor de cobre, 87 1/2" x 87 1/2"	m	71,20
100	Condutor de cobre, 88" x 88"	m	71,60
100	Condutor de cobre, 88 1/2" x 88 1/2"	m	72,00
100	Condutor de cobre, 89" x 89"	m	72,40
100	Condutor de cobre, 89 1/2" x 89 1/2"	m	72,80
100	Condutor de cobre, 90" x 90"	m	73,20
100	Condutor de cobre, 90 1/2" x 90 1/2"	m	73,60
100	Condutor de cobre, 91" x 91"	m	74,00
100	Condutor de cobre, 91 1/2" x 91 1/2"	m	74,40
100	Condutor de cobre, 92" x 92"	m	74,80
100	Condutor de cobre, 92 1/2" x 92 1/2"	m	75,20
100	Condutor de cobre, 93" x 93"	m	75,60
100	Condutor de cobre, 93 1/2" x 93 1/2"	m	76,00
100	Condutor de cobre, 94" x 94"	m	76,40
100	Condutor de cobre, 94 1/2" x 94 1/2"	m	76,80
100	Condutor de cobre, 95" x 95"	m	77,20
100	Condutor de cobre, 95 1/2" x 95 1/2"	m	77,60
100	Condutor de cobre, 96" x 96"	m	78,00
100	Condutor de cobre, 96 1/2" x 96 1/2"	m	78,40
100	Condutor de cobre, 97" x 97"	m	78,80
100	Condutor de cobre, 97 1/2" x 97 1/2"	m	79,20
100	Condutor de cobre, 98" x 98"	m	79,60
100	Condutor de cobre, 98 1/2" x 98 1/2"	m	80,00
100	Condutor de cobre, 99" x 99"	m	80,40
100	Condutor de cobre, 99 1/2" x 99 1/2"	m	80,80
100	Condutor de cobre, 100" x 100"	m	81,20
100	Condutor de cobre, 100 1/2" x 100 1/2"	m	81,60
100	Condutor de cobre, 101" x 101"	m	82,00
100	Condutor de cobre, 101 1/2" x 101 1/2"	m	82,40
100	Condutor de cobre, 102" x 102"	m	82,80
100	Condutor de cobre, 102 1/2" x 102 1/2"	m	83,20
100	Condutor de cobre, 103" x 103"	m	83,60
100	Condutor de cobre, 103 1/2" x 103 1/2"	m	84,00
100	Condutor de cobre, 104" x 104"	m	84,40
100	Condutor de cobre, 104 1/2" x 104 1/2"	m	84,80
100	Condutor de cobre, 105" x 105"	m	85,20
100	Condutor de cobre, 105 1/2" x 105 1/2"	m	85,60
100	Condutor de cobre, 106" x 106"	m	86,00
100	Condutor de cobre, 106 1/2" x 106 1/2"	m	86,40
100	Condutor de cobre, 107" x 107"	m	86,80
100	Condutor de cobre, 107 1/2" x 107 1/2"	m	87,20
100	Condutor de cobre, 108" x 108"	m	87,60
100	Condutor de cobre, 108 1/2" x 108 1/2"	m	88,00
100	Condutor de cobre, 109" x 109"	m	88,40
100	Condutor de cobre, 109 1/2" x 109 1/2"	m	88,80
100	Condutor de cobre, 110" x 110"	m	89,20
100	Condutor de cobre, 110 1/2" x 110 1/2"	m	89,60
100	Condutor de cobre, 111" x 111"	m	90,00
100	Condutor de cobre, 111 1/2" x 111 1/2"	m	90,40
100	Condutor de cobre, 112" x 112"	m	90,80
100	Condutor de cobre, 112 1/2" x 112 1/2"	m	91,20
100	Condutor de cobre, 113" x 113"	m	91,60
100	Condutor de cobre, 113 1/2" x 113 1/2"	m	92,00
100	Condutor de cobre, 114" x 114"	m	92,40
100	Condutor de cobre, 114 1/2" x 114 1/2"	m	92,80
100	Condutor de cobre, 115" x 115"	m	93,20
100	Condutor de cobre, 115 1/2" x 115 1/2"	m	93,60
100	Condutor de cobre, 116" x 116"	m	94,00
100	Condutor de cobre, 116 1/2" x 116 1/2"	m	94,40
100	Condutor de cobre, 117" x 117"	m	94,80
100	Condutor de cobre, 117 1/2" x 117 1/2"	m	95,20
100	Condutor de cobre, 118" x 118"	m	95,60
100	Condutor de cobre, 118 1/2" x 118 1/2"	m	96,00
100	Condutor de cobre, 119" x 119"	m	96,40
100	Condutor de cobre, 119 1/2" x 119 1/2"	m	96,80
100	Condutor de cobre, 120" x 120"	m	97,20
100	Condutor de cobre, 120 1/2" x 120 1/2"	m	97,60
100	Condutor de cobre, 121" x 121"	m	98,00
100	Condutor de cobre, 121 1/2" x 121 1/2"	m	98,40
100	Condutor de cobre, 122" x 122"	m	98,80
100	Condutor de cobre, 122 1/2" x 122 1/2"	m	99,20
100	Condutor de cobre, 123" x 123"	m	99,60
100	Condutor de cobre, 123 1/2" x 123 1/2"	m	100,00
100	Condutor de cobre, 124" x 124"	m	100,40
100	Condutor de cobre, 124 1/2" x 124 1/2"		

QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (ELETRICIDADES)			
Cabo UTP de Cat 6	Cabo UTP de Cat 5	Cabo UTP de Cat 4	
1,20	10,10		11,30


	Adults: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
	Adults: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
	Adults: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

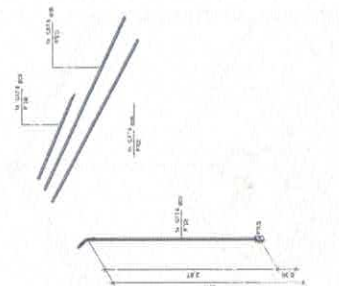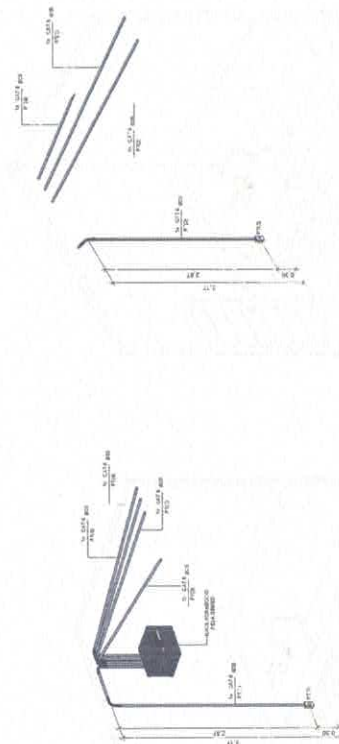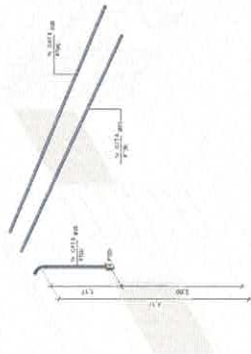[illegible][illegible]

1. **QUESTION**
 2. **ANSWER**
 3. **QUESTION**
 4. **ANSWER**
 5. **QUESTION**
 6. **ANSWER**
 7. **QUESTION**
 8. **ANSWER**
 9. **QUESTION**
 10. **ANSWER**
 11. **QUESTION**
 12. **ANSWER**
 13. **QUESTION**
 14. **ANSWER**
 15. **QUESTION**
 16. **ANSWER**
 17. **QUESTION**
 18. **ANSWER**
 19. **QUESTION**
 20. **ANSWER**
 21. **QUESTION**
 22. **ANSWER**
 23. **QUESTION**
 24. **ANSWER**
 25. **QUESTION**
 26. **ANSWER**
 27. **QUESTION**
 28. **ANSWER**
 29. **QUESTION**
 30. **ANSWER**
 31. **QUESTION**
 32. **ANSWER**
 33. **QUESTION**
 34. **ANSWER**
 35. **QUESTION**
 36. **ANSWER**
 37. **QUESTION**
 38. **ANSWER**
 39. **QUESTION**
 40. **ANSWER**
 41. **QUESTION**
 42. **ANSWER**
 43. **QUESTION**
 44. **ANSWER**
 45. **QUESTION**
 46. **ANSWER**
 47. **QUESTION**
 48. **ANSWER**
 49. **QUESTION**
 50. **ANSWER**
 51. **QUESTION**
 52. **ANSWER**
 53. **QUESTION**
 54. **ANSWER**
 55. **QUESTION**
 56. **ANSWER**
 57. **QUESTION**
 58. **ANSWER**
 59. **QUESTION**
 60. **ANSWER**
 61. **QUESTION**
 62. **ANSWER**
 63. **QUESTION**
 64. **ANSWER**
 65. **QUESTION**
 66. **ANSWER**
 67. **QUESTION**
 68. **ANSWER**
 69. **QUESTION**
 70. **ANSWER**
 71. **QUESTION**
 72. **ANSWER**
 73. **QUESTION**
 74. **ANSWER**
 75. **QUESTION**
 76. **ANSWER**
 77. **QUESTION**
 78. **ANSWER**
 79. **QUESTION**
 80. **ANSWER**
 81. **QUESTION**
 82. **ANSWER**
 83. **QUESTION**
 84. **ANSWER**
 85. **QUESTION**
 86. **ANSWER**
 87. **QUESTION**
 88. **ANSWER**
 89. **QUESTION**
 90. **ANSWER**
 91. **QUESTION**
 92. **ANSWER**
 93. **QUESTION**
 94. **ANSWER**
 95. **QUESTION**
 96. **ANSWER**
 97. **QUESTION**
 98. **ANSWER**
 99. **QUESTION**
 100. **ANSWER**

[illegible][illegible]


CORTE BEBEDOURO
1:25

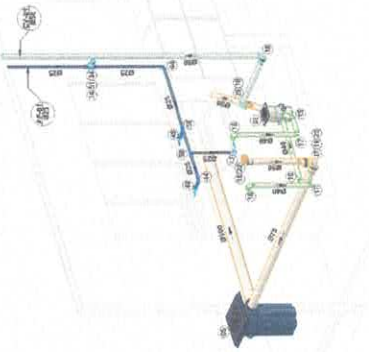

**PERSPECTIVA COZINHA E ÁREA DE
SERVIÇO**



PERSPECTIVA 3D BANHEIROS

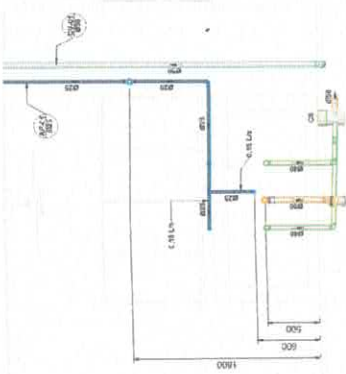

CORTE COZINHA
1:25



CORTE ÁREA DE SERVIÇO
1-25



PROJ. ORÇAMENTO DE A.S. - PARECE NÃO SE ENQUADRAR ANEXO 1 - A.S. - RESOLUÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	Valor: 1.620.314,00 Valor Estimado: 281.714,00 Valor Líquido: 1.338.600,00 Valor Total: 4.022.232,00	Valor: 1.620.314,00 Valor Estimado: 281.714,00 Valor Líquido: 1.338.600,00 Valor Total: 4.022.232,00
--	--	--

1. **CLIMATE** - THE CLIMATE OF A COUNTRY
 2. **WATER** - THE WATER OF A COUNTRY
 3. **FOREST** - THE FOREST OF A COUNTRY
 4. **PLANT** - THE PLANT OF A COUNTRY
 5. **ANIMAL** - THE ANIMAL OF A COUNTRY
 6. **MINERAL** - THE MINERAL OF A COUNTRY
 7. **INDUSTRY** - THE INDUSTRY OF A COUNTRY
 8. **POPULATION** - THE POPULATION OF A COUNTRY
 9. **ECONOMY** - THE ECONOMY OF A COUNTRY
 10. **CULTURE** - THE CULTURE OF A COUNTRY
 11. **RELIGION** - THE RELIGION OF A COUNTRY
 12. **LANGUAGE** - THE LANGUAGE OF A COUNTRY
 13. **GOVERNMENT** - THE GOVERNMENT OF A COUNTRY
 14. **LEGAL SYSTEM** - THE LEGAL SYSTEM OF A COUNTRY
 15. **EDUCATION** - THE EDUCATION OF A COUNTRY
 16. **HEALTH CARE** - THE HEALTH CARE OF A COUNTRY
 17. **INFRASTRUCTURE** - THE INFRASTRUCTURE OF A COUNTRY
 18. **TRANSPORTATION** - THE TRANSPORTATION OF A COUNTRY
 19. **ENERGY** - THE ENERGY OF A COUNTRY
 20. **ENVIRONMENT** - THE ENVIRONMENT OF A COUNTRY
 21. **SCIENCE** - THE SCIENCE OF A COUNTRY
 22. **TECHNOLOGY** - THE TECHNOLOGY OF A COUNTRY
 23. **ARTS** - THE ARTS OF A COUNTRY
 24. **LITERATURE** - THE LITERATURE OF A COUNTRY
 25. **MUSIC** - THE MUSIC OF A COUNTRY
 26. **DANCE** - THE DANCE OF A COUNTRY
 27. **THEATRE** - THE THEATRE OF A COUNTRY
 28. **SPORTS** - THE SPORTS OF A COUNTRY
 29. **RELIGIOUS BELIEFS** - THE RELIGIOUS BELIEFS OF A COUNTRY
 30. **ETHICS** - THE ETHICS OF A COUNTRY
 31. **MORALS** - THE MORALS OF A COUNTRY
 32. **VALUES** - THE VALUES OF A COUNTRY
 33. **TRADITIONS** - THE TRADITIONS OF A COUNTRY
 34. **Customs** - THE CUSTOMS OF A COUNTRY
 35. **Beliefs** - THE BELIEFS OF A COUNTRY
 36. **Attitudes** - THE ATTITUDES OF A COUNTRY
 37. **Opinions** - THE OPINIONS OF A COUNTRY
 38. **Preferences** - THE PREFERENCES OF A COUNTRY
 39. **Interests** - THE INTERESTS OF A COUNTRY
 40. **Concerns** - THE CONCERNS OF A COUNTRY
 41. **Goals** - THE GOALS OF A COUNTRY
 42. **Objectives** - THE OBJECTIVES OF A COUNTRY
 43. **Policies** - THE POLICIES OF A COUNTRY
 44. **Strategies** - THE STRATEGIES OF A COUNTRY
 45. **Plans** - THE PLANS OF A COUNTRY
 46. **Programs** - THE PROGRAMS OF A COUNTRY
 47. **Projects** - THE PROJECTS OF A COUNTRY
 48. **Initiatives** - THE INITIATIVES OF A COUNTRY
 49. **Actions** - THE ACTIONS OF A COUNTRY
 50. **Measures** - THE MEASURES OF A COUNTRY
 51. **Steps** - THE STEPS OF A COUNTRY
 52. **Procedures** - THE PROCEDURES OF A COUNTRY
 53. **Processes** - THE PROCESSES OF A COUNTRY
 54. **Methods** - THE METHODS OF A COUNTRY
 55. **Techniques** - THE TECHNIQUES OF A COUNTRY
 56. **Skills** - THE SKILLS OF A COUNTRY
 57. **Abilities** - THE ABILITIES OF A COUNTRY
 58. **Capabilities** - THE CAPABILITIES OF A COUNTRY
 59. **Resources** - THE RESOURCES OF A COUNTRY
 60. **Assets** - THE ASSETS OF A COUNTRY
 61. **Liabilities** - THE LIABILITIES OF A COUNTRY
 62. **Equity** - THE EQUITY OF A COUNTRY
 63. **Debt** - THE DEBT OF A COUNTRY
 64. **Income** - THE INCOME OF A COUNTRY
 65. **Expenditure** - THE EXPENDITURE OF A COUNTRY
 66. **Revenue** - THE REVENUE OF A COUNTRY
 67. **Costs** - THE COSTS OF A COUNTRY
 68. **Profits** - THE PROFITS OF A COUNTRY
 69. **Losses** - THE LOSSES OF A COUNTRY
 70. **Investment** - THE INVESTMENT OF A COUNTRY
 71. **Savings** - THE SAVINGS OF A COUNTRY
 72. **Spending** - THE SPENDING OF A COUNTRY
 73. **Consumption** - THE CONSUMPTION OF A COUNTRY
 74. **Production** - THE PRODUCTION OF A COUNTRY
 75. **Distribution** - THE DISTRIBUTION OF A COUNTRY
 76. **Exchange** - THE EXCHANGE OF A COUNTRY
 77. **Trade** - THE TRADE OF A COUNTRY
 78. **Imports** - THE IMPORTS OF A COUNTRY
 79. **Exports** - THE EXPORTS OF A COUNTRY
 80. **Balance of Trade** - THE BALANCE OF TRADE OF A COUNTRY
 81. **Balance of Payments** - THE BALANCE OF PAYMENTS OF A COUNTRY
 82. **Current Account** - THE CURRENT ACCOUNT OF A COUNTRY
 83. **Capital Account** - THE CAPITAL ACCOUNT OF A COUNTRY
 84. **Financial Account** - THE FINANCIAL ACCOUNT OF A COUNTRY
 85. **Trade Deficit** - THE TRADE DEFICIT OF A COUNTRY
 86. **Trade Surplus** - THE TRADE SURPLUS OF A COUNTRY
 87. **Current Account Deficit** - THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 88. **Current Account Surplus** - THE CURRENT ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY
 89. **Capital Account Deficit** - THE CAPITAL ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 90. **Capital Account Surplus** - THE CAPITAL ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY
 91. **Financial Account Deficit** - THE FINANCIAL ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 92. **Financial Account Surplus** - THE FINANCIAL ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY
 93. **Trade Deficit** - THE TRADE DEFICIT OF A COUNTRY
 94. **Trade Surplus** - THE TRADE SURPLUS OF A COUNTRY
 95. **Current Account Deficit** - THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 96. **Current Account Surplus** - THE CURRENT ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY
 97. **Capital Account Deficit** - THE CAPITAL ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 98. **Capital Account Surplus** - THE CAPITAL ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY
 99. **Financial Account Deficit** - THE FINANCIAL ACCOUNT DEFICIT OF A COUNTRY
 100. **Financial Account Surplus** - THE FINANCIAL ACCOUNT SURPLUS OF A COUNTRY



1998 - 1999

- [illegible]

1. **Содержание.** В статье дан анализ деятельности по созданию и развитию системы менеджмента качества на предприятии, работающем в сфере услуг. Рассмотрены основные этапы внедрения системы менеджмента качества, а также особенности ее функционирования в условиях рынка услуг. Приведены примеры успешного внедрения системы менеджмента качества на предприятиях сферы услуг.



SEMED
Secretaria Municipal de Educação

REGIDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NETO OLIMARINO DE A. G. PEREIRA	CHUVA - 10 SETEMBRO
--	---------------------------------	---------------------

Nome	Nome do Eleitor
1209611 - 1.025.314-1	Voto em Branco
1414 - 4 - 1505 - 15 12 17	97707318
Atua desde 2002-03-15	65785535 DV

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 25.317.772/0001-482

Endereço: RUA ANTONIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSMANÓICA
 BARRIO JARDIM DAS ARABAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, UTILIDADE PÚBLICA

Título do projeto: HIDROSSANITÁRIO - EM E.I.F.I.N.D KON BUAITU

Nome	Nome do Eleitor
1000271	Voto em Branco
140027252	97707318
14 - 4 - 1505 - 15 12 17	65785535 DV

CPF: 14.141.415

Código: 00000000



TUE-THU FRI SAT MON TUE-THU
TUE-THU FRI SAT MON TUE-THU
TUE-THU FRI SAT MON TUE-THU
TUE-THU FRI SAT MON TUE-THU



Nome	Idade
Temeriz 1 428 34 m²	
João Evangelista 283 76 m²	
João A. Apolinário 19 23 m²	
João 1101 252 73 m²	

cliente:
UNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ. 25.317.772/0001-82

Endereço:
RUA ANTONIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA
LAURO JARDIM DAS ARARAS, ALDEIA PRAIA DO MANGUE, ITAITUBA PARA

Ítulo do projeto:
HIDROSSANITÁRIO - EMELFININD KON BUJATPU

[illegible]

ESGOTO SANITÁRIO

SEBASTIÃO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VICTOR GUILLERMO DE A. G. PEREIRA
CNEA - 15/05/1986

Assunto: Anuário

Tercia 1.052,34 m²
Quarta 1.000,00 m²
Quinta 1.000,00 m²
Sexta 1.000,00 m²
Sábado 1.000,00 m²
Domingo 1.000,00 m²
Total 6.000,00 m²

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ. 25.317.772/0001-62

Endereço:
RUA ANTÔNIO GOMES BILBY COM AVENIDA TRANSAMAZÔNICA

Título do projeto:
HIDROSSANITÁRIO - E.M.E.F. IND. KON BLATPU

Year of publication	Title	Region	Year of survey
1990*	1407/20/5	North Friesland	1988/1989
2000*	1407/20/5	North Friesland	1998/1999

* = 1990/1991

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	FABR
-----------------------	-----	------

Lista de Materials - Tubos

[illegible]
